



O P Š T I N A B A R

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  
STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BAR  
(2020-2025.)  
za 2021.godinu**

april, 2022.godine

## **Sadržaj**

<b>Uvod.....</b>	<b>3</b>
<b>Strateški okvir politike lokalnog razvoja.....</b>	<b>3</b>
<b>Metodologija izrade Izvještaja.....</b>	<b>4</b>
<b>Stepen realizacije okončanih projekata.....</b>	<b>5</b>
<b>Stepen realizacije broja projekata.....</b>	<b>6</b>
<b>Analiza strukture izvora finansiranja.....</b>	<b>8</b>
<b>Godišnji izvještaj sprovođenja projekata.....</b>	<b>10</b>
<b>Zaključak .....</b>	<b>79</b>

## Uvod

Zakonski osnov za izradu Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana opštine Bar (2020-2025.) za 2021. godinu sadržan je u članu 11 stav 3 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, broj 20/11, 26/11, 20/15, 47/19), koji definiše obavezu jedinica lokalne samouprave da pripreme i dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju Strateškog plana.

Predmet ovog izvještaja su podaci o statusu realizacije projekata koji su bili propisani Godišnjim akcionim planom za 2021.godinu, a koji su u funkciji sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 (u daljem tekstu Strateški plan). Svi podaci dobijeni su od strane institucija koje su nosioci projekta, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata, a prikupljeni su putem službene korespondencije sa Sekretarijatom za razvoj.

U cilju praćenja i kontrole sprovođenja Strateškog plana, kao i procjene efekata koji se postižu realizacijom predviđenih projekata, lokalna uprava je uspostavila sistem monitoringa zasnovanog na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno i to u dijelu procesnih indikatora (faza u kojoj se nalazi realizacija projekta), finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku) i indikatora efikasnosti (prikupljanje podataka o učincima i efektima).

## Strateški okvir politike lokalnog razvoja

Strateški plan razvoja opština Bar (2020-2025), usvojen na sjednici Skupštine Opštine Bar održane 24.juna 2020. godine, predstavlja strateški okvir za vođenje politike lokalnog razvoja. Ovaj dokument usklađen je sa strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore i predstavlja preduslov za izradu drugih strateških dokumenata na lokalnom nivou.

Polazeći od toga da su ključni pravci razvoja crnogorske ekonomije pametan, održiv i inkluzivni rast, Opština Bar je, u funkciji njihovog dostizanja, kao svoj strateški cilj definisala ***dinamičan i održiv privredni rast i razvoj, uz otvorenost za sve građane***. Ovako široko postavljen opšti strateški cilj predstavlja veliki izazov i stoga u njegovo ostvarenje mora biti uključena cjelokupna zajednica.

Dostizanje zacrtanog strateškog cilja ostvaruje se kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritetnih oblasti koje su najrelevantnije za ravnomjeran razvoj cijele opštine. U tom smislu, opšti cilj je operacionalizovan kroz četiri specifična strateška cilja sa prioritetima:

**1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE**, prioritetno na bazi uređenja obalnog područja i unapređenja postojećih, odnosno uvođenja novih turističkih proizvoda;

**2. ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE KROZ UNAPREĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA** (razvoj poljoprivrede, smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva, iskorišćenje potencijala Slobodne zone Luke Bar, razvoj saobraćajne infrastrukture, unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave);

**3. ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR** kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, putem obezbjeđenja veće uključenosti ranjivih grupa, na bazi razvoja i promocije kulturne baštine i razvoja sportske infrastrukture;

**4. UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR**, uključujući kao prioritete razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sistema upravljanja otpadom i unapređenje energetske efikasnosti.

Polazeći od navedenog, implementacija Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025.godine, odnosno Godišnjeg akcionog plana za 2021. godinu, fokusirana je na realizaciji prioriteta i mjera u ključnim oblastima razvoja, kroz projekte koji su mjerljivi, ostvarivi, jasno formulisani, međusobno usklađeni i usmjereni na ostvarenje strateškog cilja.

## **Metodologija izrade Izvještaja**

Metodologija izrade predmetnog izvještaja bazira se na prikazu realizacije Godišnjeg akcionog plana (GAP) za implementaciju Strateškog plana za 2021. godinu , u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 68/16). U vezi sa tim, važno je naglasiti da je Godišnji akcioni plan za 2021. godinu pripremljen u saradnji lokalne samouprave sa organima državne uprave i ostalim partnerima koji participiraju u realizaciji planiranih projekata.

Akcijski plan je organizovan oko ključnih prioriteta iz oblasti sva četiri specifična strateška cilja i sadrži ukupno **32 projekta**. Za svaki pojedinačni projekt, pored njegovog naziva, navedeni su očekivani rezultati, period realizacije, nosioci aktivnosti, učesnici u implementaciji, troškovi realizacije specificirani prema izvoru finansiranja, kao i indikatori i sredstva provjere.

Prema utvrđenoj metodologiji, evalucioni izvještaj za svaki projekat sastavljen je iz:

- Projektnog Plana, kojim se ukratko definiše planirani projekt;
- Realizacije projekta, kojim se definišu sve aktivnosti vezane za realizaciju projekta i
- Finansijskog izvještaja, kojim se definišu novčani iznosi od strane svih nosioca aktivnosti iz projekta.

Period monitoringa obuhvata 2021.godinu, odnosno period od 1.1. do 31.12. 2021. godine.

Izvještaj je usmjeren na prikaz stepena napretka i ostvarenih rezultata projekata i aktivnosti koji su u funkciji ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta, pa je i strukturiran na takav način da omogućava uvid u projekte po ključnim prioritetima, odnosno specifičnim strateškim ciljevima. Svi inputi dobijeni su od strane institucija koji su nosioci projekata, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata i isti su integrirani u metodološki utvrđenu tabelarnu formu. Na osnovu dostavljenih podataka i uvida u realno ostvareno stanje, izvršena je adekvatna analiza učinaka.

U cilju kvalitetnijeg i jednostavnijeg pristupa informacijama iz ovog dokumenta unaprijeđena je metodologija pristupa informacijama tako što su segmenti koji prate realizaciju i finansijski izvještaj spojeni u jedan projektni dokument čime je formirana i zaokružena informacija u cijelosti i na jednom mjestu.

## Stepen realizacije okončanih projekata

Prema dostavljenim podacima, realizovana finansijska ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog plana u 2021.godini iznose **2.274.774,52€**.

Godišnjim akcionim planom delegirana su 32 projekta od kojih je 7 okončano, dok je 25 u fazi sprovođenja.


U izvještajnom periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine, okončano je sedam projekata, koji su svi sa jednogodišnjim trajanjem. Dva projekta koji su bili planirani da se okončaju u 2021. godini su na zahtjev nosilaca projekata produženi i tokom 2022. godine:

- 9.1.2.1. "Digitalizacija Starog Bara (Projekat FORTITUDE)" i
- 9.2.1.1. "Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva".

Naime, akcionim planom je predviđena realizacija 9 projekata sa jednogodišnjim trajanjem, odnosno realizacija 8 projekata u toku 2021. godine i jedan čija je realizacija bila planirana za drugu polovicu 2021. i prvu polovicu 2022. godine. Od toga je 7 projekata u potpunosti realizovano i okončano, a dva navedena projekta su u završnoj fazi.

Projekat 9.3.1.5., "Uređenje prostora nekadašnjeg logora na Topolici", čije je trajanje bilo planirano za drugu polovicu 2021. i prvu polovicu 2022. godine završen je prije roka, odnosno u 2021. godini.

Na osnovu naprijed navedenog, stepen realizacije projekata planiranih za završetak u 2021. godini iznosi 77,8%.

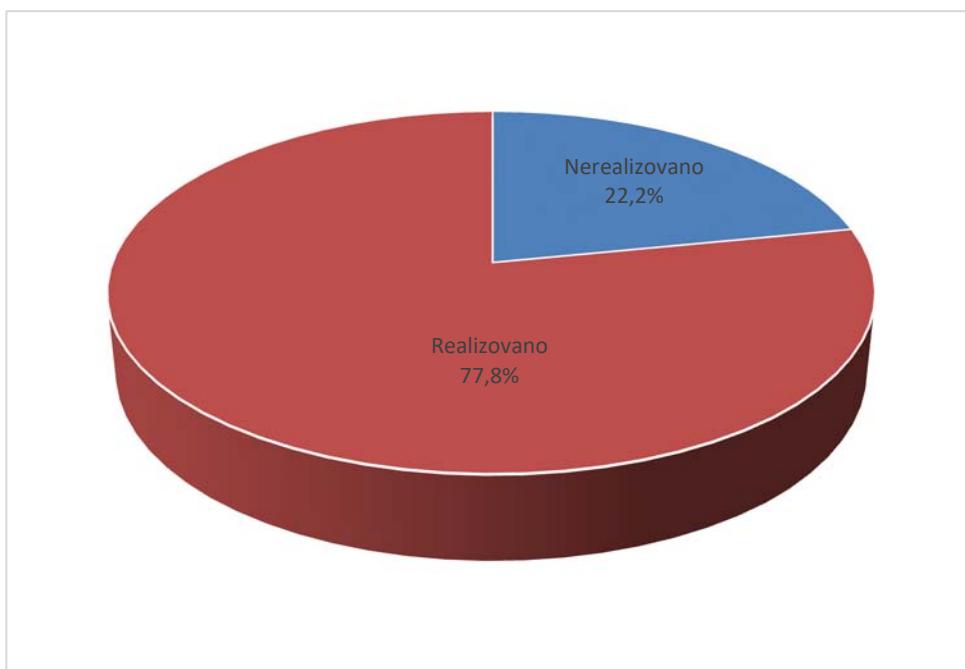

Prema dostavljenim podacima, realizovana finansijska ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog plana u 2021.godini iznose **2.274.774,52€**.

Analizom realizovanih projekata u izvještajnom periodu za 2021. godinu, pokazuje da iznos ukupnih finansijskih ulaganja kod okončanih projekata iznosi **1.483.114,24€**, dok je planirani iznos ulaganja iznosio **1.671.596,62€**.

Važno je napomenuti da se veći dio projekata realizuje kontinuirano u vremenskom trajanju duže od 12 mjeseci, što je iskazano kroz tabelarne prikaze, za koje se dinamika isplate odvija u tranšama, prema dostavljenim izvođačkim situacijama i izveštajima o realizaciji projekta i za koje će analiza "planirano/realizovano" biti izvjesna tek po okončanju projekta. Ovi projekti su u izveštaju prikazani kao projekti u toku.

Radi preglednijeg uvida u status realizacije pojedinačnih projekata, prikazujemo ih u donjoj tabeli, gdje su zelenom bojom označeni realizovani projekti, a žutom projekti koji su u različitim fazama sprovođenja:

	<b>Naziv projekta</b>
<b>1.</b>	REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE
<b>2.</b>	IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51
<b>3.</b>	DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)
<b>4.</b>	IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE
<b>5.</b>	VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (Topolica III)
<b>6.</b>	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
<b>7.</b>	MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)
<b>8.</b>	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR
<b>9.</b>	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU
<b>10.</b>	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE
<b>11.</b>	VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA
<b>12.</b>	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA
<b>13.</b>	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI
<b>14.</b>	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
<b>15.</b>	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU
<b>16.</b>	IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U ŠUŠANJU
<b>17.</b>	IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU
<b>18.</b>	UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠnjeg LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“
<b>19.</b>	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA
<b>20.</b>	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJAVA I DOJKE (ON TIME)
<b>21.</b>	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)
<b>22.</b>	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)
<b>23.</b>	IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
<b>24.</b>	REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVODENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI
<b>25.</b>	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE „VLADIMIR POPOVIĆ – ŠPANAC“ U BARU
<b>26.</b>	SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU
<b>27.</b>	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)
<b>28.</b>	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI
<b>29.</b>	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA
<b>30.</b>	OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU
<b>31.</b>	UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALitetno ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
<b>32.</b>	IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE

## Analiza strukture izvora finansiranja


Kao pokazatelj izvora finansiranja prikazani su kroz budžetski udio tri ključna subjekta:

- **lokalna samouprava - Opština Bar;**
- **država i**
- **ostali akteri koji su prepoznati kao nosioci projektnih aktivnosti.**

Shodno tome, ukupna finansijska realizacija svih subjekata u Godišnjem akcionom planu u izvještajnom periodu za 2021.godinu, iznosi **2.274.774,52€**,

U okviru ove ukupne sume učestvovala je:


- **lokalna samouprava - Opština Bar** u iznosu od **769.579,29€**, odnosno **33,83%**,
- **Vlada Crne Gore** sa sredstvima iz kapitalnog budžeta u iznosu od **151.989,49€**, odnosno **6,68%**, kao i
- **ostali ili drugi subjekti** u ukupnom iznosu od **1.353.205,74€**, odnosno **59,48%**.

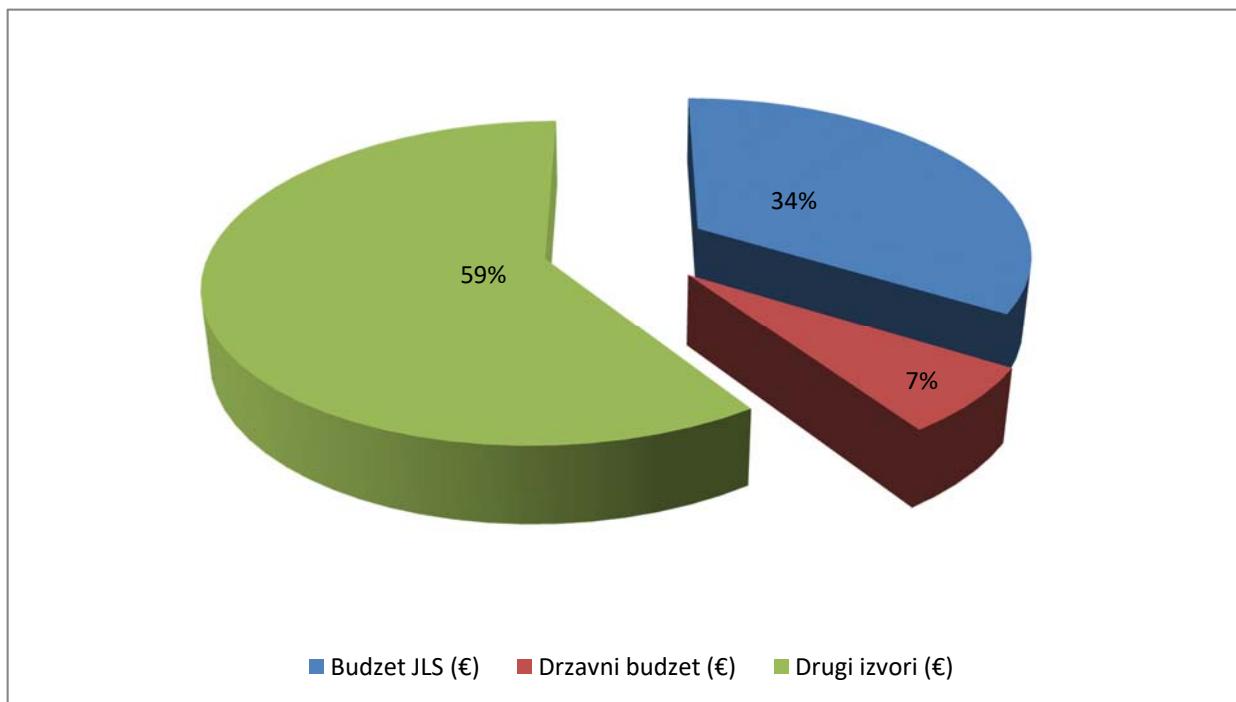

U distribuciji finansijskog učešća **ostalih** ili drugih subjekata u ukupnom iznosu od **1.353.205,74€**, u okviru izvještajnog perioda participirali su sljedeći subjekti:

- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sa iznosom od 632.251,09€ (40,51%),
- EU sredstva predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 548.244,06€ (17,18%),
- Turistička organizacija Bar sa iznosom od 53.240,00€ (3,93%),
- Filmski centar u iznosu od 60.000,00€ (4,43%),
- JU "Kulturni centar" sa iznosom od 15.040,00€ (0,72%),
- DOO Komunalne djelatnosti Bar sa iznosom od 20.400,00€ (1,50%),
- Biznis Start-up centar sa sredstvima u iznosu od 29.230,59€ (2,16%).

Udio svih navedenih subjekata prikazujemo i grafički:

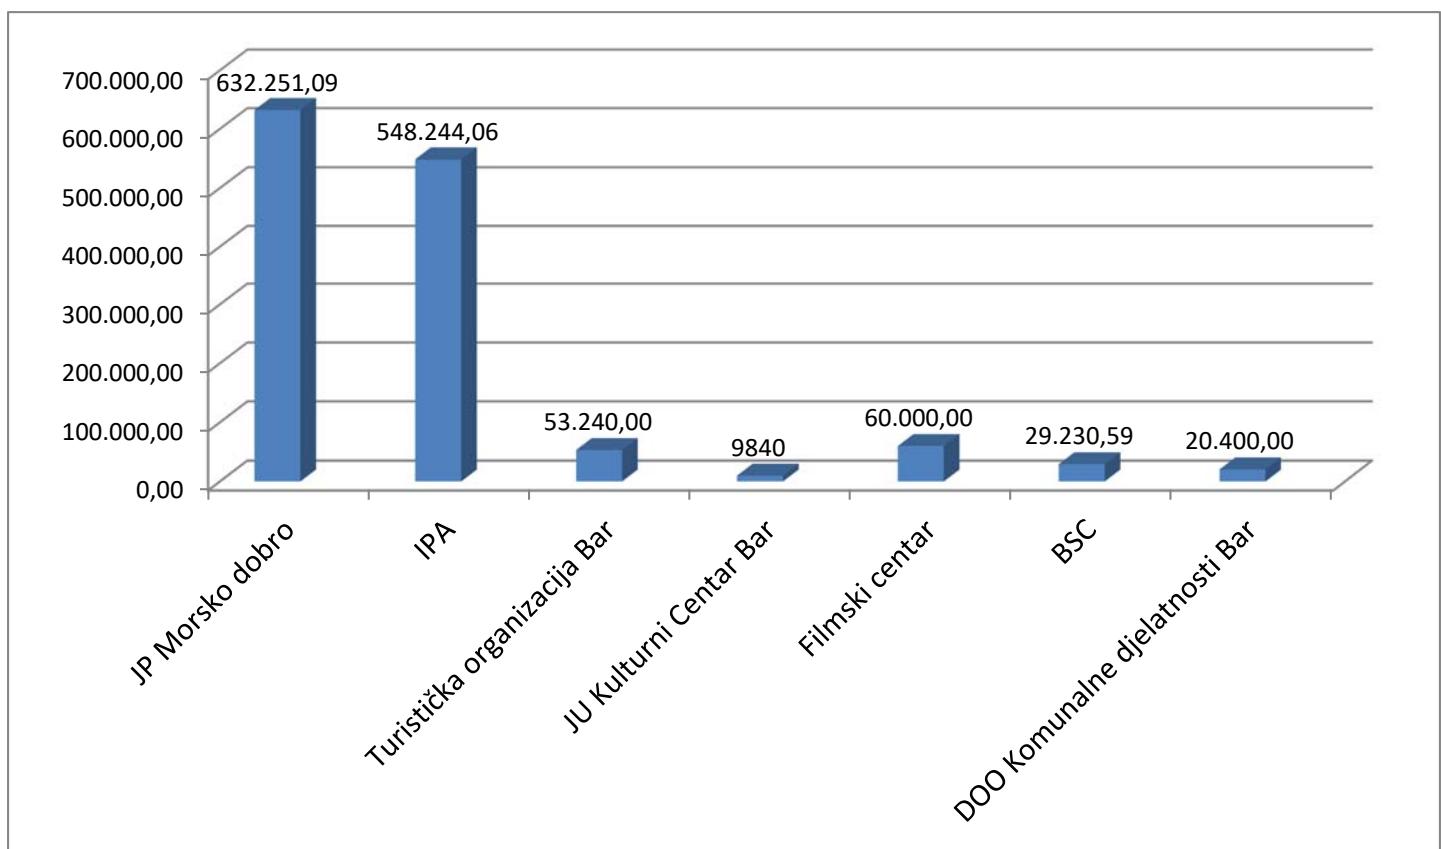

***Godišnji izvještaj sproveđenja projekata***

## **Specifični strateški cilj 1: Unapređenje turističke ponude opštine Bar**

### **Prioritet 1: Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma**

#### **Projektni plan: REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.1.2.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE</u>	- unapređenje ambijenta i turističke ponude, - poboljšanje uslova za kupače, -ljepši izgled plaže, -razvoj turizma	■			-Vlada Crne Gore	- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrrom -Opština Bar	949,438.12	100.000,00	849,438.12		-izvještaj o prijemu radova

#### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioци aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.1.2.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE</u>	1.Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I sa istim zaključen Ugovor  2.Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora i sa istim zaključen Ugovor  3.Započeto izvođenje radova	1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-3182 od 12.05.2020.g. i Ugovor br. 01-334/20-4063 od 08.06.2020.g.  2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-1566 od 06.03.2020.g. i Ugovor o javnoj nabavci br. 01-334/20-2501 od 15.04.2020.g.  3. Saopštenje Vlade CG	1. februar-jun 2020  2. mart-april 2020.  3. avg 2020.g.	1. Uprava javnih radova  2. Uprava javnih radova  3. Uprava javnih radova	1. IGP "Fidija" d.o.o. Podgorica  2."Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica	1.Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 968.383,36€ sa PDV-om  2.Ugovorena cijena vršenja usluge stručnog nadzora iznosila je 26.299,35€ sa PDV-om
2021		4. Izvedeni radovi na ukupnoj površini od 4800m <sup>2</sup> u sklopu kojih je urađeno sledeće: - položene cijevi za atmosfersku kanalizaciju;	4. Realizovani su sledeći iznosi: - I privremena situacija u iznosu od 132.363,15 €	4. Dec.2020.g.-mart 2021.g.	4. IGP "Fidija" d.o.o. PG		4.Radovi su izvođeni na kvalitetan način, zadovoljavajućom dinamikom. Kvalitetno uređenje centralnog dijela Sutomora doprinosi pozitivnim efektima kada je u pitanju turistički imidž ovog mesta. U narednom periodu očekuje se pokretanje

		<p>-izrađeni vodovodni priključci od objekata na plaži do postojećeg distributivnog vodovoda;</p> <p>-izrađen sistem za navodnjavanje sa hidrantima;</p> <p>-postavljen sistem javne rasvjete;</p> <p>-postavljeni betonski ramovi za tende,</p> <p>-izvedeni ogradni zidovi, kao i telekomunikaciona kanalizacija;</p> <p>-izvedeni radovi na popločavanju šetališta, saobraćajnice i trga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II privremena situacija u iznosu od 111.373,88 €</li> <li>- III privremena situacija u iznosu od 165.868,07 €</li> <li>- IV privremena situacija iznosu od 165.855,06 €</li> <li>- V privremena situacija u iznosu od 127.151,12 €</li> <li>- VI privremena situacija u iznosu od 141.197,89 €</li> <li>- VII privremena situacija u iznosu od 55.539,00 €</li> </ul> <p>Izvještaj o prijemu radova</p>				<p>procedure za realizaciju ostalih faza ovog projekta.</p> <p>U UJR je pristigla i Okončana situacija u iznosu od <b>50.089,95€</b>, koja će biti plaćena po dostavljanju kompletног Konačnog izvještaja nadzora.</p> <p>Ukupna vrijednost izvedenih radova je <b>949,438.12€</b>.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

### **Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno (€)</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.1.1.2.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE</u>	949,438.12	100.000,00		849,438.12 <sup>2</sup> JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

<sup>1</sup>Uplata naznačenih sredstava iz opštinskog budžeta izvršena je na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru“, Opština Bar - II faza radova, zaključenog dana 01.08.2019.g. u Baru između Vlade Crne Gore,odnosno Uprave javnih radova, Opštine Bar i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

<sup>2</sup> Ukupno izvršene uplate na osnovu sedam privremenih situacija: 899.348,17€.

**Projektni plan: IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.6	<u>IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ</u>	- Unapređenje saobraćajne infrastrukture/pješačkog saobraćaja;  - unapređenje turističke ponude			Javno Preduzeće Morsko Dobro	- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Elaborativna analiza lokacije  -projektno tehnička dokumentacija  -tenderski postupci

**Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.6.	<u>IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ</u>	1.izrada idejnog rješenja  2.izrada glavnog projekta	1.  2. ugovor broj.353/2 od 30.04.2015	2021-2023	- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom	1."Studio Synthesis" Podgorica  2."Civil Engineer" doo Podgorica,	"Studio Synthesis" iz Podgorice je uradio 2011 god Idejno rješenje za kompletну zonu obuhvaćenu DSL-om Sektor 51, nije iskazana suma za Idejno rješenje jer je ista bila dio ukupnih ugovornih obaveza za četiri različita idejna rješenja po DSL-ovima Sektor, 27, 28, 29, 51, i 54.  Na osnovu ovako urađenog Idejnog rješenja za kompletnu zonu Sektora 51 (što je imperativno nametnuto tekstualnim dijelom Planskog dokumenta – Sektor 51) pristupilo se izradi Glavnog projekta samo za šetališe – lungo mare.
2020		3.revizija glavnog projekta	-izmjena glavnog projekta ugovor br.1241/2 od 13.05.2020.  3.ugovor br.1542/2 od 24.06.2020.		-JP Morsko dobro  -JP Morsko dobro	3."Urbi.pro" doo Podgorica	

## **Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.1.1.6.	<u>IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ</u>	26.550,00			20.850,00 <sup>3</sup> JP Morsko dobro 2.900,00 <sup>4</sup> JP Morsko dobro 2.800,00 <sup>5</sup> JP Morsko dobro

<sup>3</sup> izrada glavnog projekta

<sup>4</sup> Izmjena Glavnog projekta obalnog šetališta i uređenja javnih površina uz obalu u Čanju

<sup>5</sup> Revizija Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju

## Prioritet 2. Unapređenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

### Projektni plan: DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA <i>(Projekat FORTITUDE)</i>	- povećana atraktivnost i konkurentnost turističke ponude kroz valorizaciju kulturnog nasljeđa i modernizovano upravljanje turističkim nasleđem;  -nova manifestacija  - nabavljena i ugrađena oprema,  - održana obuka za vodiče,  - nove mobilne aplikacije		Opština Bar	Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac	253.597,49	40.397,76  15% od ukupnog budžeta		(IPA II, program Interreg Hr-BiH-CG)  228.920,58 (€85% od ukupnog budžeta)	- Izvještaji projekta  - Finalni izvještaj projekta  - Godišnji izvještaj JP KC  - Izvještaj o radu predsjednika  - Izvještaj o broju turista (MONSTAT)

### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sproveđenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta	
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA <i>- Projekat FORTITUDE</i>  Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development	2. Izrađeni konzervatorski projekti za zgradu Carinarnice i Ljetnju scenu u Starom gradu. Završeno opremanje oba objekta	2. tender br. 355-2, ugovor, račun, potvrda o oslobođanju od PDV-a, izvod iz banke, odobrenje UZKD na konzervatorske projekte za oba objekta, ugovor sa nadzorom, fotografije namještaja i	2. 12.06.2020-15.06.2021		Opština Bar	2. Izvođač radova: Restarting; Nadzor: Dema Saglasnost: Uprava za zaštitu kulturnih dobara	Projekat se realizuje planiranim dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).

		<p>3. Tri zaposlena u JP Kulturni centar pohađala akreditovani kurs engleskog jezika - EDUCO centar</p> <p>4. Izrađena i postavljena taktična reljefna maketa Starog grada u bronzi</p> <p>5. Održana tri redovna projektna sastanka- Kick off, Kick off Konferencija, SCM – Bar</p>	<p><i>tehničke opreme za Carinarnicu</i></p> <p>3. tender 355-3, ugovor, interim report</p> <p>4. tender 355-4, ugovor, račun, izvod iz banke</p> <p>5. agende, zapisnici, fotografije</p>	<p>3. 10.11.2020 – 16.06.2021</p> <p>4. 13.11.2020 – 20.06.2021</p> <p>5. 15.05.2020. 16.07.2020. 25.11.2020</p>		<p>3. Obuke je sproveo EDUCO centar</p> <p>4. Autor Zlatko Glamočak</p> <p>5. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac i Opština Bar</p>	
2021		<p>6. Izrađena aplikacija za proširenu stvarnost – AR</p> <p>7. Održan 4. partnerski sastanak i radionica "Heritage and Promotion"</p> <p>8. Započeta nabavka digitalnog interaktivnog kioska</p> <p>9. Započeta nabavka producijske opreme za ljetnju scenu</p> <p>10. Poslata ponuda za uslugu osmišljavanja turističke tematske staze</p> <p>11. Izrađena dva projektna izvještaja</p>	<p>6. tender 355-5, ugovor, račun, izvod iz banke</p> <p>7. agende, zapisnici, fotografije</p> <p>8. tender 355-6, ugovor</p> <p>9. tender 355-7, ugovor</p> <p>10. obaveštenje o ugovoru za uslugu 355-8</p> <p>11. FLC sertifikati</p>	<p>6. 12.06.2020- 15.06.2021</p> <p>8. 27.09.2021.- 27.12.2021.</p> <p>9. 01.12.2021.- 31.12.2021</p> <p>10. 06.12.2021.- 31.05.2021.</p> <p>11. 31.05.2020. 30.11.2020.</p>		<p>6. Izvođač Weblab d.o.o.</p> <p>7. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac i Opština Bar</p> <p>8. Weblab d.o.o.</p> <p>9. Euro Unit d.o.o.</p> <p>10.</p> <p>11. Ministarstvo finansija CFCU</p>	

### **Finansijska realizacija**

	<i>Projekat</i>	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS ()</i>	<i>Državni budžet (€)</i>	<i>Drugi izvori (€)</i>
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA – <i>projekat FORTITUDE</i> <i>Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development</i>	98.106,56 <sup>6</sup>	14.715,98		83.390,58-IPA sredstva

<sup>6</sup> Navedeni iznos sredstava se odnosi na 2 sertifikovana izvještaja zaključno sa 30.11.2021.g.

**Projektni Plan : IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.2.4.	IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE	-Analiza trenutnog stanja  -Strateški zaključci i perspektiva razvoja  -Strateški okvir (vizija, misija, pozicioniranje, ključni proizvodi, ključna tržišta)  -Razrada strategije – akcioni plan  -Programi konkurentnosti  -Smjernice marketinga  -Smjernice digitalnog turizma  -Proizvodi i infrastrukura  -Akcioni plan implementacije			-Turistička organizacija opštine Bar	70.000,00			70.000,00	-Tenderska dokumentacija  -Dostavljen dokument Programa (Strategije) razvoja turizma do 2026. godine

## Realizacija Projekta

	<b>Projekat</b>	<b>Ostvareni rezultati</b>	<b>Indikatori i sredstva provjere</b>	<b>Period sproveđenja</b>	<b>Nosioci aktivnosti</b>	<b>Učesnici u implementaciji</b>	<b>Komentari na sproveđenje projekta</b>
9.1.2.4.	<u><a href="#">IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE</a></u>	<p>1. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Strategije</p> <p>2. Zaključen Ugovor sa Institutom za turizam iz Zagreba o javnoj nabavci usluga izrade Strategije, ukupne vrijednosti 53.240,00 eura</p> <p>3. Završene sve tri faze u izradi Strategije: prva koja se odnosi na tržišnu i situacionu analizu,, druga koja se odnosi na izradu strateškog okvira i treća koja se odnosi na smjernoice turističkog razvoja opštine Bar</p> <p>4. Promocija projekta je održana 17.12.2021 godine i tom prilikom zainteresovana javnost predstavljen kompletan projekt</p>	<p>1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke br. 16, od 14.01.2019.g.</p> <p>2. Ugovor br.69 od 29.01.2020.g.</p> <p>Anex Ugovora br.69/1 od 10.08.2020. godine</p> <p>3. Izvještaji Komisije za praćenje realizacije projekta</p>	2019 - 2021	Turistička organizacija Bar	<p>1. Institut za turizam iz Zagreba</p> <p>Subjekti lokalne turističke privrede</p> <p>Institucije iz oblasti turizma na lokalnom i nacionalnom nivou</p>	<p>Na realizaciju ovog projekta negativno je uticala pandemija COVID 19, pa je aneksom Ugovora rok za završetak izrade Strategije produžen sa prvobitnih 8 na 17 mjeseci od dana zaključenja Ugovora. U skladu sa tim, rok za završetak ovog projekta je jun 2021.g.</p> <p>Tokom rada na situacionog i tržišnoj analazi, obavljeno je preko 45 sastanaka, sa svim relevantnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i predstvincima turističke ponude na cijeloj teritoriji barske opštine.</p>

## Finansijska realizacija

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.1.2.4.	<u><a href="#">IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE</a></u>	53.240,00			53.240,00 sa PDV-om -Turistička organizacija Bar

**Projektni Plan: VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (DUP TOPOLICA III)**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.2.5.	VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (Topolica III)	-Podizanje ponude tržištu, hotela sa 5 zjezdica			-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom			-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija;  -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori;  -izvještaji o implementaciji projekta

**Realizacija projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.2.5.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (Topolica III)</u>	u toku je izmjena detaljnog urbanističkog plana				

**Finansijska realizacija**

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.1.2.5.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (Topolica III)</u>			

## **Specifični strateški cilj 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unapređenje ostalih privrednih grana**

### **Prioritet 1. Razvoj poljoprivrede**

#### **Projektni Plan: PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.1.1.	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA	Izrađena strategija i akcioni planovi, obuke za vinogradare i vinare	December 2021		-Opština Bar -BSC Bar	Osam partnerskih institucija iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije	165.740,00 za Opština Bar i BSC Bar	Po 15% od ukupne sume Opština Bar BSC Bar (25.072,00 eura)		140.879,00 - Program Interreg Adrijan (85%)	- Izvještaj projekta - Izvještaj o radu predsjednika

#### **Realizacija projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.1.1.	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA  ECOVINEGOALS  ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies	1. Izvršena analiza vinogradarsko-vinarskog područja Crmnice kroz anketiranje 30 vinogradara i vinara Izvršen odabir zainteresovanih strana sa lokalnog i nacionalnog nivoa za učešće u projektu Objavljena dva rada u naučnim časopisima i prezentovana na konferencijama (sredstva provjere)  2. Usvojen Akcioni plan projekta Održana dva online projektna sastanka  3. Letak i bilten o projektu prevedeni na crnogorski jezik i distribuirani zainteresovanim stranama, kreirana Facebook	1. Dokument o kriterijumima za odabir ranjivog pilot područja projekta, strukturalna analiza (izvještaj), anketni listići, Excel baza podataka anketiranih 30 vinogradara-vinara, strukturalna analiza (izvještaj) o karakteristikama pilot područja i rezultatima anketiranja, izvještaj o identifikovanim zainteresovanim stranama; dokument o kriterijumima za prikupljanje podataka u GIS sistemu naučni radovi i posteri  2. Akcioni plan, gantogram aktivnosti, tehnički grafikon agende, zapisnici, fotografije 3. letak, newsletter FB stranica, objave	1. april-decembar 2020  2. april 2020 22.04. 14.11.2020  3. jul 2020	1. BSC Bar  2. Opština Bar, svi partneri  3. Opština Bar	1. BSC Bar i Opština Bar  2. Svi partneri  3. Svi partneri	Projekat se realizuje planiranim dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).

		<p><i>stranica projekta ECOVINEGOALS</i></p> <p><i>4. Izrađena dva projektna izvještaja</i></p>	<p><i>4. FLC sertifikati Ministarstva finansija</i></p>	<p><i>4. 30.06.2020 i 31.12.2020.</i></p>	<p><i>4. Opština Bar</i></p>		
2021		<p><i>5. Održan 3. Sastanak upravnog odbora i tehnički sastanak</i></p> <p><i>6. Održana radionica Budućnost vinogradarstva i vinarstva Crmnice</i></p> <p><i>7. Izrađena dva projektna izvještaja</i></p> <p><i>8. Dokumenta:</i> <i>DT1.2.1 Struktorna analiza selektovanog područja i mapiranje vinograda</i></p> <p><i>DT1.2.2. Izvještaj o sastancima u selektovanom području</i></p> <p><i>DT1.3.2 - Izvještaji o praćenju agroekoloških, produktivnih i ekonomskih performansi pilot vinogradarskih farmi</i></p> <p><i>D T2.1.1. Izvještaj o transnacionalnim kriterijima i metode za evaluaciju i unapređenje tradicionalnog pejzaža i staništa i za očuvanje usluge ekosistema u vinogradarstvu području</i></p> <p><i>DT2.1.2. Izvještaj o koordinaciji tehničkih Sastanaka između PP</i></p> <p><i>DT2.1.3. Izvještaj o uključivanju lokalnih stejkholdera</i></p> <p><i>D T2.2.1. Dokument sa prikupljenim podacima</i></p> <p><i>D T2.2.2.</i></p>	<p><i>5. agenda, liste prisustva, fotografije</i></p> <p><i>6. agenda, liste prisustva, fotografije</i></p> <p><i>7. FLC sertifikati Ministarstva finansija</i></p> <p><i>8. Izvještaji</i></p>	<p><i>5. 12.10.2021. 13.10.2021. 14.10.2021.</i></p> <p><i>6. 29.11.2021. 30.11.2021. 01.12.2021.</i></p> <p><i>7. 30.06.2021. 31.12.2021.</i></p>	<p><i>5. svi partneri</i></p> <p><i>6. BSC Bar</i></p> <p><i>7. Opština Bar</i></p> <p><i>8. BSC Bar</i></p>	<p><i>5. Opština Bar, svi partneri</i></p> <p><i>6. Opština Bar, BSC Bar, zainteresovani stakeholder</i></p> <p><i>9. Opština Bar</i></p>	

		<p>Izvještaj o rezultatima analize pejzaža i staništa</p> <p>D T 3.1.1 Zajednički metodološki okvir za participativno upravljanje</p> <p>D T 3.1.2 Raspored prijave participativne metodologije backcastinga u pilot oblastima</p> <p>D T 3.1.3 Spisak strana koje će biti uključene u participativne procese backcastinga</p>			<p>BSC Bar</p> <p>BSC Bar</p> <p>AZRRI Ltd Pazin</p> <p>AZRRI Ltd Pazin</p> <p>Opština Bar</p>	<p>Opština Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>BSC Bar</p>	
9.2.1.1.	<p>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</p> <p>ECOVINEGOALS</p> <p>ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies</p>	<p>1. Obavljena višefaktorska analiza odabranih vinara-vinogradara</p> <p>2. Dostavljeni GIS podaci za Crnu Goru sa svim vinogradima u pilot području</p>	<p>1. 10 upitnika za vinare-vinogradare.</p> <p>Upitnici su ispunjeni od strane eksternog eksperta. Intervjuisani su sljedeći vinari-vinogradari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Klišić Family</li> <li>-Cermeniza</li> <li>-Garnet</li> <li>-Kalimut</li> <li>-Zavjet</li> <li>-Sjekloća</li> <li>-Kopitović</li> <li>-Mašanović</li> <li>-Đukanović</li> <li>-Buk</li> </ul> <p>Osim ispunjenih anketnih listića, u prilogu je Excel baza sa obrađenim anketnim formularima za svaku vinariju, sa pripadajućim fotografijama</p> <p>U cilju izrade dokumenta BSC Bar (eksterni ekspert) je prikupio osam slojeva digitalnih podataka relevantnih za pilot područje (Crmnica). Ovaj izvještaj sadrži podatke potrebne za analizu krajolika i staništa pilot vinskog područja i</p>	<p>01.januar-30.jun 2021.</p>	<p>1.BSC Bar</p> <p>2.BSC Bar</p>		<p>Projekat se realizuje planiranim dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).</p>

			<p><i>predstavlja sažetak digitalnih podataka (GIS slojeva) koji su prikupljeni. BSC Bar uz tehničku i institucionalnu podršku uspio je da dobije sljedeće slojeve: Korišćenje zemljišta (dobijeno od Geološkog zavoda CG); Zaštićena područja; Tipovi staništa (pričuvani od strane Agencije za zaštitu životne sredine CG), litološki podaci i podaci o zemljištu (pričuvani od Geološkog zavoda CG), specifični elementi pejzaža (pričuvani od Uprave za zaštitu kulturnih dobara), putna i željeznička mreža (preuzeta iz Uprava za nekretnine) kao i dodatni sloj svih vinograda u pilot području (dobijeno od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovaj dokument će poslužiti za izradu izvještaja o rezultatima analize pejzaža i staništa</i></p> <p><i>3. Pripremljen Zajednički metodološki okvir za participativno upravljanje</i></p> <p><i>4. Izvještaj o očešću lokalnih stakeholdera</i></p> <p><i>5. Strukturalna analiza odabranih površina i mapiranje vinograda. Izvještaj o lokalnim sastancima sa operatorima u odabranim vinogradarskim područjima</i></p> <p><i>Sprovedena metodologija retrognozirajućeg scenarija ( razvijanje idealne ili nepoželjne slike budućeg</i></p>	<p><i>01.jul-31.decembar 2021</i></p>	<p><i>3.BSC Bar</i></p> <p><i>4.BSC Bar</i></p> <p><i>5. BSC Bar</i></p> <p><i>6.BSC Bar</i></p>		
--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--

		<p><b>6. održana 5 online treninga u sklopu aktivnosti „Obuka fasilitatora za participativne backcasting procese u okviru projekta ECOVINEGOALS”</b></p> <p><b>7.Drugi sastanak Upravnog odbora organizovan je i vodio LP Vegal 22. aprila 2021. godine. Zbog COVID-19, sastanak je održan online putem Zoom-a</b></p> <p><b>8.Treći sastanak Upravnog odbora i tehnički sastanak u prostorijama:</b> “Mediterranski agronomski institut u Haniji” Od 11. do 15. oktobra 2021</p> <p><b>9.Kreiran novi dizajn postera</b> .</p>	<p><i>stanja i vraćanje unazad kako bi se identifikovali koraci koje treba preduzeti ili izbjegći)</i></p> <p><i>U sklopu Projekta u prostorijama BSC Bar održana radionica „Budućnost vinogradarstva i vinarstva Crmnice“. Učestvovali vinari i vinogradari i predstavnici stakeholdera</i></p>		<p><b>7. BSC Bar</b></p> <p><b>8.BSC Bar, svi partneri</b></p>	
--	--	---	--	--	--	--

### **Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.2.1.	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u>  <b>ECOVINEGOALS</b> <i>ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies</i>	13.192,98 <sup>7</sup>	1.978,95		11 214,03 –IPA

<sup>7</sup> 01.03.2020. - 31.12.2020.

2021 Opština Bar	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u>  ECOVINEGOALS ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies	14.887,86 <sup>8</sup>	2.233,18		12.654,68 – IPA
2021 BSC	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u>  ECOVINEGOALS ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies	13.338,93 <sup>9</sup> 21.050,00 <sup>10</sup>	2.000,84 3.157,50		11.338,09 period 01.01.-30.06.2021. IPA 17.892,50 period 01.07.-31.12.2021. IPA

<sup>8</sup> 01.01.2021. - 31.12.2021.

<sup>9</sup> Potvrđeno od strane First level control

<sup>10</sup> nije potvrđeno od strane First level control, aktivnosti u toku do 31.12.2021.Najvjerojatnije ovoliko neće biti potrošeno uslijed nemogućnosti putovanja i sastanaka

### Projektni Plan: MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.1.3.	MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)	1. Maps-and-Census Mapiranje maslina i obližnjih kulturno istorijskih atrakcija u GIS sistemu  2. LECRM - Turistička-mapa Bara i maslinjaka Džidžarin  3. Lokalni ekološki, ekonomski i turistički razvoj  4. Najbolje poljoprivredne prakse  5. Istraživanje biodiverziteta			- Opština Bar	Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Tiranu – vodeći partner  CIHEAM Bari  Institut za urbana istraživanja iz Tiranе  Park maslina Venafro  Opština Bar  NVO Valdanos	87.014,50	13.052,18  15% od ukupnog budžeta	-  -	73.962,32  (€85% od ukupnog budžeta)  IPA II, program Interreg CBC It-Al-Me 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tenderska dokumentacija</li> <li>-Ugovori</li> <li>-računi</li> <li>-potvrde o oslobađanju računa od PDV-a</li> <li>-Izvodi iz banke</li> <li>-Izveštaji projekta</li> <li>-FLC sertifikati</li> <li>-Konzervatorski projekti</li> <li>- Izdate saglasnosti</li> <li>- Interim Reports</li> <li>- Brošure</li> <li>-Stampani materijal</li> <li>Informativne table</li> </ul>

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.1.3.	MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)	1. LECRM - Turistička mapa Bara i maslinjaka Džidžarin  2. Lokalni ekološki ekonomski turistički razvojni plan  3. Brošura - Najbolje poljoprivredne prakse  4. Mapiranje maslina i obližnjih kulturno istorijskih atrakcija u GIS sistemu  5. Istraživanje biodiverziteta		28.05.2018. – 31.03.2021.			

		6.SMART STUDY-Plan za pametni i održivi prekogranični turizam						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**Finansijska realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.1.3.	<u>MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)</u>	79.722,65	11.958,40		67.764,25 IPA

## **Projektni Plan: PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.1.6	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	-usmjeravanje proizvođača ka tržišnim uslovima i standardima; -povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi -povećanje iskorišćenosti poljoprivrednih resursa			-Opština Bar		100.000,00	100.000,00			-Javni poziv -Broj podržanih poljoprivrednika -Izveštaj o realizaciji

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovodenje projekta
9.2.1.6.	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	1.Odobreno 109 subvencija lokalnim poljoprivrednim proizvodjačima  2.Rješenja o odobravanju sredstava upućena Sekretarijatu za finansije na isplatu	1.Rješenje o odobravanju podnijetih zahtjeva  2.Dokazi o izvršenim uplatama  3.Izveštaj o radu Sekretarijata za privredu u sklopu Izveštaja o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave	2021	Opština Bar	Sekretarijat za privredu	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 55.420,86 eura izvršena je na osnovu objavljenih Javnih poziva, u skladu sa Odlukom o podsticajima i investirajući u razvoj poljoprivrede ("Sl.list CG – opštinski propisi" br. 046/16 i 018/19) Ukupno opredjeljena sredstva za projekat iz budžeta iznosila su 100.000,00

### ***Finansijska realizacija***

	<i>Projekat</i>	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS ()</i>	<i>Državni budžet (€)</i>	<i>Drugi izvori (€)</i>
9.2.1.6.	<u>PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR</u>	55.420,86	55.420,86		

## Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

### Projektni Plan: PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.2.1.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Otpočinjanje ili unapređenje preduzetništva  -Povećanje biznis operativnosti			-Opština Bar	-Opština Bar  -podnosioci biznis planova	150.000,00	150.000,00			-Javni poziv za podnošenje biznis planova  -Izvještaj komisije o izboru biznis planova

### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.1.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	1.Odobrena sredstva za ukupno 30 biznis ideje  2.Zaključeni ugovori se korisnicima sredstava  3.Izvršena uplata sredstava  4.Monitoring realizacije podržanih biznis planova	1.Odluka o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2021.godinu (br. 01- 018/21-1786 od 25.06.2021.godine)  2.Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava  3.Potvrde o uplati  4.Finansijski i narativni izvještaji korisnika opštinskih sredstava Izvještaji Komisije	2021 - 2022	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava  Biznis start-up Centar, Bar  Podnosioci biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 140.800,00 eura izvršena je na osnovu objavljenog Javnog poziva, u skladu sa Programom podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar za period 2019- 2022.godine ("Sl.list CG- opštinski propisi", br.44/19). Monitoring sprovodenja podržanih ideja i namjenskog koriscenja dodijeljenih sredstava vrši se u kontinuitetu. Ukupno opredijeljana sredstva za projekt iz budžeta iznosila su 150.000,00

### Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.1.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	140.800,00	140.800,00		

## **Projektni Plan: PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.2.2.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Otpočinjanje ili unapređenje ženskog preduzetništva  -Povećanje biznis operativnosti kroz žensko preduzetništvo			-Opština Bar	-Opština Bar  -podnosioci biznis planova	35.000,00	35.000,00			-Javni poziv za podnošenje biznis planova iz oblasti ženskog preduzetništva  -Izvještaj komisije o izboru biznis planova

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.2.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	<p>1.Odobrene sredstva za ukupno 12 biznis ideja</p> <p>2.Zaključeni ugovori se korisnicama sredstava</p> <p>3.Izvršena uplata sredstava</p> <p>4.Monitoring realizacije podržanih biznis planova</p>	<p>1.Odluka o odobravanju sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2021.godinu (br. 01-018/21-1506 od 02.06.2021.godine)</p> <p>2.Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava</p> <p>3.Potvrde o uplati</p> <p>4.Finansijski i narativni izvještaji korisnika opštinskih sredstava Izvještaji Komisije</p>	2021 - 2022	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava  Podnositeljke biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 32.000,00 eura izvršena je na osnovu raspisanog Javnog konkursa, u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.44/19). Monitoring sprovodenja podržanih ideja i namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava vrši se u kontinuitetu. Ukupna opredijeljena sredstva za projekt iznosi su 35.000

### **Finansijska realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.2.	<u>PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE</u>	32.000,00	32.000,00		

### Projektni Plan: VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA ( DUP TOPOLICA III)

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.2.4.	VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA	Multifunkcionalni tržni centar sa svim sadržajima neophodnim za gradsko područje			-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija;  -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori;  -izvještaji o implementaciji projekta

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.4.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urađen geodetski elaborat</li> <li>- Izvršeno je formiranje urbanističke parcele u skladu sa planom parcelacije</li> <li>- Izvršena je procjena vrijednosti nepokretnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj 04-460/19-1182 od 16.05.2019.g. i broj 04-460/19-11293 od 31.05.2019.g</li> <li>-Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokr., br. 04-427/21-1255 od 08.07.2021.g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-2019.g</li> <li>Jul/21-Avg/21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Opština Bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-DOO "Ekvidistanca" BR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Troškovi geodetskih radova iznosili su <b>1.089,00€</b> i <b>363,00€</b> sa PDV-om</li> <li>- Troškovi procjene vrijednosti nepokretnosti iznosili su <b>700,00€</b>.</li> </ul>
2022		- -U toku je izmjena detaljnog urbanističkog plana "Topolica III"					

### **Finansijska realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS €)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.4.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA</u>	2.152,00	2.152,00		

### Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala slobodne zone "Luka Bar"

#### Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALI VOLUJICA

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.	2023				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.3.2	<b>REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA</b>	Uspostavljene osnove za razvoj djelatnosti u Slobodnoj zoni (pretovar i skladisteњe tereta)			- Luka Bar AD	- "Aqua mont service" doo Beograd, (vodeći član) - „Aqua mont“ doo-Herceg Novi, (član) - „Aqua mont service“ doo-Split, (član) - „Monteput“ doo-Podgorica (stručni nadzor)	4.989.013,80			Investitor: „Luka Bar“ AD	Izvještaj o napretku projekta

#### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.3.2	<b>REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA</b>	1. Kompletirana projektna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata  2. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i sa istim zaključen Ugovor	1.Uvid u projektnu dokumentaciju  2.Odluka br. OD/207-8 od 25.08.2020.g. i Ugovor br. 4538 od 25.08.2020.g..	1. 2018.-2020.  2. avgust 2020.g.	“Luka Bar” AD	1.Saobraćajni institut CIP d.o.o. “Gradevinski institut Makedonija” AD – Skopje, 2019.g.; revident: “VU-TI Inženjering”- Bar  2.Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - “Aqua mont service” doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont“ doo – Herceg Novi, član; „Aqua mont service“ doo – Split, član:	Početak izvođenja radova je bio planiran za početak novembra 2020.g., ali je planirana dinamika izmijenjena zbog ponavljanja postupka izbora vršioca stručnog nadzora, iz razloga formalno-pravne prirode.

		<p>3.Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i sa istim zaključen Ugovor o javnoj nabavci</p> <p>4.Podnesena Prijava građenja Urbanističko-građevinskoj inspekциji</p>	<p>3.Odluka br. 6738 od 27.11.2020.g i Ugovor br. 7338/1 od 23.12.2020.g</p> <p>4.Prijava građenja</p>	<p>3. novembar/decembar 2020.g.</p> <p>4. decembar 2020.g.</p>		<p>3., Stručni nadzor: „Monteput” doo-Podgorica</p>	
2021.		<p>1.Započeli su radovi na rekonstrukciji konstrukcije operativne obale Volujica (15.03.2021.g.); prva faza: sanacija lamele 6;</p> <p>2. Izvršena je korekcija dinamičkog plana realizacije projekta – korigovane su dužine planiranih perioda realizacije radova po lamelama, bez izmjene ukupnog perioda realizacije projekta – 36 mjeseci (produžen je period realizacije radova na lamelama 6 i 5, planirani period rekonstrukcije lamele 4 je ostao isti, a skraćeni su periodi realizacije radova na lamelama 1, 2, 3 i 7).</p>	<p>1. Zapisnik o uvođenju izvođača radova u posao (od 10.03.2021.g.)</p> <p>2.</p> <p>2.1 Odluka Odbora direktora br.OD/219-7 od 26.08.2021.g.</p> <p>2.2 Aneks 3 Ugovora o izvođenju radova br. 4538 od 25.08.2020.g. (arhivski broj Aneksa 3 je 5093 od 27.08.2021.g.)</p>	<p>1. mart 2021.</p> <p>2. avgust 2021.</p>	<p>“Luka Bar” AD</p>	<p>Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - “Aqua mont service” doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont” doo – Herceg Novi, član; „Aqua mont service” doo – Split, član:</p> <p>Stručni nadzor: „Monteput” doo-Podgorica</p>	

### Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.3.2	<u>REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA</u>	997.802,76 <sup>11</sup>	-	-	997.802,76 – “Luka Bar” AD
2021.g.		-	-	-	-

<sup>11</sup> Avansna uplata po osnovu Ugovora o izvođenju radova, ukupne vrijednosti 4.989.013,80€ (sa PDV-om).

### Projektni Plan: IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.3.3	<u>IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI</u>	Povećani kapaciteti u Slobodnoj zoni za pretovar i skladištenje cementa u rasutom stanju			-TCK Montenegro DOO	- Luka Bar AD	2.000.000			Investitor (TCK Montenegro DOO): 2.000.000 €	Izveštaj o napretku projekta

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.3.3	<u>IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI</u>	<p>1. Sklopljen Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni između "Luka Bar" AD i "TCK Montenegro" doo;</p> <p>2. Obezbijedeni urbanističko tehnički uslovi</p> <p>3. Započela je priprema projektne dokumentacije i u tu svrhu su sprovedena geomehanička istraživanja na lokaciji</p>	<p>1. Ugovor o obavljanju djelatnost u Slobodnoj zoni br.2844 od 07.06.2019.g.</p> <p>2.Urbanističko -tehnički uslovi br.1063-324/2, izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Potvrda Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom br. 0207-3035/4 od 22.08.2019.g.;</p> <p>3. Pisana komunikacija između "Luka Bar" AD i "TCK Montenegro" doo;</p>	<p>1. decembar 2018.g. – jun 2019.g.</p> <p>2. jun – avgust 2019.g.</p> <p>3. jun 2019.g. – 31.12.2020.g</p>	"TCK Montenegro" DOO	"Luka Bar" AD	<p>"Luka Bar" AD je, shodno Ugovoru o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni dala u dugoročni zakup dio k.p.6501/1, KO Novi Bar, površine 392 m,<sup>2</sup>radi izgradnje Terminala za skladištenje i rukovanje rasutim cementom i ostalim cementnim proizvodima (uključujući i građenje silosa za rasuti cement i ostale cementne poizvode).</p> <p>Dinamika realizacije projekta je značajno usporena zbog COVID 19 krize.</p>

### **Finansijska realizacija**

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)

9.2.3.3	<u>IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI<sup>12</sup></u>				
2021.		-	-	-	-

<sup>12</sup> Još uvijek nema utroška, jer je projekt u fazi izrade tehničke dokumentacije i sproveđenja inicijalnih geomehaničkih istraživanja.

**Prioritet 4. Razvoj saobraćajne infrastrukture**

**Projektni Plan: IZGRADNJA SAOBRACAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.2.	IZGRADNJA SAOBRACAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM	- poboljšanje saobraćajne infrastrukture			- Uprava javnih radova	- Opština Bar	723.324,52	18.697,82	704.626,71		- projektno – tehnička dokumentacija - izvještaj o prijemu radova

## Realizacija Projekta

	<b>Projekat</b>	<b>Ostvareni rezultati</b>	<b>Indikatori i sredstva provjere</b>	<b>Period sproveđenja</b>	<b>Nosioci aktivnosti</b>	<b>Učesnici u implementaciji</b>	<b>Komentari na sprovođenje projekta</b>
9.2.4.2.	<u><a href="#">IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM</a></u>	<p>1.Izrađena revidovana projektno tehnička dokumentacija</p> <p>2.Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Odabran najpovoljniji izvođač radova i zaključen Ugovor sa njim.</p> <p>3.Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača za vršenje stručnog nadzora. Odabran stručni nadzor i potpisani ugovor sa njim.</p>	<p>1.Uvid u glavni projekat Obavlještenja o ishodu odgovarajućih postupaka javnih nabavki</p> <p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-1410 od 28.02.2020.g. Ugovor br. 01-334/20-2228/1 od 01.04.2020. g.</p> <p>3. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova br. 01-426/20-2308 od 06.04.2020. Ugovor br. 01-334/20-2896 od 04.05.2020. g.</p>	2019-2021	<p>1. Opština Bar</p> <p>2. Uprava javnih radova</p> <p>3. Uprava javnih radova</p>	<p>1.doo "Put inženjer" Podgorica doo "Kov Atelje" Nikšić.</p> <p>2. "Putevi Bar" d.o.o, Bar</p> <p>3. "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D., Podgorica</p>	<p>1.Shodno zaključenom Sporazumu Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla-Zogaj, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat je urađen od strane doo "Put inženjer" Podgorica,a revidovan od strane doo "Kov Atelje" Nikšić. Takođe, Opština Bar je ispunila obavezu izrade geodetskih podloga i plana parcelacije. Ukupni troškovi Opštine po ovom osnovu iznosili su <b>18.697,80 €</b>, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi <b>690.226,70€</b>, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Ukupna vrijednost ugovorene usluge stručnog nadzora iznosi <b>14.400,00€</b>, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole za izgradnju ove saobraćajnice,nakon čega se može očekivati početak izvođenja pripremnih radova i realizacija ostalih ugovorenih poslova.</p> <p>Kapitalnim budžetom za 2022. god. Vlada Crne Gore opredjelila je 433.100,00€ "za izgradnju lokalnog puta i graničnog prelaza Ckla i graničnog prelaza Božaje,Tuzi".</p>

### **Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Društveni izvori (€)</b>
9.2.4.2.	<u>IZGRADNJA SAOBRĀCAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM</u>	18.697,80	18.697,80 <sup>13</sup>		

<sup>13</sup>Shodno zaključenom sporazumu, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat u vrijednosti od **14.850€** je urađen od strane doo "Put inženjering" Podgorica, dok je revizija projekta urađena od strane doo "Kov Atelje" Nikšić iznosila **968,00€** sa PDV-om. Izrada geodetskih podloga i plana parcelacije iznosila je **2.879,80€**.

## Projektni Plan: STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.3.	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU	-poboljšanje saobraćajne infrastrukture, rasterećenje magistralnog puta, ubrzan i optimizovan putnički transport			-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				<ul style="list-style-type: none"> <li>-izrada/izrađeno idejno rješenje</li> <li>-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija;</li> <li>-realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori;</li> <li>-izvještaji o implementaciji projekta</li> </ul>

### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.3.	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU						-Realizovana je Analiza imovinsko pravnih odnosa od strane Sekretarijata za imovinu zastupanje i investicije

### Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.3.	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU				

## Projektni Plan: IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U ŠUŠANJU

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.12.	<u>IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U ŠUŠANJU</u>	-Povećanje bezbjednosti pješaka posebno u ljetnjim mjesecima kada je veoma izražena frekvencija u saobraćaju -Povećanje protoka saobraćajnih vozila			- Opština Bar	- Opština Bar -pješaci i vozači	1.996.175,97	666.588 <sup>14</sup>	170.428,97 <sup>15</sup> 1.159.159,00 <sup>16</sup>		-idejno rješenje -tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije -tender za izbor najboljeg ponuđača

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.12.	<u>IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U ŠUŠANJU</u>	<p>1. Sproveden postupak javnih nabavki za izradu glavnog projekta</p> <p>2. Sproveden postupak javnih nabavki za vršenje revizije glavnog projekta.</p>	<p>1. Obavljanje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/20-1545/2 od 06.07.2020.g. Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju podzemn. pješačkog prelaza u Šušnju sa uređenjem terena broj 01-018/20-1872 od 16.07.2020.g</p> <p>2. Obavljanje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/21-1856/1 od 01.07.2021.g. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta broj 01-</p>	Jul /20 – Nov/21	Opština Bar	<p>1. DOO "Via Project" Pg</p> <p>2. DOO "Arhitektura aurea" Pg</p>	<p>1. Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta za izgradnju podzemnog pješačkog prelaza u Šušnju sa uređenjem terena iznosi je 10.000,00 sa PDV-om.</p> <p>2. Ugovorena vrijednost vršenja revizije glavnog projekta iznosi je 2.420,00 sa PDV-om.</p>

<sup>14</sup>21.12.2021 godine iznos uplaćen po osnovu eksproprijacije zemljišta za potrebe saobraćajnice

<sup>15</sup>Zakon o budžetu 2022 / Aktivnost 17 020 K04 041 / Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrica, Bar

<sup>16</sup> Shodno Planu javnih nabavki Uprave javnih radova za 2022. godinu.

			<p>018/21-1881 od 05.07.2021.g.</p> <p>Plaćena fakтура DOO "Arhitektura aurea" Pg za vršenje revizije glavnog projekta</p> <p>3.Plaćena fakтура DOO "Via Project" Pg za izradu glavnog projekta.</p>				<p>Vrijednost radova shodno revidovanom glavnom projektu iznosi <b>743.941,57€.</b></p> <p>Početkom naredne godine očekuje se sprovodenje postupka javnih nabavki za odabir izvođača radova. Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta za izgradnju podzemnog pješačkog prelaza u Šušanju sa uređenjem terena iznosila je <b>10.000,00</b> sa PDV-om.</p> <p>Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđena je izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, procijenjene vrijednosti <b>1.125.300,00€</b> sa PDV-om.</p> <p>Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova, procijenjene vrijednosti <b>33.759,00€</b> sa PDV-om.</p> <p>U 2022. godini očekuje se sprovodenje postupaka javnih nabavki za odabir izvođača i stručnog nadzora.</p>	
3.	Urađen glavni projekt sa revizijom.							

### Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.12.	<u>IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U ŠUŠANJU</u>	12.420,00	12.420,00		

## **Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar**

### **Prioritet 1. Unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite**

#### **Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA DJEĆJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Društveni izvori (€)	
9.3.1.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA DJEĆJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU</u>	Unapređenje predškolskog obrazovanja u opštini Bar i obezbjedivanje adekvatnih uslova za potrebe djece i vaspitača			Ministarstvo prosvjetе  -Vlada Crne Gore	- Opština Bar	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				projektno tehnička dokumentacija

#### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovodenje projekta
9.3.1.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA DJEĆJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU</u>	1. Opština Bar predložila je lokaciju za izgradnju objekta dječjeg vrtića u okviru DUP-u "Topolica- Bjeliši"  2. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru. od 04.11.2021.		1. Feb/19  2.04.11.2021- 12.01.2022	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma		Opština Bar je učestvovala u konsultacijama za određivanje lokacije sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na kojima je usvojen predlog Opštine Bar o lokaciji za izgradnju dječjeg vrtića. Vlada Crne Gore je kapitalnim budžetom za 2022. godinu opredjelila iznos od 20.200€ za ovu namjenu. Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta biće precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom

#### **Finansijska realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Društveni izvori (€)
9.3.1.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA DJEĆJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU</u>				

**Projektni Plan: UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementa- ciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.5	UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“	-Oplemenjivanje prostora, memorijalno-spomeničkog karaktera		-Opština Bar	-Opština Bar -građani, turisti	80.000,00	80.000,00			-Izrada projektne dokumentacije, - tenderska procedura za odabir izvođača radova, -izvještaj predsjednika o realizovanim radovima.

**Realizacija Projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sproveđenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta	
9.3.1.5.	<u>UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“</u>	1. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za izradu glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone „A“, Topolica I  2. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za reviziju glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone „A“, Topolica I  3. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, br. 01-018/20-2573 od 30.09.2020.g.  4. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za vršenje stručnog nadzora, br. 01-018/20-2816 od 26.10.2020.g.	1. Ugovor za izradu glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone „A“, Topolica I, br. 01-018/20-1275, od 19.05.2020.g  2. Ugovor za reviziju glavnog projekta objekta – fontane i uređenja kod logor parka i zone „A“, Topolica I, br. 01-018/20-3136 od 25.11.2020.g.  3. Ugovor za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I, br. 01-018/20-2573 od 30.09.2020.g.  4. Ugovor za vršenje stručnog nadzora, br. 01-018/20-2816 od 26.10.2020.g.	1. April/20 - Maj/20  2. Nov/20  3. Sept/20 - Okt/21  4. Okt/20	Opština Bar	1. DOO "Mageling" BR  2. DOO "Sedam-Ing" BR  3. DOO "Đokić Group" BR  4. DOO "Mageling" BR	1. Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta <b>3.025,00€</b> sa PDV-om  2. Ugovorena vrijednost revizije glavnog projekta <b>968,00€</b> sa PDV-om.  3. Ugovorena vrijednost za uređenje kod logor parka i zone „A“, Topolica I iznosi <b>55.608,88€</b> sa PDV-om.  4. Ugovorena vrijednost za vršenje stručnog nadzora iznosi <b>3.872,00€</b> sa PDV-om.
2021	5. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za nabavku i ugradnju opreme i mobilijara za fontanu i izgradnju javne rasvjete	5. Ugovor za nabavku i ugradnju opreme i mobilijara za fontanu i izgradnju javne rasvjete, br. 01-018/21-1350 od 18.05.2021.g	5. April/21 - Maj/21		5. DOO "Đokić Group" BR	5. Ugovorena vrijednost nabavke i ugradnje opreme i mobilijara za fontanu i izgradnju j. rasvjete je <b>24.131,76€</b> sa PDV-om.	
	6. Investicija je realizovana	6. Izvještaj evidentanta, br. 04-427/21-1515, 23.08.2021.	6. Jul/21 - Avg 21				

**Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno (€)</b>	<b>Budzet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Druzi izvori (€)</b>
9.3.1.5.	<u>UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava</u>	86.637,64	86.637,64		

## Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEĆJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.6.	<b>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEĆJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</b>	<p>-izgradnja rekonstrukcija i adaptacija postojećih dječjih igrališta</p> <p>-Poboljšanje uslova za boravak djece na otvorenom;</p> <p>- unapređenje pejzažnog uređenja i infrastrukture, uređenje urbanih džepova</p>			-Opština Bar	<p>-Opština Bar</p> <p>-J.P.Morsko Dobro</p> <p>-donatori</p>	93.625,51	93.625,51			<p>-Izrada projektnе dokumentacije,</p> <p>- tenderska procedura za odabir izvođača radova,</p> <p>-izvještaj predsjednika o realizovanim radovima.</p>

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.6.	<p><b>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEĆJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</b></p> <p><b>Adaptacija sportskog poligona u zahvalu DUP-a „Topolica II“</b></p>	<p>1. Urađena geodetska podloga</p> <p>2. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za radove na I fazi adaptacije. Radovi su realizovani</p> <p>3. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za vršenje stručnog nadzora</p> <p>4. II faza podrazumjeva izradu zaštitne ograde i postavljanje konstrukcije koševa. Postupak javne nabavke je u toku.</p>	<p>1. Obaveštenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 04-426/21-2614</p> <p>2. Ugovor za adaptaciju sportskog poligona, broj 01-018/22-151 od 25.01.2022.god</p> <p>3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora broj 01-018/22-377 od 11.02.2022.g.</p> <p>4. Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke</p>	<p>1. Nov/21</p> <p>2. Nov/21 – Mart/22</p> <p>3. Jan/22 – Mart/22</p> <p>4. Mart/22 – Apr/22</p>	Opština Bar	<p>1. DOO "Cading" BR</p> <p>2. DOO "Gradnja inženjering MNE"</p> <p>3. DOO "Art Construction"</p>	<p>Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 302,50€ sa PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost izvođenja radova iznosi 43.970,24€ sa PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 726,00€ sa PDV-om.</p> <p>I faza adaptacije je realizovana.</p>

9.3.1.6.	<u>Uređenje igrališta za djecu na šetalistu Kralja Nikole</u>	<p>1. Urađena geodetska podloga</p> <p>2. Sproveden postupak javne nabavke za odabir izvođača i zaključen ugovor o izvođenju radova.</p> <p>3. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za vršenje stručnog nadzora</p> <p>4. Radovi na uređenju igrališta su u toku</p>	<p>1. Obavljanje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 04-426/21-2614</p> <p>2. Ugovor za uređenje dječjeg igrališta, br. 01-018/22-616 od 28.02.2022.g</p> <p>3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora broj 01-018/22-733 od 10.03.2022.g</p>	1.Nov/21  2.Jan/22 – Feb/22  3.Mart/22	Opština Bar	<p>1.DOO "Cading" BR</p> <p>2."Gradnja inženjeringu MNE"</p> <p>3.DOO "Oliver-Ing" BD</p>	<p>Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 302,50€ sa PDV-om</p> <p>Ugovorenna vrijednost uređenja igrališta iznosi 47.652,22€ sa PDV-om.</p> <p>Ugovorenna vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 671,55€ sa PDV-om.</p>
----------	---	---	--	--	-------------	---	--

#### **Finansijska realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.6.	<u>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEĆJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</u>	605,00			
9.3.1.6.	<u>Adaptacija sportskog poligona u zahvatu DUP-a „Topolica II“</u>	302,50	302,50		
9.3.1.6.	<u>Uređenje igrališta za djecu na šetalistu Kralja Nikole</u>	302,50	302,50		

## **Projektni Plan: PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.7.	<u>PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)</u>	-povećati prevenciju, ranu dijagnozu i optimizaciju u liječenju od raka sa poboljšanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru			do 31.05.2022 godine	-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar	- Zavod za javno zdravstvo Zadar -Opća bolnica Zadar -Institut za javno zdravlje Crne Gore, -Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke	854.585,50			-izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.7.	<u>PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)</u>	1.Izvršena optimizacija projekta  2. Zaključen Ugovor o kofinansiranju između MA (Management Authority)- upravljačkog tijela i LP (Lead Partnership)- vodećih partnera  3. Zaključen partnerski sporazum između MA i LP  4.Održana online početna	1.Optimizovan projekt u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima  2.Uvid u Ugovor  3.Uvid u Sporazum  4.Izvještaj i fotografije sa konferencije, medijski	1. mart 2020.  2. maj 2020.  3. jun 2020.  4. decembar 2020.g.	Zavod za javno zdravstvo Zadar-vodeći partner Projekta	Opća bolnica Zadar  ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore  JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar  Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno – hercegovačke	Datum početka projekta odlagan je nekoliko puta zbog pandemije nove zarazne bolesti COVID-19. Projekat je još uвijek u početnoj fazi, a u narednoj fazi biće sprovedeno raspisivanje tendera po EU pravilima za nabavku endoskopskog stuba i elektrohirurške jedinice.  Ovaj projekat se sprovodi u okviru Programa Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014–2020. – 2. Poziv, a sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 813.445,71 €.

		<i>konferencija ON TIME</i>	<i>izvještaji (prilog Barinfo i RTCG)</i>				
2021		<p>5. Angažovan ekspert za izradu specifikacije i ekspert za realizaciju tendera po EU pravilima</p> <p>6. Redovna OnLine komunikacija, sastanci sa LP i ostalim PP</p> <p>7. Redovan projektni sastanak uživo Bar</p> <p>8. Raspisan tender za endoskopski stub i elektrohiruršku jedinicu za polipektomije</p> <p>9. Radionica za NVO udruženja u Grudama (BiH)</p> <p>10. Učešće u izradi promo filma za projekte na programu Interreg IPA CBC HR-BA-</p>	<p>5. Mjesečni sastanci čl. tima sa menadžmentom i ekspertima, Ugovor</p> <p>6. Zapisnici, PrtScr, modifikacije projekta</p> <p>7. Zapisnici, potpisne liste, fotografije, konferencija za novinare, medijski izvještaji (društvene mreže (FB, Instagram), OB Bar site, Barinfo, RTCG, Pobjeda, Jedro, Feral)</p> <p>8. Tenderska i ostala prateća dokumentacija, objave (OB Bar site, Interreg IPA CBC HR-BA-ME site, Dan)</p> <p>9. Objave (OB Bar site, IJZCG site, portal Analitika, Barinfo)</p> <p>10. Promo film, objave (gov.me site, site EU kancelarija u CG, site</p>	<p>5. januar-mart 2021.g.</p> <p>6. januar-decembar 2021.g.</p> <p>7. 5. i 6. jul 2021.g.</p> <p>8. 26. jul – 30. avgust 2021.g.</p> <p>9. 29. jul 2021.g.</p> <p>10. 1.oktobar 2021.g.</p>			

		<i>ME za Dan evropske saradnje</i>	<i>Opštine Bar, sítie OB Bar, portal Bar, Jedro, Feral, RTCG, Barinfo, Pobjeda, Dan, YouTube, društvene mreže)</i>				
		<i>11. Edukacija zaposlenih na Webinar-u 15. evropskom kolorektalnom kongresu – St. Gallen</i>	<i>11. Učešće 6 zaposlenih (PrtScr, Participation List), objava site OB Bar, društvene mreže</i>	<i>11. 28. novembar – 2. decembar 2021.g.</i>			
		<i>12. Isporuka, instalacija i obuka zaposlenih na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</i>	<i>12. Faktura sa pratećom dokumentacijom, potpisne liste, fotografije</i>	<i>12. 29. novembar – 3. decembar 2021.g.</i>			
		<i>13. Vršenje pregleda na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</i>	<i>13. Potpisne liste, .exl tabela</i>	<i>13. od 2. decembra 2021.g. do kraja trajanja projekta</i>			
		<i>13a.Isporuka, instalacija i obuka zaposlenih na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</i>	<i>13a. Zapisnik, potpisna lista, fotografije, objave društvene mreže, site OB BAR</i>	<i>13a. Instalcija i obuka 2. i 3. decembra 2021.g.</i>			

## **Finansijska realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.3.1.7.	<u>PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEĆENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)<sup>17</sup></u>	168.471,15			5.132,07 <sup>18</sup> -IPA Izvještaj 1.1 13.990,91 <sup>19</sup> -IPA Izvještaj 2.1 17.924,96 <sup>20</sup> -IPA Izvještaj 3.1 131.423,21 <sup>21</sup> -IPA Izvještaj 4.1

<sup>17</sup> NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dokim 15% predstavlja učešće OB BAR.

<sup>18</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

<sup>19</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

<sup>20</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

<sup>21</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

**Projektni Plan: POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.8. <b>POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)</b>	-poboljšanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite  - povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike  - poboljšanje infrastrukture  - edukacija iz oblasti laboratorijske dijagnostike.			-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar	-Zavod za javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih hercegbosanske županije	999.050,20				- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

**Realizacija Projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.8. <b>POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)</b>	1.Izvršena optimizacija projekta  2.Zaključen ugovor o kofinansiranju između Upravljačkog tijela i Vodećih partnera  3.Održana početna (Kick Off) konferencija	1.Optimizovan projekat u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima  2. Uvid u Ugovor  3.Izvještaj i fotografije sa konferencije, medijski izvještaji	1. mart 2020.g.  2. maj 2020.g.  3. 29.06.2020.g	JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar  Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska)  Opća bolnica Zadar (Hrvatska) - vodeći partner  Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina)	Zbog epidemiološke situacije nastale usled pandemije nove zarazne bolesti COVID-19, došlo je do pomjeranja roka za potpisivanje ugovora, te samim tim i do odlaganja početka implementacije projekta i sprovođenja pojedinih aktivnosti.  Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi 978.236,45€, od čega će Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar kroz ovaj projekat biti alocirano EUR 411.659,40 €. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. g. a trajeće 24 mjeseca.Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, unapređenje infrastrukture i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unapređenja nivoa pružene usluge.  -Implementacija projekta LAB-OP planirana je 14. maja 2022. godine, međutim, zbog implementacije PTS-a (vazdušne pošte) u OB BAR, tražen je produžetak trajanja implementacije projekta do 14.09. 2022.g., za šta još čekamo da nam odobre iz MA (Upravljačkog tijela).	

		<p><b>4. Pokrenut postupak izrade Glavnog projekta PTS sistema (tzv. vazdušne pošte) i povećanje inicijalne linije sa 3 na 8</b></p> <p><b>5. Angažovan revident i ekspert za realizaciju tendera po EU pravilima</b></p> <p><b>6. Redovna OnLine komunikacija, sastanci sa LP i ostalim PP</b></p> <p><b>7. Istraživanje tržišta, single tender, ugovor, isporuka i plaćanje za promotivni materijal, uz izradu CIP-a za brošure kod Nacionalne biblioteke CT</b></p> <p><b>8. Istraživanje tržišta, single tender, ugovor, isporuka i plaćanje za 2 laptop računara sa operativnim sistemom i kancelarijskim programima i 2 monitora za članove projektnog tima OB Bar</b></p>	<p><b>4. Zaključeni podugovori sa izvođačima za izradu glavnog projekta</b></p> <p><b>5. Mjesečni sastanci čl. tima sa menadžmentom i revidentom i ekspertom, Ugovor</b></p> <p><b>6. Zapisnici, PrtScr, modifikacije projekta</b></p> <p><b>7. Tenderska i ostala prateća dokumentacija za nabavku promo materijala</b></p> <p><b>8. Tenderska i ostala prateća dokumentacija za računarsku opremu</b></p>	<p><b>4. početak 2021. g.</b></p> <p><b>5. januar-decembar 2021.g.</b></p> <p><b>6. januar-decembar 2021.g.</b></p> <p><b>7. jun-avgust 2021.g.</b></p> <p><b>8. jun-avgust 2021.g.</b></p>			
2021							

		<p><b>9. Redovan projektni sastanak uživo Bar</b></p> <p><b>10. Učešće u izradi promo filma za projekte na programu Interreg IPA CBC HR-BA-ME za Dan evropske saradnje</b></p> <p><b>11. Organizacija međunarodnog putovanja za predstavljanje primjera dobre prakse</b></p> <p><b>12. Raspisan tender za nabavku i instalaciju PTS</b></p>	<p>fotografije, konferencija za novinare, medijski izvještaji (društvene mreže (FB, Instagram), OB Bar site, Barinfo, RTCG, Pobjeda, Jedro, Feral)</p> <p>10. Promo film, objave (gov.me site, site EU kancelarija u CG, site Opštine Bar, site OB Bar, portal Bar, Jedro, Feral, RTCG, Barinfo, Pobjeda, Dan, YouTube, društvene mreže)</p> <p>11. Troškovi putovanja, potpisna lista, fotografije, objave na site OB Bar i društvenim mrežama</p> <p>12. Tenderska i prateća dokumentacija</p>	<p>10. 1.oktobar 2021.g.</p> <p>11. 24. – 26. oktobar 2021.g.</p> <p>12. 28.12.2022.g. otvaranje 4.feb.2022.g.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

## Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.8.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP) <sup>22</sup>	9.368,41 <sup>23</sup>			6.689,18 <sup>24</sup> -IPA Izvještaj 3.1 2.679,23 <sup>25</sup> -IPA Izvještaj 4.1

## Projektni Plan: DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	-unapređenje brige o starijima u opštini Bar - obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe starih			-Opština Bar -Caritas		188.428,07	9.421,40 5% od ukupnih troškova realizacije projekta		179.006,67 €	- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

## Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE)	1. Opremljen je i stavljen u funkciju Dnevni boravak u	1. Tenderska dokumentacija, inventarska lista, fakture i		Caritas	Opština Bar	Projekat se realizuje planiranim dinamikom. Realizacijom ovog projekta unaprijeđen je nivo socijalne brige o licima starije životne dobi i obezbjeđeni su adekvatni uslovi za pružanje usluge dnevног boravka za tu populaciju.

<sup>22</sup> NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dokim 15% predstavlja učešće OB BAR.

<sup>23</sup> Troškovi se prijavljuju po principu Flat Rate, tako da u prva dva izvještajna perioda nije bilo prijave troškova.

<sup>24</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

<sup>25</sup> Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

	<u>CENTER FOR ELDERLY – BAR)</u>	okviru Caritasovog centra  2. 30 korisnika je obuhvaćeno uslugama Dnevnog boravka  3. Sačinjen je i distribuiran informativni letak o projektu  4. Pokrenut je postupak za izdavanje licence od strane resornog ministarstva Caritasu, kao pružaocu ove socijalne usluge	računi, fotografije, Izvještaj o aktivnostima Dnevnog centra 2. Dosijej korisnika Dnevnog centra, fotografije, Izvještaj o aktivnostima Dnevnog centra 3. Letak, račun 4. Zahtjev i prateća dokumentacija pripremljena u skladu sa Pravilnikom za licenciranje	2020- 2021- 2022			Servis Dnevnog boravka za starije osobe je licenciran za 30 korisnika kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja od 15.06.2021.  Dnevni boravak je svečano otvoren 30.09.2021. od strane gospodina Dušana Raičevića, predsjednika opštine Bar, gospode Ljilje Dušaj, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja i nadbiskup barski mons Rrok Gjonlleshaj.  Međunarodni projekat se realizuje prema planu do 28.02.2022 godine
--	--------------------------------------	--	---	------------------	--	--	---

### Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	144 342,97			144 342,97 - IPA

## Prioritet 2. Obezbeđenje veće uključenosti ranjivih grupa

### Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.2.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU</u>	- Omogućen adekvatan dnevni boravak djeci sa smetnjama u razvoju.			-Vlada Crne Gore	- Ministarstvo rada i socijalnog staranja  - Ministarstvo finansija  -Opština Bar	390.000,00	63.000,00	137.000,00 (Uplaćeno od strane Min. finansija 2009. godine)  312.879,88 <sup>26</sup>		- Odluka o osnivanju Dnevnog centra  - Izvještaj o tehničkom priјemu  - Izvještaj o radu predsjednika  - Izvještaji Min rada, Min. prosvjete i Min. finansija

### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovo- denja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.2.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada ideinog rješenja)</u>	1.Raspisan Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju  2.Izabrana idejna rješenja u formi prve, druge i treće nagrade i izvršena dva otkupa idejnih rješenja  3.U galeriji Kulturnog centra organizovana je izložba svih radova pristiglih na Konkurs  4. Sproveden postupak jednostavne javne	1. Tekst Konkursa objavljen na sajtu Opštine Bar, u štampanim i elektronskim medijima  2. Završni izvještaj žirija br. 01-018/21-845  3.Fotografije sa izložbe  4.Ugovor za izradu glavnog projekta	2020 -2021	Opština Bar	- Ministarstvo rada i socijalnog staranja  - Ministarstvo finansija  -Opština Bar	Odlukom predsjednika Opštine Bar dana 31.12.2020. raspisan je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Za sprovođenje ovog projekta u budžetu Opštine Bar za 2021.godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od <b>200.000,00€</b> . Važno je podsjetiti da je dio sredstava za ovu namjenu, u iznosu od <b>137.000,00€</b> , uplaćen Opštini Bar 2009. godine, od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, na osnovu prethodno potpisano Sporazuma. Nažalost,zbog nedobijanja saglasnosti Upravnog odbora OŠ "Meksiko" o ustupanju dijela parcele koja je DUP-om "Polje-Zaljevo" određena za izgradnju ovog objekta, nije bilo moguće pokrenuti radnje kojima bi bila započeta realizacija ovog projekta. Ugovorena vrijednost radova za izradu glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa DOO "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" iznosi <b>11.797,50€</b> . Shodno glavnom projektu vrijednost radova na izgradnji objekta iznosi <b>1.454.254,99€</b> . Ugovorena vrijednost radova za vršenje revizije glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa DOO "Kov atelje" NK iznosi <b>2.879,80€</b> sa PDV-om.

<sup>26</sup> Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 / Aktivnost 22 025 K01 007 / Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

		nabavke za izradu glavnog projekta dnevnog centra	dnevnih centra za djecu sa smetnjama u razvoju, br. 01-018/21-2448 od 27.08.2021.g		4. DOO "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" PG	Ugovarena vrijednost radova za izvođenje geotehničkih istraživanja sa DOO "Geoprojekt" PG iznosi <b>3.472,70€</b> sa PDV-om.
		5. Sproveden postupak javne nabavke za vršenje revizije glavnog projekta	5. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, br. 01-018/21-3322 od 10.11.2021.g.	5. Okt/21	5. DOO "Kov atelje" NK	U narednim fazama, učešće u realizaciji ovog projekta, pored Opštine Bar, treba da preuzmu i državni organi, u prvom redu resorna ministarstva i Uprava javnih radova. S tim u vezi, Vlada Crne Gore je kapitalnim budžetom za 2022. godinu opredjelila iznos od <b>390.200,00€</b> za ovu namjeru.
		6. Sproveden postupak javne nabavke za izvođenje geotehničkih istraživanja	6. Ugovor za izvođenje geotehničkih istraživanja, br. 01-018/21-28/8 od 29.09.2021.g.	6. Sept21-Okt/21	6. DOO "Geoprojekt" PG	Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je sprovođenje postupka za odabir izvođača. Procijenjena vrijednost izgradnje objekta je <b>1.116.400,00€</b> sa PDV-om.
		7. Sproveden postupak javne nabavke za izvođenje geotehničkih istraživanja	7.Ugovor za izvođenje geotehničkih istraživanja, br. 01-018/21-28/8 od 29.09.2021.g.	7.Sept21-Okt/21	7. DOO "Geoprojekt" PG	Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je sprovođenje postupka za odabir stručnog nadzora na izgradnji objekta procijenjene vrijednosti <b>30.250,00€</b> sa PDV-om.

### Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.2.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada idejnog rješenja)</u>	10.384,60	10.384,60 <sup>27</sup>		

<sup>27</sup>Sredstva opredjeljena kao novčani Fond za organizovanje Konkursa i dodjelu nagrada

### **Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVODENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI**

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.2.3.	<b>REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVODENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI</b>	-Eliminisanje arhitektonskih i ambijentalnih barijera;  -podizanja svijesti o neophodnosti uvođenja elemenata pristupačnosti			-Opština Bar		150.000,00	150.000,00			-Tehnička dokumentacija  -Izvještaj predsjednika opštine

### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.2.3.	<u>REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVODENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI</u>  <b>Rekonstrukcija pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića</b> <p>1. Orientacione mape naručene za zgradu Opštine</p> <p>2. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za odabir izvođača za radove na rekonstrukciji pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića. Radovi su realizovani.</p> <p>3. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za vršenje stručnog nadzora</p>	<p>1. Orientacione mape naručene za zgradu Opštine</p> <p>2. Ugovor za rekonstrukciju pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Stojanovića, br. 01-018/21-3526, od 29.11.2021.g</p> <p>3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora, br. 01-018/21-3844 od 17.12.2021.g.</p>	kontinuirano	Opština Bar	2. DOO "Bomakos" PG  3. DOO "Art Construction" BR	Ugovorena vrijednost radova iznosi 36.215,18€.  Radovi na rekonstrukciji su realizovani pri čemu su postavljene i taktilne ploče u centru grada (ispred Cosmetics-a).	Vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 363,00€.

**Finansijska Realizacija**

	<i>Projekat</i>	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS ()</i>	<i>Državni budžet (€)</i>	<i>Drugi izvori (€)</i>
9.3.2.3.	<u>REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVODENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI</u>	36.578,18			
9.3.2.3.	<i>Rekonstrukcija pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića</i>	36.578,18	36.578,18		

### Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine

#### Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementacij i	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.3.1.	<u>REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU</u>	-Rekonstrukcija objekta radi stvaranja boljih uslova rada i proširenja djelatnosti (pozorišni, muzički program, filmske projekcije, amaterska scena i edukacija građana), za potrebe stanovništva i podizanje nivoa kulture		-J.P.Kulturni centar Bar	- Ministerstvo kulture  -Opština Bar	3.000.000,00		130.626,84 <sup>28</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektno tehničke dokumentacije</li> <li>-izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije</li> <li>-izvještaj o sprovedenom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta</li> <li>-izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine</li> </ul>

#### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.1.	<u>REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU</u>	1.zamjenjenje daske na velikoj sceni  2.savremena audio mikseta  3.remontovan centralni sistem za grijanje sale	1.ugovor br.221 od 05.11.2019.g.  2.ugovor br.2332 od 03.12.2019.g.  3.ugovor br.770 od 30.10.2019.g. i br. 895 od 16.12.2019.g	2021-2022	-J.P.Kulturni centar Bar  -Ministarstvo kulture  -Opština Bar	-EURO-UNIT  -firma Potrlica doo Pljevlja  -" D2 systems" doo Podgorica	
2020		4.Instalirana četiri elektro-motorna cuga sa kompletnom instalacijom	4.ugovor br.664 od 03.06.2020. g.			4. -"ElektroVat" Čačak	- IPA projekt Comlicities u iznosu 16,002,00€

<sup>28</sup> Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 20 021 K01 012 / Rekonstrukcija Doma Kulture "Vladimir Popović Španac"

2021		<p>5.kompletna zamjena sjedišta, obnova scenske tehnike i ugradnja pozorišnih/binskih zavjesa</p> <p>6.digitalizaciju kino opreme Doma kulture, odnosno, nabavku savremenog DCP projektora najnovije generacije 4K rezolucije, kao i DOLBY 7.1 sistem ozvučenja</p>	<p>5.po tenderu br.1004 od 24.08.2021.g. ugovor br.03-3-426/21-1451 od 04.11.2021.g</p> <p>6.po tenderu br.923od 04.08.2021.g. ugovor 03-3-426/21-1350/2 od 15.11.2021.g.</p>			<p>5.-"Gat Montenegro" DOO Kotor</p> <p>6. Filmski Centar Crne Gore</p>	<p>-izvršena je i kompletna zamjena sjedišta, obnova scenske tehnike i ugradnja pozorišnih/binskih zavjesa"</p> <p>-Opština Bar je "Sporazumom o transferu sredstava" broj 01/018/21-239 od 19.08.2021 godine prenjela sredstva u iznosu od <b>41.273,00€</b></p> <p>- IPA projekta Comlicities <b>46,252,00€</b></p> <p><b>-110.000,00€</b> Ministarstvo kulture 50.000,00€ Filmski centar 60.000,00€</p>
------	--	---	---	--	--	---	--

### Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.3.1.	<u>REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU</u>	218.525,02	41.273,00		5.000,00 JU Kulturni centar Bar 62.252,02 IPA projekat Comlicities 50.000,00 Ministarstvo Kulture 60.000,00 Filmski centar

## Projektni Plan: SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Društveni izvori (€)	
9.3.3.2. SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU	-zaštita i adekvatna prezentacija eksponata i pokretnih kulturnih dobara			- J.P.Kulturni centar Bar	-Ministarstvo Kulture Crne Gore  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara  -Opština Bar	280.000,00	65.000,00	195.000,00	20.000,00 Kulturni centar Bar	-izvještaj o zaključenom ugovoru za izradu sanaciono konzervatorskog projekta  -izvještaj o realizaciji

### Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.2. SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU	<p>1.izrada konzervatorskog projekta krova na zgradi Dvorca kralja Nikole</p> <p>2.(javni poziv za izvodjenje građevinskih radova u toku)</p> <p>3.potpisani ugovor za izvođenje restauratorskih radova na sanaciji krova "Dvorca kralja Nikole" (JU Kulturni centar i BomBeton-Cetinje)</p> <p>4.javni poziv za vršenje stručnog nadzora nad radovima sanacije krova Dvorca kralja Nikole u Baru)</p>	<p>1.ugovor br 03-3-426/21-1395/2 od 22.10.2021.</p> <p>2.javni poziv br. 03-3-426/21-1498 od 18.11.2021.g.</p> <p>3. ugovor br.03-3-426/21-1697/2 od 28.01.2022.g.</p> <p>4. ugovor br.03-3-426/22-30/5 od 24.01.2022.godine</p>	2021-2022	<p>- Opština Bar</p> <p>-Ministarstvo Kulture Crne Gore</p> <p>-Uprava za zaštitu kulturnih dobara</p>	<p>- "Restarting" DOO Budva</p> <p>3.BomBeton d.o.o Cetinje</p>	<p>Opština Bar dana 07.09.2021. godine, u skladu sa "Sporazumom o transferu finansijskih sredstava za potrebe adaptacije dijela zgrade muzeja – Dvorca kralja Nikole", potpisanim 06.09.2021. godine, transferisala iznos od <b>75.000,00</b> eura JP Kulturnom centru Bar.</p> <p>18.11.2021. godine sproveden je Javni poziv za izvođenje restauratorskih radova na sanaciji krova " Dvorca kralja Nikole". 20.12.2021. godine su pristigle tri ponude: firma "Montal" DSD-Podgorica, KOTO Doo-Beograd i BomBeton- Cetinje. Odlukom postavljenom na sajtu 30.12. 2021. godine, kao ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana je firma BomBeton – Cetinje.</p> <p>18.01.2021. godine sproveden je Javni poziv (jednostavne nabavke) za vršenje stručnog nadzora nad radovima sanacije krova Dvorca kralja Nikole u Baru.21.01.2022. godine su pristigle tri ponude: firma " Restart ing " – Budva,EnForma-Kotor,Dema Doo-Kotor. Kao ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana je firma Restarting-Budva</p> <p>Po ugovoru br.03-3-426/21-1697/2 od 28.01.2022.g.( JP Kulturni centar-BomBeton) radovi na sanaciji krova Dvorca kralja Nikole započeli su 15.02.2022. godine, a završetak radova je planiran u roku od 60 dana, shodno vremenskim uslovima.</p>

**Finansijska Realizacija**

	<i>Projekat</i>	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS ()</i>	<i>Državni budžet (€)</i>	
9.3.3.2.	<u>SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU</u>	79.840,00	75.000,00		4.840,00 sopstvena sredstva

## **Projektni Plan: ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.3.4.	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)	- uređenje enterijera - rekonstrukcija krova - uređenje zapadne fasade		- JP Kulturni centar Bar - Opština Bar	- Vlada Crne Gore	90.000,00	20.000,00	70.000,00		- izvještaj o enterijerskom uređenju prostora - izvještaj o urađenim radovima

### **Realizacija Projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sproveđenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.4.	<p><u>ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)</u></p> <p>1.Izvršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu (rekonstrukcija krova i otvora na istočnoj fasadi)</p> <p>2.Izrađen projekat enterijera</p> <p>3.Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji enterijera i sa istim zaključen Ugovor</p> <p>4.Ugovor za nadzoru nad izvođenjem radova</p> <p>5. javni poziv za izradu izložbenih vitrina (jednostavne nabavke)</p>	<p>1.Ugovor o izvođenju radova br.156 od 18.11.2020. Izvještaj o izvedenim radovima</p> <p>2. Ugovor o javnoj nabavci br.113/2019 od 5.11.2019.g.</p> <p>3.Ugovor o javnoj nabavci br.01-334/20-1567 od 06.03.2020, zaključen između Uprave javnih radova i d.o.o. "Bombeton" sa Cetinja, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/20-810 od 07.02.2020.g</p>	<p>1. novembar 2020-januar 2021.g.</p> <p>2. januar 2020.</p> <p>3. mart 2021.</p>	<p>1.JP Kulturni centar Bar</p> <p>2.Ministarstvo Kulture</p> <p>3.Uprava za javne radove</p> <p>4. "Enforma" d.o.o. Kotor</p> <p>5. Anglian" doo Bar</p>	<p>1."Montal DSD" d.o.o. Podgorica</p> <p>2. "Studio Prostor" d.o.o., Podgorica</p> <p>3."Bombeton" d.o.o. Cetinje</p>	<p>1.Vrijednost ugovorenih radova iznosila je <b>23.534,50€</b>, sa uračunatim PDV-om. Da bi se stvorili uslovi za valorizaciju ovog objekta u muzejske svrhe, prвobitno je neophodno bilo izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na objektu, што je u ovoj fazi projekta i realizовано. Naredna faza se odnosi na adekvatno uređenje enterijera. 2.Vrijednost ugovorene usluge iznosila je <b>5.989,50</b> , sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3.Ugovor sa "Bombeton" d.o.o. Cetinje br.01-334/20-1567 od 06.03.2020. sa uračunatim PDV-om iznosi <b>91.499,99 €</b>. Nakon završetka radova na uređenju enterijera objekta, preostali dio projekta se odnosi na njegovo opremanje muzejalijama.</p> <p>4. Ministarstvo kulture je ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova zaključilo 17.07.2020 godine, broj 01/334-205581 sa firmom "Enforma" d.o.o. Kotor u iznosu od <b>4.500,00 €</b>.</p> <p>Ekonomski najpovoljniji ponuđač firma "Anglian" Bar izradila je izložbene vitrine za potrebe arheološkog odjeljenja u iznosu od <b>5.200,00 eura</b>.Otvaranje arheološkog odjeljenja planirano je do kraja aprila 2022.godine.</p>

## **Finansijska Realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS ()</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	<b>Drugi izvori (€)</b>
9.3.3.4.	<u>ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA</u> <u>- ARHIEPISKOPSKA PALATA</u> <u>(OBJEKAT 194)</u>	25.712,5	20.000,00 <sup>29</sup>		5.712,50- JP "Kulturni centar"
2021		101.989,49		5.989,50 <sup>30</sup> 91.499,99 4.500,00	

<sup>29</sup> II faza projekta -2020. godina 25.712,50 eura(Opština Bar 20.000,00 + 5.712,50 sopstvena sredstva)

<sup>30</sup> izvor finansiranja Kapitalni budžet Crne Gore

## Prioritet 4. Razvoj sportske infrastrukture

### Projektni Plan: IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.4.1.	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI	-Izgradnja natkrivenog terena  -unapređenje sporta u Mrkojevićima		-Vlada Crne Gore <sup>31</sup>	- Opština Bar  - MZ Pećurice	715.331,47	150.000,00 <sup>32</sup>		50.000,00 <sup>33</sup>	-Izrada idejnog projekta -izvještaj o izradi glavnog projekta; izvještaj revizije glavnog projekta; -Izvještaj o sprovođenjem tenderskim procedurama; -Izvještaji o realizaciji izvještaj o tehničkom prijemu

### Realizacija Projekta

Projekat		Ostvareni rezultati	Indikator i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.4.1.	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI	1.Idejni projekat fiskult. sale OŠ "Mrkojevići"  2.Urađen glavni projekat fiskult. sale OŠ "Mrkojevići"  3.revizija glavnog projekta (u toku)	1.Ugovor za izradu idejnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići”, broj 01-018/21-1670 od 16.06.2021.g.  2.Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići” broj 01-018/21-1683 od 17.06.2021.g  3.Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići”, broj 01- 018/21-13642 od 06.12.2021.g	Jun 2021 – Avg 2021  Jun 2021- Dec 2021  3.Dec 21-	Opština Bar  2.“Archistudio” DOO Ulcinj  3.DOO “Arch Soul” BP	1.“Archistudio” DOO Ulcinj  2.“Archistudio” DOO Ulcinj  3.DOO “Arch Soul” BP	Ugovorenna vrijednost izrade idejnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosil 3.630,00€ sa PDV-om.  Ugovorenna vrijednost izrade glavnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosi 5.445,00€ sa PDV-om.  Ugovorenna vrijednost vršenja revizije glavnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosi 3.477,15€ sa PDV-om.  Vrijednost izgradnje objekta shodno glavnom projektu iznosi 702.779,31€ sa PDV-om.

<sup>31</sup> Ministarstvo prosvjetе, nauke, kulture i sporta - Vlada Crne Gore

<sup>32</sup> Memorandumom o realizaciji i sufinansiranju projekta "Izgradnja školske sportske sale JU OŠ "Mrkojevići", opština Bar" zaveden u Službi Predsjednika pod brojem 01-018/20-3216 od 30.11.2020. godine.

<sup>33</sup> iznos je predviđen u dolarima (dollars) – donator Udruženje "Rumija-Čikago"

## **Finansijska Realizacija**

	<i>Projekat</i>	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS ()</i> €)	<i>Državni budžet (€)</i>	<i>Drugi izvori (€)</i>
9.3.4.1.	<u>IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI</u>	9.075,00	9.075,00 <sup>34</sup>		

<sup>34</sup> troškovi izrade idejnog i glavnog projekta

## **Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar**

### **Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastructure**

#### **Projektni Plan: GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.1.	<b>GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA</b>	-izrada glavnog projekta;  -revizija glavnog projekta		-Opština Bar	-JP Regionalni vodovod	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Tenderska procedura za izradu glavnog projekta/zaključen ugovor sa najboljim ponuđačem  -Tenderska procedura za reviziju glavnog projekta/zaključen ugovor za reviziju glavnog projekta

#### **Realizacija Projekta**

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.1.	<b>GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA</b>	1.analiza i izrada idejnog rješenja (u toku)			-Regionalni vodovod Crnogorsko primorje d.o.o., Budva		

#### **Finansijska Realizacija**

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.1.1.	<b>GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA</b>				

## Projektni Plan. OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nositelj projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja			-Opština Bar	Opština Bar  -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar	313.536,62	313.536,62			- izrada projektno tehničke dokumentacije  -izrada studija zaštite parkova  -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine.

### Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sproveđe- nja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU-</u>  Park na UP Z20, blok "2", zona "B", po DUP- u "Topolica Bjeliši"	1. Urađeno idejno rješenje  2. Urađen Glavni projekt	1. Ugovor za izradu idejnog rješenja za uređenje parkovske površine, br. 01-018/20-2715 od 19.10.2020.g. Fakturna izvođača DOO "Arch & Construction" UL  2. Ugovor za izradu gl.projekta za izgradnju i uređenje parkovske površine, br. 01-018/20-1901 od 20.07.2020.g. Fakturna izvođača DOO "Arch & Construction" UL	1. Okt/20  2. Okt/20- Nov/20	Opština Bar	1. DOO "Arch & Construction" UL  2. DOO "Arch & Construction" UL	1. Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja 332,75€ sa PDV-om.  2. Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta je 12.899,00€ sa PDV-om.
2021		3. Izvršena revizija glavnog projekta  4. Sproveden postupak javnih nabavki i izabran izvođač radova DOO "Grand design" iz Podgorice  5. Ugovor o izvođenju radova je raskinut	3. Ugovor  4. Ugovor za uređenje javne površine – parka Topolica Bjeliši na UP Z20, br. 01-018/21-1898 od 05.07.2021.g.  5. Izjava o jednostranom raskidu ugovora, br. 01-	3. Dec/20- Feb/21  4. Apr/21- Jul/21  5. Nov/21		3. DOO "Mageling" BR  4. "Grand design" PG  5. "Grand design" PG	3. Vršenje revizije glavnog projekta predstavlja donaciju DOO "Mageling" iz Bara  4. Ugovor sa izvođačem DOO "Grand design" zaključen je na iznos od 152.680,62€ sa PDV-om.  5. Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza koje se odnose na ugovorenu dinamiku i kvalitet radova.

		<p>6. Sproveden novi postupak javne nabavke i izabran izvođač radova DOO "Civil engineer" iz Podgorice</p> <p>7. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir stručnog nadzora na izgradnji.</p>	<p>018/21-2911/1 od 06.10.2021.g.</p> <p>6. Odluka o izboru najpojednostavljenije ponude</p> <p>7. Ugovor za vršenje stručnog nadzora br. 01-018/21-2042 od 16.07.2021.g.</p>	<p>6. Okt/21-Nov/21</p> <p>7. Jul/21</p>		<p>6. "Civil engineer" iz Podgorice</p> <p>7. Konzorc. DOO "Arhitektura aurea" PG I DOO "Planplus" PG</p>	<p>ugovor sa DOO "Grand design" PG je raskinut</p> <p>6. Vrijednost radova na uređenju parka shodno ugovoru zaključenom sa DOO "Civil engineer" iz Podgorice iznosi <b>200.040,63€</b> sa PDV-om. Realizacija radova je u toku.</p> <p>7. Ugovorena vrijednost usluge vršenja stručnog nadzora iznosi <b>4.961,00€</b> sa PDV-om.</p>
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>  <b>Park na UP Z16, blok "2", zona "B", po DUP-u "Topolica Bjeliši"</b>	<p>1. Izrada geodetske podloge i Elaborata parcelacije</p> <p>2. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta pejzažne arhitekt., br. 01-018/21-3029 od 18.10.2021.g.</p>	<p>1. Obavljanje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-1380 od 21.07.2021.g.</p> <p>2. Ugovor za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta pejzažne arhitekt., br. 01-018/21-3029 od 18.10.2021.g.</p>	<p>1. Jul/21-Sep/21</p> <p>2. Nov/21</p>	<p>Opština Bar</p>	<p>1. DOO "Ekvidistanca" BR</p> <p>2. DOO "Planplus" PG</p>	<p>1. Vrijednost izrade geodetskih radova je <b>363,00€</b> sa PDV-om.</p> <p>2. Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja i glavnog projekta iznosi <b>2.620,00€</b> sa PDV-om.</p> <p>Vrijednost radova shodno gl projektu iznosi <b>48.807,77€</b> sa PDV-om.</p>
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>  <b>Adaptacija pionirskog parka</b>	<p>1. Urađen katastarsko – topografski plan</p> <p>2. Sproveden postupak javnih nabavki i izabran izvođač radova</p> <p>3. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir stručnog nadzora na adaptaciji parka</p>	<p>1. Obavljanje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-2614</p> <p>2. Ugovor za adaptaciju pionirskog parka, br. 01-018/21-3578 od 01.12.2021.g.</p> <p>3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora br. 01-018/21-3844 od 17.12.2021.g.</p>	<p>1. Nov/21</p> <p>2. Dec/21</p> <p>3. Dec/21-Mart/22</p>	<p>Opština Bar</p>	<p>1. DOO "Cading" BR</p> <p>2. Konzorcijum "Gradnja inženjerstvo MNE" – Montecontrol</p> <p>3. DOO "Art Construction" BR</p>	<p>1. Troškovi geodetskih radova iznose <b>544,50€</b> sa PDV-om.</p> <p>2. Ugovor za adaptaciju pionirskog parka zaključen je na iznos <b>42.362,97€</b> sa PDV-om.</p> <p>3. Ugovorena vrijednost usluge vršenja stručnog nadzora je <b>605,00€</b> sa PDV-om</p> <p>4. Radovi su realizovani</p>

## **Finansijska Realizacija**

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>		
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS ()</b>	<b>Državni budžet (€)</b>
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>	53.095,34	53.095,34	
	Park na UP Z20, blok “2”, zona “B”, po DUP-u “Topolica Bjeliši” <sup>35</sup>	52.187,84 <sup>35</sup>	52.187,84	
	Park na UP Z16, blok “2”, zona “B”, po DUP-u “Topolica Bjeliši”	363,00	363,00	
	Adaptacija pionirskog parka	544,50	544,50	

<sup>35</sup> Troškovi izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i prvr. situacija za radove na uređenju parka

## **Projektni Plan: UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.5. <b>UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja			-Opština Bar  -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar		200.000,00				-Odluka o izboru lokacija namjenjenih za unaprijeđenje sistema -izrada projektno tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izveštaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

### **Realizacija Projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovodenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.5. <b>UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<p>1.-bunar kod Dvorca Kralja Nikole, djelimično urađen sistem za zalivanje.</p> <p>-bunar, neposredno uz Bulevar Dinastije Petrović ispred zgrade H24, urađen sistem za zalivanje</p> <p>-bunar kod zelene pijace</p> <p>-bunar kod zgrade F16</p> <p>2.-Zelena površina ispred sportske dvorane "Topolica" sa ugrađenim automatskim zalivanjem 4.500 m<sup>2</sup> površine.</p> <p>-Razdjelno ostrvo od kružnog toka kod mosta Željeznice do "Mimoze" (sistem kap po kap sa automatskim upravljanjem)</p>	<p>1.Tehnička dokumentacija</p> <p>2.Tehnička dokumentacija</p>	<p>1.realizovano</p> <p>2.realizovano</p>	<p>1.Komunalne djelatnosti DOO</p> <p>2.Komunalne djelatnosti DOO</p>		

		-Kružni tok kod "Mimoze" (kap po kap sa automatskim upravljanjem)					
--	--	---	--	--	--	--	--

### ***Finansijska Realizacija***

	<b>Projekat</b>	<b>Utrošena sredstva</b>			<b>Drugi izvori (€)</b>
		<b>Ukupno €</b>	<b>Budžet JLS (€)</b>	<b>Državni budžet (€)</b>	
9.4.1.5.	<u>UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALitetNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</u>	20.400,00			1. 2.400,00 Komunalne djelatnosti DOO 2. 18.000,00 Komunalne djelatnosti DOO

## **Projektni Plan: IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.6.	<b><u>IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</u></b>	-Obezbeđivanje adekvatnih uslova za zbrinjavanje napuštenih životinja, prvenstveno pasa latalica na teritoriji opštine Bar			-Opština Bar  -D.O.O. "Lovstvo" Bar  -nevladine organizacije i udruženja,	560.756,28	560.756,28			-Odluka o opredjeljivanju lokacije namijenjene za izgradnju -izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektno tehničke dokumentacije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

## **Realizacija Projekta**

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta	
9.4.1.6.	<b><u>IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</u></b>	<p>1.Izrada geodetske podloge i Elaborata parcelacije</p> <p>2.Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta skloništa za napuštene životinje.</p>	<p>1.Obavlještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-917 od 28.04.2021.g. Fakturna DOO "Ekvidistanca" BR Fakturna DOO "Cading" BR</p> <p>2.Obavlještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke za izradu idejnog rješenja objekta br. 04-426/21-1079 od 28.05.2021. Fakturna DOO "Basketing" BR  Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju objekta skloništa sa pratećom</p>	<p>1. Maj/21 - Nov/21</p> <p>2. Maj/21 - Dec/21</p>	<p>Opština Bar</p>	<p>1. DOO "Ekvidistanca" BR DOO "Cading" BR</p> <p>2. DOO "Basketing" BR</p>	<p>1. Troškovi izrade geo podloge i elaborate parcelacije iznose 726,00 € sa PDV-om.</p> <p>2. Troškovi izrade idejnog rješenja iznose 3.327,50€, a ugovorenra vrijednost izrade glavnog projekta iznosi 6.037,90€ sa PDV-om</p>

		<p>3.Izrada Elaborata geotehničkih ispitivanja</p> <p>4.Izrada revizije Glavnog projekta</p> <p>5.Objavljen postupak javnih nabavki za odabir izvođača. Postupak je poništen jer nije bilo podnijetih ponuda.</p> <p>6.Objavljen novi postupak javnih nabavki za odabir izvođača.</p>	<p><i>infrastrukturom br. 01-018/21-2313 od 11.08.2021.g. Fakturna DOO "Basketring" BR</i></p> <p><i>3.Ugovor za izradu geotehničkog elaborata br. 01-018/21-2817 od 29.09.2021.g. Fakturna DOO "Geotehnika" NK</i></p> <p><i>4.Obaveštenje o ishodu postupka jednostavne nabavke za izradu revizije projekta br. 04-426/21-1745/1 od 04.10.2021.g. Fakturna DOO "Mageling" BR</i></p> <p><i>5.Odluka o poništenju postupka javne nabavke br.01-018/21-3626/1 od 06.12.2021.g</i></p> <p><i>6.Tenderska dokumentacija</i></p>	<p>3. Sept/21 - Okt/21</p> <p>4. Okt-Nov/21</p> <p>5. Dec/21</p> <p>6. Dec/21</p>		<p>3. DOO "Geotehnika" NK</p> <p>4. DOO "Mageling" BR</p>	<p>3. Ugovorena vrijednost izrade geotehničkog elaborate iznosi 3.707,44€ sa PDV-om.</p> <p>4. Troškovi revizije glavnog projekta iznose 968,00€ sa PDV-om.</p>
--	--	---	---	---	--	---	---

### **Finansijska Realizacija**

	Projekat	<i>Utrošena sredstva</i>			
		<i>Ukupno €</i>	<i>Budžet JLS (€)</i>	<i>Državni budžet (€)</i>	<i>Drugi izvori (€)</i>
9.4.1.6.	<u>IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</u>	14.766,84	14.766,84		

## ZAKLJUČAK

Od ukupno 99 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja opštine Bar 2020-2025., za sprovođenje tokom 2021.godine bilo je delegirano 32 projekta, od čega je sedam realizovano i okončano, dok je 25 u različitim fazama sprovođenja. Svih 7 završenih projekata je sa jednogodišnjim trajanjem, a ostalih 25 se sprovodi kontinuirano u dužem vremenskom periodu.

Projekti predviđeni Godišnjim akcionim planom su realizovani ili su u toku, dok je u njihovu finansijsku realizaciju u 2021. godini uloženo, zaključno sa **31.12.2021.** godine ukupno **2,267,241.75€**.

Imajući u vidu da je zbog situacije izazvane pandemijom COVID19 u 2021. godini bilo otežano poslovanje svih subjekata i usled toga značajno usporena dinamika realizacije planiranih projekata, a ovo se posebno odnosi na projekte koji su bili inicijalno planirani za kompletну realizaciju u 2021. godini, na zahtjev nosilaca projekata, kroz dinamiku realizacije i finansijska sredstva produženi su i izmjenjeni projekti "Digitalizacija starog Bara" (projekat Fortitude) i "Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva".

Takođe je važno napomenuti stavku kojom Vlada iz kapitalnog budžeta finansira projekte. Naime, u odnosu na 2020. godinu, kada je procenat ulaganja iz džavnog udžeta iznosio **23,76%**, ulaganje za ovaj izvještajni period je svega **6,68%**, što ukazuje na to da planiranje i usaglašavanja projekata u kojima se Vlada javlja kao investitor ili učesnik, sa postojećim Strateškim planom opštine Bar 2020-2025, nema potrebnii kontinuitet.

Neophodno je osvrnuti se na broj realizovanih projekata od usvajanja SPR-a (ukupno 21), s tim što je važno napomenuti da se određeni projekti sprovode na godišnjem nivou, pa se u kontinuitetu ponavljaju: Podrška razvoju poljoprivrede u opštini Bar, Podrška preduzetništvu kroz biznis ideje, Podrška ženskom preduzetništvu kroz biznis ideje.

Napomene u vezi same realizacije Godišnjeg Akcionog Plana, Strateškog Plana Razvoja 2020-2025 za 2021. godini su sledeće:

- Izuzetno je važno da se u GAP uvrste projekti koji imaju realnu mogućnost sprovođenja u određenom periodu planiranja. Ovo se podjednako odnosi na delegiranje projekata na nivou Opštine Bar kao i na koordinaciju projekata između Opštine Bar i Vlade Crne Gore
- Prilikom planiranja i usaglašavanja potrebno je obratiti pažnju na interaktivni odnos u razmjeni informacija Opština – Privredna društva, kod kojih je osnivač Opština Bar, kao jedan od preduslova uspešnosti realizacije Strateškog plana.
- U okviru pribavljanja ulaznih parametara koji se odnosi na realizaciju Strateškog plana, neophodno je na nivou opštine objediti sve učesnike od planiranja do realizacije kroz centralni informacioni sistem kako bi svaki pomenuti podatak bio transparentno i trenutno dostupan
- Obratiti pažnju na finansijsko planiranje koje nije moglo biti opredjeljeno prilikom izrade Strateškog plana razvoja. Naime, u projektima koji su na nivou glavnog projekta i revizije morao bi da bude naznačen i planirani iznos cijene koštanja izrade projekta i revizije.

Imajući u vidu stepen realizacije projekata u 2021. godini, a naročito stepen realizacije jednogodišnjih projekata u procentu 77,8, može se zaključiti da je realizacija SPR-a za 2021. godinu veoma uspešna.
