



OPŠTINA BAR

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BAR
(2020-2025.)
za 2022. godinu**

maj, 2023. godine

Sadržaj

Uvod.....	3
I Strateški okvir politike lokalnog razvoja.....	3
II Metodologija izrade Izvještaja.....	4
III E-registar - Strateški plan razvoja opštine Bar 2020-2025.....	5
IV Stepen realizacije okončanih projekata.....	7
V Projekti predviđeni godišnjim akcionim planom (GAP) za 2022. godinu.....	9
VI Analiza strukture izvora finansiranja.....	10
Godišnji izvještaj sprovođenja projekata.....	13
Zaključak	101

Uvod

Zakonski osnov za izradu Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana opštine Bar (2020-2025.) za 2022. godinu sadržan je u članu 11 stav 3 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, broj 20/11, 26/11, 20/15, 47/19), koji definiše obavezu jedinica lokalne samouprave da pripreme i dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju Strateškog plana.

Predmet ovog izvještaja su podaci o statusu realizacije projekata koji su bili propisani Godišnjim akcionim planom za 2022. godinu, a koji su u funkciji sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025. (u daljem tekstu Strateški plan). Svi podaci dobijeni su od strane institucija koje su nosioci projekta, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata, a prikupljeni su putem službene korespondencije sa Sekretarijatom za razvoj.

U cilju praćenja i kontrole sprovođenja Strateškog plana, kao i procjene efekata koji se postižu realizacijom predviđenih projekata, uspostavljen je sistem monitoringa zasnovanog na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno i to u dijelu procesnih indikatora (faza u kojoj se nalazi realizacija projekta) i finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku).

I Strateški okvir politike lokalnog razvoja

Strateški plan razvoja opština Bar (2020-2025.) usvojen na sjednici Skupštine Opštine Bar održane 24. juna 2020.godine, predstavlja strateški okvir za vođenje politike lokalnog razvoja. Ovaj dokument usklađen je sa strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore i predstavlja preduslov za izradu drugih strateških dokumenata na lokalnom nivou.

Polazeći od toga da su ključni pravci razvoja crnogorske ekonomije pametan, održiv i inkluzivni rast, Opština Bar je, u funkciji njihovog dostizanja, kao svoj strateški cilj definisala ***dinamičan i održiv privredni rast i razvoj, uz otvorenost za sve građane***. Ovako široko postavljen opšti strateški cilj predstavlja veliki izazov i stoga u njegovo ostvarenje mora biti uključena cjelokupna zajednica.

Dostizanje zacrtanog strateškog cilja ostvaruje se kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritetnih oblasti koje su najrelevantnije za ravnomjeran razvoj cijele opštine. U tom smislu, opšti cilj je fokusiran na četiri specifična strateška cilja sa prioritetima:

1. **UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE**, prioritetno na bazi uređenja obalnog područja i unapređenja postojećih, odnosno uvođenja novih turističkih proizvoda;

2. **ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE KROZ UNAPREĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA** (razvoj poljoprivrede, smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva, iskorišćenje potencijala Slobodne zone Luke Bar, razvoj saobraćajne infrastrukture, unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave);

3. **ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR** kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, putem obezbjeđenja veće uključenosti ranjivih grupa, na bazi razvoja i promocije kulturne baštine i razvoja sportske infrastrukture;

4. **UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR**, uključujući kao prioritete razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sistema upravljanja otpadom i unapređenje energetske efikasnosti.

Polazeći od navedenog, implementacija Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 godine, odnosno Godišnjeg akcionog plana za 2022. godinu, fokusirana je na realizaciji prioriteta i mjera u ključnim oblastima razvoja, kroz projekte koji su mjerljivi, ostvarivi, jasno formulisani, međusobno usklađeni i usmjereni na ostvarenje strateškog cilja.

II Metodologija izrade Izvještaja

Metodologija izrade predmetnog izvještaja bazira se na prikazu realizacije Godišnjeg akcionog plana (GAP) za implementaciju Strateškog plana za 2021. godinu, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16).

Godišnji akcioni plan za 2022. godine koji je predmet izvještaja o realizaciji, organizovan je oko ključnih prioriteta iz oblasti sva četiri specifična strateška cilja i sadrži ukupno **38 projekta**. Za svaki pojedinačni projekat, pored njegovog naziva, navedeni su očekivani rezultati, period realizacije, nosioci aktivnosti, učesnici u implementaciji, troškovi realizacije specificirani prema izvoru finansiranja, kao i indikatori i sredstva provjere.

Takođe je važno napomenuti da su pojedini projekti u opisu navedeni u generičnom obliku kao što je "Rekonstrukcija javnih objekata kroz uvođenje elemenata pristupačnosti", dok je u planu realizacije svaki projekat posebno vođen kroz faze realizacije u jedinstvenom evaluacionom izvještaju.

Prema utvrđenoj metodologiji, evaluacioni izvještaj za svaki projekat sastavljen je iz:

- Projektnog Plana, kojim se ukratko definiše planirani projekat;
- Realizacije projekta, kojim se definišu sve aktivnosti vezane za realizaciju projekta i
- Finansijskog izvještaja, kojim se definišu novčani iznosi od strane svih nosioca aktivnosti iz projekta.

Period monitoringa obuhvata 2022. godinu, odnosno period od 01.01. do 31.12. 2022. godine.

Izvještaj je usmjeren na prikaz stepena napretka i ostvarenih rezultata projekata i aktivnosti koji su u funkciji ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta, pa je i strukturiran na takav način da omogućava uvid u projekte po ključnim prioritetima, odnosno specifičnim strateškim ciljevima. Svi inputi dobijeni su od strane institucija koji su nosioci projekata, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata i isti su integrisani u metodološki utvrđenu tabelarnu formu. Na osnovu dostavljenih podataka i uvida u realno ostvareno stanje, izvršena je adekvatna analiza učinaka.

III E-registar - Strateški plan razvoja opštine Bar 2020-2025

Pored pisanog izvještaja u elektronskoj formi ustanovljen je **e-registar Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025**. Elektronska verzija posjeduje strukturu Strateškog plana i na osnovu nje prikaz projekata i stepen realizacije za svaku godinu pojedinačno. E-registar Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025. ustanovljen je prema metodologiji za izradu izvještaja sa jasno opredjeljenim finansijskim iskazima kroz sve faze realizacije projekta kao i u konačnom na nivou godine i na nivou ukupne realizacije petogodišnjeg plana.

Struktura e-registra SPR 2020-2025, u potpunosti prati strukturu koja je prema metodologiji predviđena za izradu pisane verzije i u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16).

a) Statistički dio - glavni pregled

Kao novina u praćenju realizacije svi projekti koji su ustanovljeni strateškim planom razvoja (ukupno 99 projekata), iskazani su u e-registaru Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025, kroz finansijski dio za svaku godinu ukupne realizacije Strateškog plana. Ovo omogućava da se u momentu pregleda izvrši upoređivanje uspješnosti, kao i procentualne zastupljenosti svih učesnika (lokalna samouprava, vlada, ostali), u ukupnoj realizaciji Strateškog plana.

b) Statistički dio - pregled po godinama

Važno je napomenuti da sam e-registar Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025. u glavnom pregledu za sve godine posjeduje statistiku i procenat komparativne realizacije uspješnosti Strateškog plana kao i grafičke prikaze planiranih strateških ciljeva i realizovanih projekata. Takođe, statistika uspješnosti je upoređena po godinama sa svim godinama realizacije Strateškog plana po nosiocima projekata koji su u ovom slučaju: lokalna samouprava, Vlada, ostali.

c) Statistički dio - pregled po zastupljenosti i realizaciji, specifičnih strateških ciljeva u odnosu na planirane

Struktura e-registra Strateški plan razvoja opštine Bar 2020-2025. posjeduje istu konceptualnu strukturu od opšteg cilja, prema specifičnim strateškim ciljevima, prioritetima i projektima. U okviru specifičnih strateških ciljeva su svi prioriteti koji su predviđeni strateškim planom sa finansijskom i procentualnom uspješnošću za svaki prioritet, kao i grafički uporedni pokazatelj uspješnosti u odnosu na planirano i realizovano.

d) Evaluacioni registar

Aplikacija e-registar Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025. povezana je sa bazom podataka kroz evaluacioni registar, linkovima za svaki evaluacioni list i elementima, Projektni Plan Realizacije, Projekta i Finansijskog izvještaja koji su elementi svakog evaluacionog lista i u koji se unosi svaki podatak koji je predviđen Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16).

IV Stepen realizacije okončanih projekata

Prema dostavljenim podacima, realizovana finansijska ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog plana u 2022. godini iznose **4.351.340,17 €**.

Godišnjim akcionim planom delegirano je 38 projekata od kojih je 11 okončano, dok je 27 u fazi sprovođenja.

U izvještajnom periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, okončana su 3 projekta sa jednogodišnjim trajanjem:

- 9.2.1.6 PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR
- 9.2.2.1. PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE
- 9.2.2.2. PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

Projekti koji su okončani u 2022. Godini, a koji su imali duži period realizacije od godinu dana su:

- 9.1.2.1. DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)¹
- 9.2.1.1. PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA²
- 9.3.1.7. PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)
- 9.3.1.8. POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)
- 9.3.1.9. DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)
- 9.3.3.1. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE “VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC” U BARU
- 9.3.3.2. SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU
- 9.3.3.4. ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)

Projekti koji nijesu realizovani u 2022. godini i će se javlja Vlada kao nosilac projekta:

- 9.1.1.1. REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga
- 9.2.2.4. VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA
- 9.2.4.1. IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (izgradnja luke Virpazar)³
- 9.2.4.7. REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ĆAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)
- 9.2.4.9. REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)
- 9.3.2.1. IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
- 9.3.4.1. IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI
- 9.4.2.4. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“
- 9.4.2.5. PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“


¹ Projekat je trebao biti okončan u 2021 godini ali je na zahtjev nosioca projekta produžen na 2022 godinu

² Projekat je trebao biti okončan u 2021 godini ali je na zahtjev nosioca projekta produžen na 2022 godinu

³ Projekat je od planiranog do isplaniranog, doživio preobražaj i to u obimu koje je prvobitno bio vezan u cjelosti sa graničnim prelazima Virpazar i Ckla i Lukom Virpazar kao neophodnim dijelom. Projektom je definisana samo Luka Virpazar. Kao nosioci projekta su Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma. Kroz niz iteracija je pokušano da se Luka Virpazar definiše kako bi se zadovoljili uslovi koje propisuje "RAMSAR" lista za NP Skadarsko jezero. Od prvobitnog pristupa rješenju se odustalo, jer je bio neophodan monitoring uticaja na okolinu NP Skadarsko jezero, što sam EU projekat tajmingom nije zadovoljavao i moralo bi se odstatiti od investicija u iznosu od 2.440.000,00 €, EU sredstava, tako da je na drugi način pokušano rješavanje problema Luke Virpazar. S obzirom da MKP realizuje sa Agencijom za zaštitu životne sredine „zoniranje luke Virpazar“, kako bi se realizovao projekat a koji već ulazi u kritičnu fazu zbog timinga sredstava, naznaka je da će se realizovati dio LSL Virpazar i u skladu sa njime parking u okviru kolektora, kako nebi sredstva propala.

Važno je napomenuti da za sve projekte koji su financirani od strane Vlade, direktno ili preko njihovih institucija nije izdvojen nijedan euro u 2022. Godini. Iako je u 2022. godini dva puta donošen Zakon o budžetu u nijednom slučaju nije financiran, niti realizovan nijedan od projekata.

U okviru navedenog, nerealizovani projekti rastu na 45% u odnosu na realizovane ili djelimično realizovane koji su prikazani u procentu od 55% u odnosu na 2021. godinu. U uporednoj godini je taj odnos bio za nerealizovane 22,2% u odnosu na realizovane ili djelimično realizovane 77,8%

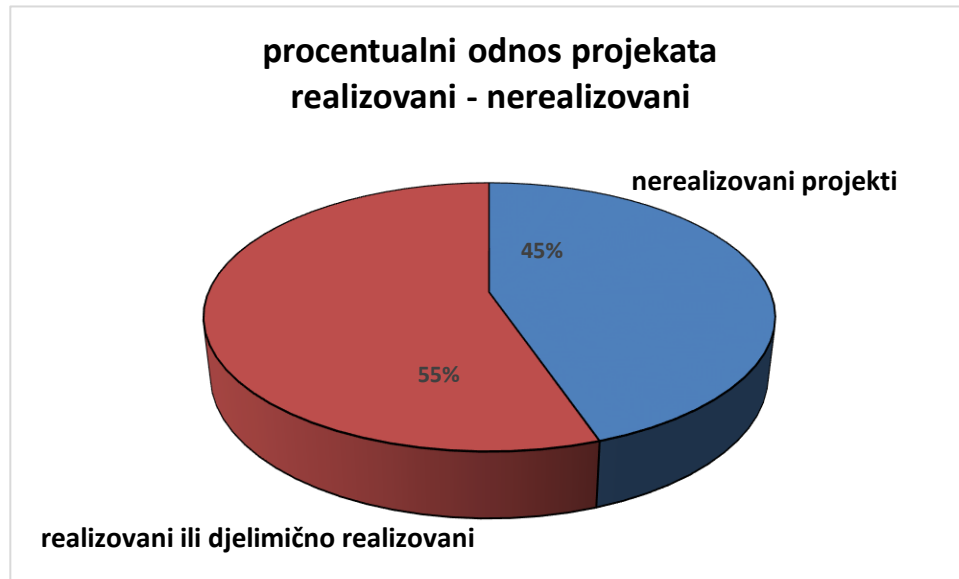

Ukupan finansijski pokazatelj za 2022. godinu na osnovu sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za 2022. godinu, iznosi **4.351.340,17 €**.

Ulaganja koja se odnose na projekte koji su realizovani u 2022. godini, uključujući kako projekte sa jednogodišnjim, tako i projekte sa realizacijom dužom od 12 mjeseci, iznose **370.913,50€**.

Ulaganja po osnovu ostalih projekata koji u kontinuitetu se realizuju na osnovu Godišnjeg akcionog plana iznose **3.980.426,67€**

V Projekti predviđeni godišnjim akcionim planom (GAP) za 2022. godinu

Radi preglednijeg uvida u status realizacije pojedinačnih projekata, prikazujemo ih u donjoj tabeli, gdje su zelenom bojom označeni realizovani projekti, a žutom projekti koji su u različitim fazama sprovođenja:

	Naziv projekta
1.	REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga
2.	IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51
3.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)
4.	LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)
5.	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
6.	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR
7.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE
8.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE
9.	VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA
10.	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA
11.	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI
12.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (izgradnja luke Virpazar)
13.	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
14.	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU
15.	REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE
16.	REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)
17.	IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU
18.	DRUGA FAZA VIDEO NADZORA
19.	NABAVKA SPECIJALIZOVANE OPREME I VOZILA ZA SLUŽBU ZAŠTITE
20.	RAZVOJ INFORMACIONO-TEHNOLOŠKOG OKRUŽENJA OPŠTINE BAR
21.	IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIČA U UŽEM GRADSKOM JEZGU
22.	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA
23.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)
24.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)
25.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)
26.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
27.	REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI
28.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU
29.	SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU
30.	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)
31.	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI
32.	IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA
33.	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA
34.	OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU
35.	UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
36.	IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
37.	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“
38.	PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“

VI Analiza strukture izvora finansiranja


Kao pokazatelj izvora finansiranja prikazani su kroz budžetski udio tri ključna subjekta:

- **lokalna samouprava - Opština Bar;**
- **država – Vlada Crne Gore i**
- **ostali** akteri koji su prepoznati kao nosioci projektnih aktivnosti.

Shodno tome, ukupna finansijska realizacija svih subjekata u Godišnjem akcionom planu u izvještajnom periodu za 2022.godinu, iznosi **4.351.340,17 €**,

U okviru ove ukupne sume učestvovala je:

- **lokalna samouprava - Opština Bar** u iznosu od **2.653.197,50 €**, odnosno **60,97%**,
- **Vlada Crne Gore** bez ulaganja **0%**, kao i
- **ostali** ili drugi subjekti u ukupnom iznosu od **1.698.142,67 €**, odnosno **39,03%**.

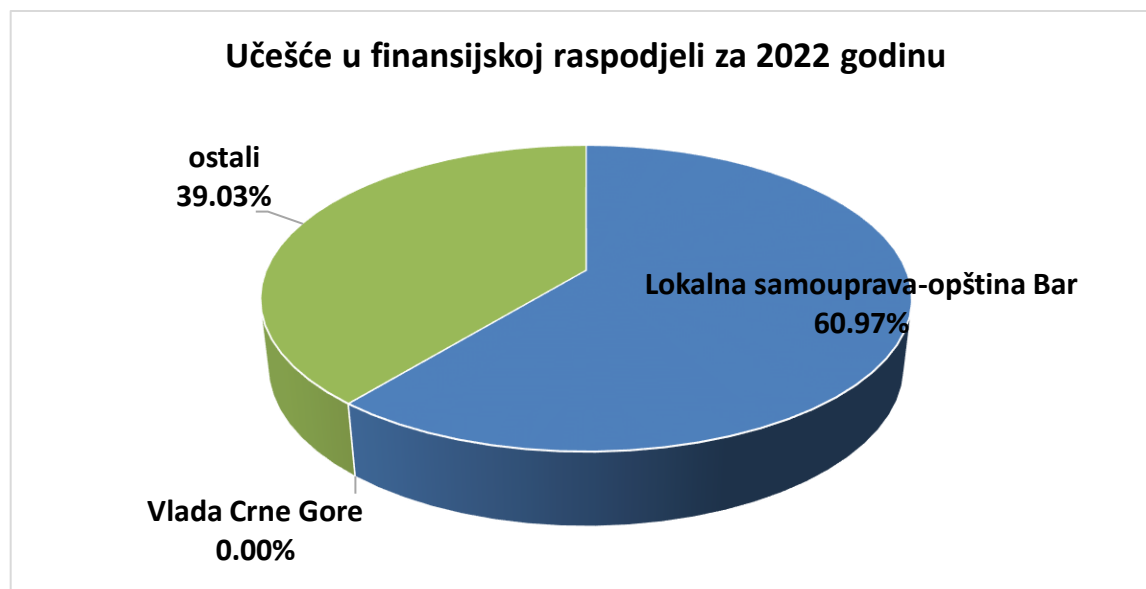


U distribuciji finansijskog učešća **ostalih** ili drugih subjekata u u ukupnom iznosu od **1.698.142,67€**, u okviru izvještajnog perioda participirali su sljedeći subjekti:


- EU sredstva predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 299.094,16 € (17,61%),
- Donacija Evropske komisije u iznosu od 230.000,00 € (13,54%)
- Luka Bar u iznosu od 1.059.848,51 € (62,41%)
- JU "Kulturni centar" sa iznosom od 5.200,00 € (0,31%),
- US Embassy in Montenegro – Podgorica sa iznosom od 104.000,00 € (6,12%)

Imajući u vidu da je u toku treća godina realizacije Strateškog plana razvoja opštine Bar u mogućnosti smo da uporedimo planirano učešće projekata kroz specifične strateške ciljeve i prioritete u odnosu na realizovano, zaključno sa 31.12.2022 godine.

Specifični strateški ciljevi i prioritete su planirani donošenjem Strateškog plana razvoja 2020 godine,



dok smo kroz realizaciju na kraju 2022. godine imali za rezultat :

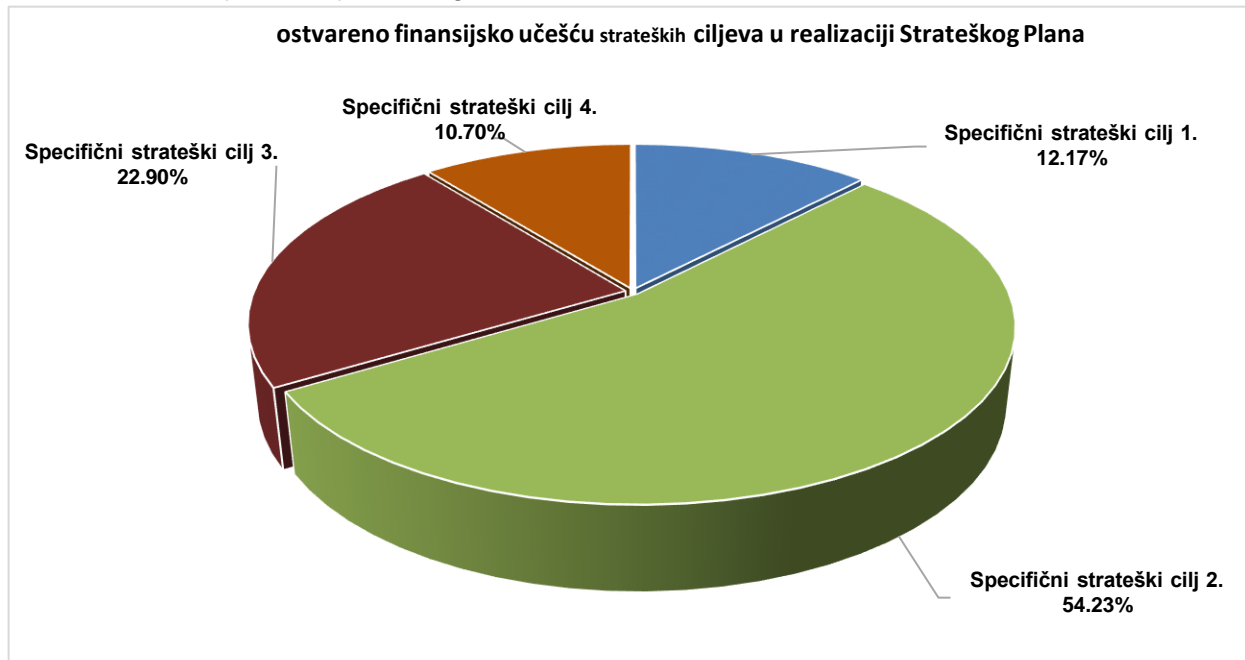

Prikazano pokazuje ekstenziju **Specifičnog strateškog cilja 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unaprjeđenje**

ostalnih privrednih grana od skoro 20 procenata u odnosu na planirano, dok su **Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar** i **Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar** umanjeni u odnosu na planirano. **Specifični strateški cilj 1. Unaprijeđenje turističke ponude opštine Bar** ostaje u granicama planiranog i realizovanog

Godišnji izvještaj sprovođenja projekta

Specifični strateški cilj 1: Unapređenje turističke ponude opštine Bar

Prioritet 1: Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma

Projektni plan: **REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021	2022	2023				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.1.1. <u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga</u>	-Unapređenje ambijenta i turističke ponude, -poboljšanje uslova za kupače, -ljepši izgled plaža, -razvoj turizma				-Vlada Crne Gore	- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom -Opština Bar	1.603.381€ (za izvođenje radova 1.543.381,6 7 € i 60.000 za poslove vršenja stručnog nadzora)	200.000,00	958.351,67 ⁴	445.030,00 ⁵	-izvještaj o prijemu radova

Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.1.1.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga</u>						
2022							JP Morsko dobro je obavijestilo Upravu za kapitalne projekte da je uslijed uvećanja cijena građevinskog materijala i radova došlo do uvećanja prvobitne projektanske procjene vrijednosti radova i ista se uvećava za 40% odnosno iznosi 1.534.381,67 eura

⁴ Kapitalni budžet

⁵ J.P.Morsko Dobro

Finansijska realizacija

	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno (€)	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.1.1.1.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga</u>				
2022					

Projektni plan: IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ

9.1.1.6.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ	- Unapređenje saobraćajne infrastrukture/pješač kog saobraćaja; - unapređenje turističke ponude				- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom	- Opština Bar	26.550,00				-Elaborat/i analiza lokacije -projektno tehnička dokumentacija -tenderski postupci

Realizacija Projekta

9.1.1.6.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ	1.izrada idejnog rješenja 2.izrada glavnog projekta	1. 2. ugovor broj.353/2 od 30.04.2015	2021-2023	- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom	1."Studio Sinthesis" Podgorica 2."Civil Engineer" doo Podgorica,	"Studio Sinthesis" iz Podgorice je uradio 2011 god Idejno rješenje za kompletnu zonu obuhvaćenu DSL-om Sektor 51, nije iskazana suma za Idejno rješenje jer je ista bila dio ukupnih ugovornih obaveza za četiri različita Idejna rješenja po DSL-ovima Sektor, 27, 28, 29, 51, I 54. Na osnovu ovako urađenog Idejnog rješenja za kompletnu zonu Sektora 51 (što je imperativno nametnuto tekstualnim dijelom Planskog dokumenta – Sektor 51) pristupilo se izradi Glanog projekta samo za šetalište – lungo mare.
2020		3.revizija glavnog projekta	-izmjena glavnog projekta ugovor br.1241/2 od 13.05.2020. 3.ugovor br.1542/2 od 24.06.2020		-JP Morsko dobro -JP Morsko dobro	3."Urbi.pro" doo Podgorica	
2021							
2022							

Finansijska realizacija

9.1.1.6.	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ</u>	26.550,00			
2020		26.550,00			20.850,00 ⁶ JP Morsko dobro 2.900,00 ⁷ JP Morsko dobro 2.800,00 ⁸ JP Morsko dobro
2021					
2022					

⁶ izrada glavnog projekta

⁷ Izmjena Glavnog projekta obalnog šetališta i uređenja javnih površina uz obalu u Čanju

⁸ Revizija Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju

Prioritet 2. Unapređenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

Projektni plan: DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)

9.1.2.1.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2020.	2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)	- povećana atraktivnost i konkurentnost turističke ponude kroz valorizaciju kulturnog naslijeđa i modernizovano upravljanje turističkim nasljeđem; - nova manifestacija - nabavljena i ugrađena oprema, - održana obuka za vodiče, - nove mobilne aplikacije			avgust 2022	Opština Bar	Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac	430.193,42	64.529,02 15% od ukupnog budžeta		(EFRR i IPA II, program Interreg Hr-BiH- CG) € 365 664.40 (€85% od ukupnog budžeta)	- Izvještaji projekta - Finalni izvještaj projekta - Godišnji izvještaj JP KC - Izvještaj o radu predsjednika - Izvještaj o broju turista (MONSTAT)

Realizacija Projekta

9.1.2.1.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
2020	DIGITALIZACIJA STAROG BARA - Projekat FORTITUDE Historic Fortresses Intensifying Cross- Border Tourism Development	2. Izrađeni konzervatorski projekti za zgradu Carinarnice i Ljetnju scenu u Starom gradu. Završeno opremanje oba objekta	2. tender br. 355-2, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke, odobrenje UZKD na konzervatorske projekte za oba objekta, ugovor sa nadzorom, fotografije namještaja i	2. 12.06.2020- 15.06.2021	Opština Bar	2. Izvođač radova: RestartIng; Nadzor: Dema Saglasnost: Uprava za zaštitu kulturnih dobara	Projekat se realizuje planiranom dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online). Projekat je produžen do avgusta 2022 godine sa dopunjenim finansijskim sredstvima

		<p>3. Tri zaposlena u JP Kulturni centar pohađala akreditovani kurs engleskog jezika - EDUCO centar</p> <p>4. Izrađena i postavljena taktilna reljefna maketa Starog grada u bronzi</p> <p>5. Održana tri redovna projektna sastanka- Kick off, Kick off Konferencija, SCM – Bar</p>	<p>tehničke opreme za Carinarnicu</p> <p>3. tender 355-3, ugovor, interim report</p> <p>4. tender 355-4, ugovor, račun, izvod iz banke</p> <p>5. agende, zapisnici, fotografije</p>	<p>3. 10.11.2020 – 16.06.2021</p> <p>4. 13.11.2020 – 20.06.2021</p> <p>5. 15.05.2020. 16.07.2020. 25.11.2020</p>		<p>3. Obuke je sproveo EDUCO centar</p> <p>4. Autor Zlatko Glamočak</p> <p>5. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac i Opština Bar</p>	
2021		<p>6. Izrađena aplikacija za proširenu stvarnost – AR</p> <p>7. Održan 4. partnerski sastanak i radionica "Heritage and Promotion"</p> <p>8. Započeta nabavka digitalnog interaktivnog kioska</p> <p>9. Započeta nabavka produkcijske opreme za ljetnju scenu</p> <p>10. Poslata ponuda za uslugu osmišljavanja turističke tematske staze</p> <p>11. Izrađena dva projektna izvještaja</p>	<p>6. tender 355-5, ugovor, račun, izvod iz banke</p> <p>7. agende, zapisnici, fotografije</p> <p>8. tender 355-6, ugovor</p> <p>9. tender 355-7, ugovor</p> <p>10. obavještenje o ugovoru za uslugu 355-8</p> <p>11. FLC sertifikati</p>	<p>6. 12.06.2020-15.06.2021</p> <p>8. 27.09.2021.-27.12.2021.</p> <p>9. 01.12.2021.-31.12.2021</p> <p>10. 06.12.2021.-31.05.2021.</p> <p>11. 31.05.2020. 30.11.2020.</p>		<p>6. Izvođač Weblab d.o.o.</p> <p>7. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac i Opština Bar</p> <p>8. Weblab d.o.o.</p> <p>9. Euro Unit d.o.o.</p> <p>10.</p> <p>11. Ministarstvo finansija CFCU</p>	

2022		<p>12. Izvršena nabavka i sprovedena usluga organizacije manifestacije Noć tvrđava</p> <p>13. Izvršena nabavka i sprovedena usluga medijske kampanje za manifestaciju Noć tvrđava</p> <p>14. Izvršena nabavka promotivnog materijala za održavanje manifestacije Noć tvrđava po single tender proceduri</p> <p>15. Izrađen konzervatorski projekat adaptacije objekata br. 180 i 185 u Starom gradu Baru</p> <p>16. Ugovorena usluga hostinga i održavanja sajta Noć tvrđava</p> <p>17. Izvršena nabavka opreme za live streaming po single tender proceduri</p> <p>18. Ugovorena nabavka – uređenje garderoba za izvođače u Starom gradu Baru</p> <p>19. Ugovorena nabavka – uvođenje akcentne rasvjete u Starom gradu Baru</p> <p>20. Ugovorena nabavka instalacije aplikacije u interaktivni digitalni kiosk</p> <p>21. Izvršena nabavka informativnih turističkih table za područje Starog grada Bara</p> <p>22. Ugovoren nadzor nad radovima uređenja garderoba za izvođače u Starom gradu Baru</p> <p>23. Ugovoren nadzor nad radovima uvođenja akcentne rasvjete u Starom gradu Baru</p>	<p>12. tender br. 355-9, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke</p> <p>13. tender br. 355-10, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke</p> <p>14. tender br. 355-11, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke</p> <p>15. obavještenje o ugovoru za uslugu 355-12</p> <p>16. ugovor 355-13</p> <p>17. tender br. 355-14, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke</p> <p>18. tender br. 355-15, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a</p> <p>19. tender br. 355-16, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a</p> <p>20. ugovor 355-17</p> <p>21. obavještenje o ugovoru za uslugu 355-18, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod</p> <p>22. ugovor 355-19</p>	<p>12. 16.03.2022. – 16.05.2022.</p> <p>13. 28.02.2022. – 28.04.2022.</p> <p>14. 23.02.2022. – 15.06.2022.</p> <p>15. 04.03.2022. – 04.05.2022.</p> <p>16. 25.02.2022. – 25.02.2027.</p> <p>17. 16.03.2022. – 15.05.2022.</p> <p>18. 05.04.2022. – 31.05.2022.</p> <p>19. 13.05.2022. - 24.06.2022.</p> <p>20. 11.03.2022. - 11.04.2022.</p> <p>21. 24.03.2022. – 15.05.2022.</p> <p>22. 19.04.2022. -</p>		<p>12. DMS development d.o.o.</p> <p>13. Montenegro Advertising and Production Agency d.o.o.</p> <p>14. DPC d.o.o.</p> <p>15. Projektor d.o.o. Tivat</p> <p>16. Weblab d.o.o.</p> <p>17. Margor d.o.o. Podgorica</p> <p>18. KOTO Podgorica DSD Beograd</p> <p>19. SIENERSYS D.O.O.</p> <p>20. PANDOPAD LLC</p> <p>21. Centar za održivi razvoj</p> <p>22. Projektor d.o.o. Tivat</p>	
------	--	---	---	--	--	--	--

		<p>24. Izvršena nabavka usluge – putovanje stakeholdera i predstavnika medija na završnu konferenciju projekta</p> <p>25. Održana Noć tvrđava</p> <p>26. Održana završna konferencija projekta i potpisano pismo namjere</p> <p>27. Izrađen jedan projektni izvještaj</p>	<p>23. ugovor 355-20/1</p> <p>24. ugovor 355-21</p> <p>25. slike, video, objave na društvenim mrežama</p> <p>26. slike, video, objave na društvenim mrežama, lista prisustva</p> <p>27. FLC sertifikat</p>	<p>23. 24.05.2022. – 24.06.2022.</p> <p>24. 07.05.2022. – 20.06.2022.</p> <p>25. 29/30.04.2022.</p> <p>26. 08/09.06.2022.</p> <p>27. 01.12.2021. – 31.05.2022.</p>		<p>23. Restart Ing Budva</p> <p>24. AVE Tours</p> <p>25. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, grad Karlovac i Opština Bar</p> <p>26. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, grad Karlovac, Opština Bar, EFFORTS i FORTE CULTURA</p> <p>27. Ministarstvo finansija CFCU</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--

Finansijska realizacija

9.1.2.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
2021	DIGITALIZACIJA STAROG BARA – projekat FORTITUDE <i>Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development</i>	98.106,56 ⁹	14.715,98		83.390,58-IPA sredstva
2022		317,370,88	47.605,63		269.765,25 – IPA sredstva

⁹ Navedeni iznos sredstava se odnosi na 2 sertifikovana izvještaja zaključno sa 30.11.2021.g.

Specifični strateški cilj 2. ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE BAR KROZ UNAPRJEĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA

Prioritet 1

Projektni Plan : PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

9.2.1.1	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	2023				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA	Izrađena strategija i akcioni planovi, obuke za vinogradare i vinare			februar 2023	-Opština Bar -BSC Bar	Osam partnerskih institucija iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije	165.740,00 za Opštinu Bar i BSC Bar	Po 15% od ukupne sume Opština Bar BSC Bar (25.072,00 eura)		140.879,00 - Program Interreg Adrion (85%)	-Izveštaj projekta -Izveštaj o radu predsjednika

Realizacija Projekta

9.2.1.1.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA ECOVINEGOALS ECOlogical VINEyards GOVERNANCE ACTIVITIES for Landscape's Strategies	1. Izvršena analiza vinogradarsko-vinarskog područja Crmnice kroz anketiranje 30 vinogradara i vinara Izvršen odabir zainteresovanih strana sa lokalnog i nacionalnog nivoa za učešće u projektu Objavljena dva rada u naučnim časopisima i prezentovana na konferencijama (sredstva provjere) 2. Usvojen Akcioni plan projekta Održana dva online projektna sastanka 3. Letak i bilten o projektu prevedeni na crnogorski jezik i distribuirani zainteresovanim	1. Dokument o kriterijumima za odabir ranjivog pilot područja projekta, strukturalna analiza (izveštaj), anketni listići, Excel baza podataka anketiranih 30 vinogradara-vinara, strukturalna analiza (izveštaj) o karakteristikama pilot područja i rezultatima anketiranja), izvještaj o identifikovanim zainteresovanim stranama; dokument o kriterijumima za prikupljanje podataka u GIS sistemu naučni radovi i poster 2. Akcioni plan, gantogram aktivnosti, tehnički grafikon agende, zapisnici, fotografije 3. letak, newsletter FB stranica, objave	1. april-decembar 2020 2. april 2020 22.04. i 14.11.2020 3. jul 2020	1. BSC Bar 2. Opština Bar, svi partneri 3. Opština Bar	1. BSC Bar i Opština Bar 2. Svi partneri 3. Svi partneri	Projekat se realizuje planiranom dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).

		<p>stranama, kreirana Facebook stranica projekta ECOVINEGOALS</p> <p>4. Izrađena dva projektna izvještaja</p>	<p>4. FLC sertifikati Ministarstva finansija</p>	<p>4. 30.06.2020 / 31.12.2020.</p>	<p>4. Opština Bar</p>	
2021		<p>5. Održan 3. Sastanak upravnog odbora i tehnički sastanak</p> <p>6. Održana radionica Budućnost vinogradarstva i vinarstva Crmnice</p> <p>7. Izrađena dva projektna izvještaja</p> <p>8. Dokumenta: DT1.2.1 Strukturna analiza selektovanog područja i mapiranje vinograda</p> <p>DT1.2.2. Izvještaj o sastancima u selektovanom području</p> <p>DT1.3.2 - Izvještaji o praćenju agroekoloških, produktivnih i ekonomskih performansi pilot vinogradarskih farmi</p> <p>D T2.1.1. Izvještaj o transnacionalnim kriterijima i metode za evaluaciju i unapređenje tradicionalnog pejzaža i staništa i za očuvanje usluge ekosistema u vinogradarstvu području</p> <p>DT2.1.2. Izvještaj o koordinaciji tehničkih Sastanaka između PP</p> <p>DT2.1.3. Izvještaj o uključivanju lokalnih stejkholdera</p> <p>D T2.2.1. Dokument sa prikupljenim podacima</p> <p>D T2.2.2.</p>	<p>5. agenda, liste prisustva, fotografije</p> <p>6. agenda, liste prisustva, fotografije</p> <p>7. FLC sertifikati Ministarstva finansija</p> <p>8. Izvještaji</p>	<p>5. 12.10.2021. 13.10.2021. 14.10.2021.</p> <p>6. 29.11.2021. 30.11.2021. 01.12.2021.</p> <p>7. 30.06.2021. 31.12.2021.</p>	<p>5. svi partneri</p> <p>6. BSC Bar</p> <p>7. Opština Bar</p> <p>8. BSC Bar</p> <p>ZRC SAZU</p> <p>ZRC SAZU</p> <p>ZRC SAZU</p>	<p>5. Opština Bar, svi partneri</p> <p>6. Opština Bar, BSC Bar, zainteresovani stakeholder</p> <p>9. Opština Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>Opština Bar,</p>

		<p>Izveštaj o rezultatima analize pejzaža i staništa</p> <p>D T 3.1.1 Zajednički metodološki okvir za participativno upravljanje</p> <p>D T 3.1.2 Raspored prijave participativne metodologija backcastinga u pilot oblastima</p> <p>D T 3.1.3 Spisak strana koje će biti uključene u participativne procese backcastinga</p>			<p>BSC Bar</p> <p>BSC Bar</p> <p>AZRRI Ltd Pazin</p> <p>AZRRI Ltd Pazin</p> <p>Opština Bar</p>	<p>Opština Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>Opština Bar, BSC Bar</p> <p>BSC Bar</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--

9.2.1.1.	<p>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</p> <p>ECOVINEGOALS</p> <p>ECOlogical VINEyards GOVERNance Activities for Landscape's Strategies</p>	<p>1. Obavljena višefaktorska analiza odabranih vinara-vinogradara</p> <p>2. Dostavljeni GIS podaci za Crnu Goru sa svim vinogradima u pilot području</p>	<p>1. 10 upitnika za vinare-vinogradare.</p> <p>Upitnici su ispunjeni od strane eksternog eksperta. Intervjuisani su sljedeći vinari-vinogradari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klisić Family -Cermeniza -Garnet -Kalimut -Zavjet -Sjekloća -Kopitović -Mašanović -Đukanović -Buk <p>Osim ispunjenih anketnih listića, u prilogu je Excel baza sa obrađenim anketnim formularima za svaku vinariju, sa pripadajućim fotografijama</p> <p>U cilju izrade dokumenta BSC Bar (eksterni ekspert) je prikupio osam slojeva</p>	<p>01.januar-30.jun 2021.</p>	<p>1.BSC Bar</p> <p>2.BSC Bar</p>		<p>Projekat se realizuje planiranom dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).</p>
----------	--	---	---	-------------------------------	-----------------------------------	--	--

			<p><i>digitalnih podataka relevantnih za pilot područje (Crmnica). Ovaj izvještaj sadrži podatke potrebne za analizu krajolika i staništa pilot vinskog područja i predstavlja sažetak digitalnih podataka (GIS slojeva) koji su prikupljeni. BSC Bar uz tehničku i institucionalnu podršku uspio je da dobije sljedeće slojeve: Korišćenje zemljišta (dobijeno od Geološkog zavoda CG); Zaštićena područja; Tipovi staništa (pribavljeni od strane Agencije za zaštitu životne sredine CG), litološki podaci i podaci o zemljištu (pribavljeni od Geološkog zavoda CG), specifični elementi pejzaža (pribavljeni od Uprave za zaštitu kulturnih dobara), putna i željeznička mreža (preuzeta iz Uprava za nekretnine) kao i dodatni sloj svih vinograda u pilot području (dobijeno od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovaj dokument će poslužiti za izradu izvještaja o rezultatima analize pejzaža i staništa</i></p>			
		<p><i>3. Pripremljen Zajednički metodološki okvir za participativno upravljanje</i></p> <p><i>4. Izvještaj o očešću lokalnih stakeholdera</i></p> <p><i>5. Strukturna analiza odabranih površina i mapiranje vinograda.</i></p>		<p><i>01. jul-31. decembar 2021</i></p>	<p><i>3. BSC Bar</i></p> <p><i>4. BSC Bar</i></p> <p><i>5. BSC Bar</i></p>	

		<p>Izveštaj o lokalnim sastancima sa operaterima u odabranm vinogradarskim područjima</p> <p>6. održana 5 online treninga u sklopu aktivnosti „Obuka fasilitatora za participativne backcasting procese u okviru projekta ECOVINEGOALS”</p> <p>7. Drugi sastanak Upravnog odbora organizovao je i vodio LP Vegal 22. aprila 2021. godine. Zbog COVID-19, sastanak je održan online putem Zoom-a</p> <p>8. Treći sastanak Upravnog odbora i tehnički sastanak u prostorijama: "Mediterranski agronomski institut u Haniji" Od 11. do 15. oktobra 2021</p> <p>9. Kreiran novi dizajn postera</p>	<p>Sprovedena metodologija retrognozirajućeg scenarija (razvijanje idealne ili nepoželjne slike budućeg stanja i vraćanje unazad kako bi se identifikovali koraci koje treba preduzeti ili izbjeći)</p> <p>U sklopu Projekta u prostorijama BSC Bar održana radionica „ Budućnost vinogradarstva i vinarstva Crmnice". Učestvovali vinari i vinogradari i predstavnici stakeholdera</p>		<p>6.BSC Bar</p> <p>7. BSC Bar</p> <p>8.BSC Bar, svi partneri</p> <p>9.BSC Bar, svi partneri</p>		
2022							Produžen rok za realizaciju projekta

Finansijska realizacija

9.2.1.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u> ECOVINEGOALS ECOLOGICAL VINEYARDS GOVERNANCE ACTIVITIES FOR LANDSCAPE'S STRATEGIES	13.192,98 ¹⁰	1.978,95		11.214,03 – IPA
2021 Opština Bar	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u> ECOVINEGOALS ECOLOGICAL VINEYARDS GOVERNANCE ACTIVITIES FOR LANDSCAPE'S STRATEGIES	14.887,86 ¹¹	2.233,18		12.654,68 – IPA
2021 BSC	<u>PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA</u> ECOVINEGOALS ECOLOGICAL VINEYARDS GOVERNANCE ACTIVITIES FOR LANDSCAPE'S STRATEGIES	13.338,93 ¹² 21.050,00 ¹³	2.000,84 3.157,50		11.338,09 period 01.01.-30.06.2021. IPA 17.892,50 period 01.07.-31.12.2021. IPA
2022 Opština Bar					
2022 BSC					
		49.276,79			

¹⁰ 01.03.2020. - 31.12.2020.

¹¹ 01.01.2021. - 31.12.2021.

¹² Potvrđeno od strane First level control

¹³ nije potvrđeno od strane First level control, aktivnosti u toku do 31.12.2021. Najvjerojatnije ovoliko neće biti potrošeno usljed nemogućnosti putovanja i sastanaka

Projektni Plan : LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)

9.2.1.4.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	<u>LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)</u>	-Pomoć proizvođačima i unaprjeđenje kvaliteta vina iz crmničkog subregiona			- Opština Bar		Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom	24.000,00			-uređenje prostora za potrebe laboratorije

Realizacija Projekta

9.2.1.4.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)</u>			2022	-Opština Bar		

Finansijska realizacija

9.2.1.4.	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)</u>				

Projektni Plan: PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR

9.2.1.6.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	-usmjeravanje proizvođača ka tržišnim uslovima i standardima; -povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi -povećanje iskorišćenosti poljoprivrednih resursa			-Opština Bar		100.000,00	100.000,00			-Javni poziv -Broj podržanih poljoprivrednika -Izveštaj o realizaciji

Realizacija projekta

9.2.1.6.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	1. Odobreno 132 ubvencije lokalnim poljoprivrednim proizvođačima 2. Rješenja o odobravanju sredstava upućena Sekretarijatu za finansije na isplatu 3. Odobrena su 2 projekta za mlade poljoprivrednike - podsticaj agrobiznisa	1. Rješenje o odobravanju podnijetih zahtjeva i ugovori sa dobitnicima granta – podsticaji mladim poljoprivrednicima 2. Dokazi o izvršenim uplatama 3. Izveštaj o radu Sekretarijata za privredu u sklopu Izveštaja o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave	2022	Opština Bar	Sekretarijat za privredu	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 88.372,443 eura izvršena je na osnovu objavljenih Javnih poziva, u skladu sa Odlukom o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede ("Sl.list CG – opštinski propisi" br. 046/16 i 018/19) Dodjela sredstava za podršku biznisima za mlade poljoprivrednike je izvršena na osnovu potpisanih Ugovora što je u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024 – mladi u agrobiznisu ("Sl.list CG – opštinski propisi" broj 019/19) u iznosu od 16.000,00 eura

Finansijska realizacija

9.2.1.6	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR</u>	104.372,42	104.372,42		

Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

Projektni Plan: PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

9.2.2.1.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Opočinjanje ili unapređenje preduzetništva -Povećanje biznis operativnosti			-Opština Bar	-Opština Bar -podnosioci biznis planova	190.000,00	190.000,00			-Javni poziv za podnošenje biznis planova -Izveštaj komisije o izboru biznis planova

Realizacija Projekta

	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.1.	<u>PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE</u>	1. Odobrena sredstva za ukupno 45 biznis ideje 2. Zaključeni ugovori se korisnicima sredstava 3. Uplata sredstava će se izvršiti u četiri jednake rate počev od mjeseca juna zaključno sa septembrom 4. Monitoring realizacije podržanih biznis planova	1. Odluka o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2022. godinu (br. 01-018/22-1420 od 04.05.2022. godine) 2. Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava 3. Potvrde o uplati 4. Finansijski i narativni izvještaji korisnika opštinskih sredstava Izvještaji Komisije	2022 - 2023	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava Biznis start-up Centar, Bar Podnosioci biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 183.000,00 eura izvršena je na osnovu objavljenog Javnog poziva, u skladu sa Programom podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar za period 2019-2022. godine ("Sl.list CG- opštinski propisi", br.44/19). Monitoring sprovođenja podržanih ideja i namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava vrši se u kontinuitetu.

Financijska realizacija

	Projektat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.1.	<u>PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE</u>	183.000,00	183.000,00		

Projektan Plan: PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

9.2.2.2.	Projektat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Otpočinjanje ili unapređenje ženskog preduzetništva -Povećanje biznis operativnosti kroz žensko preduzetništvo			-Opština Bar	-Opština Bar -podnosioci biznis planova	-33.000,00 ¹⁴ -33.000,00 ¹⁵	-50.000,00 ¹⁶ -16.000,00 ¹⁷			-Javni poziv za podnošenje biznis planova iz oblasti ženskog preduzetništva -Izveštaj komisije o izboru biznis planova

Realizacija Projekta

9.2.2.2.	Projektat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE</u>	1. Odobrena sredstva za ukupno 11 biznis ideja 2. Zaključeni ugovori se korisnicama sredstava	1. Odluke o odobravanju sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu (br. 01-018/22-1285 od 18.04.2022. godine i 01-018/22-3469 od 11.11.2022. godine)	2022- 2023	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava Podnositeljke biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 66.000,00 eura izvršena je na osnovu raspisanih Javnih konkursa, u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl.list CG- opštinski propisi", br.44/19). Monitoring sprovođenja podržanih ideja i namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava vrši se u kontinuitetu.

¹⁴ troškovi po prvom pozivu

¹⁵ troškovi po drugom pozivu

¹⁶ planirana osnovna budžetska sredstva predviđena za 2022 godinu

¹⁷ Preusmjerena neutrošena sredstva za preduzetništvo. Cjelokupan iznos je 66.000 € ove godine

		3. Izvršena uplata sredstava 4. Monitoring realizacije podržanih biznis planova	2. Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava 3. Potvrde o uplati 4. Finansijski i narativni izvještaji korisnika opštinskih sredstava Izvještaji Komisije				
--	--	--	--	--	--	--	--

Finansijska realizacija

9.2.2.2.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE</u>	66.000,00	33.000,00 33.000,00		

Projektni Plan: VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA (DUP TOPOLICA III)

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.2.4.	VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA	Multifunkcionalni tržni centar sa svim sadržajima neophodnim za gradsko područje			-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta

Realizacija Projekta

	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.4.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA</u>	<ul style="list-style-type: none"> - U toku je izmjena detaljnog urbanističkog plana "Topolica III" - Urađen geodetski elaborat - Izvršeno je formiranje urbanističke parcele u skladu sa planom parcelacije - Izvršena je procjena vrijednosti nepokretnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj 04-460/19-1182 od 16.05.2019.g. i broj 04-460/19-11293 od 31.05.2019.g - Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokr., br. 04-427/21-1255 od 08.07.2021.g 	<ul style="list-style-type: none"> - 2019.g - Jul/21- Avg/21 	Opština Bar	<ul style="list-style-type: none"> - DOO "Ekvidistanca" BR 	<ul style="list-style-type: none"> - Troškovi geodetskih radova iznosili su 1.089,00€ i 363,00€ sa PDV-om - Troškovi procjene vrijednosti nepokretnosti iznosili su 700,00€.
2022							-U toku je izmjena detaljnog urbanističkog plana "Topolica III"

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.4.	<u>VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA</u>	2.152,00	2.152,00		
2022					

Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala slobodne zone "Luka Bar"

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere							
		2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)								
9.2.3.2	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA	Uspostavljene osnove za razvoj djelatnosti u Slobodnoj zoni (pretovar i skladištenje tereta)										- Luka Bar AD	- „Aqua mont service” doo Beograd, (vodeći član) -„Aqua mont” doo-Herceg Novi, (član) -„Aqua mont service” doo- Split, (član) -„Monteput” doo- Podgorica (stručni nadzor)	4.989.013,80			Investitor: „Luka Bar” AD	Izveštaj o napretku projekta

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta	
9.2.3.2	<u>REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA</u>	1. Kompletirana projektna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 2. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i sa istim zaključen Ugovor	1. Uvid u projektnu dokumentaciju 2. Odluka br. OD/207-8 od 25.08.2020.g. i Ugovor br. 4538 od 25.08.2020.g..	1. 2018.-2020. 2. avgust 2020.g	“Luka Bar” AD	1. Saobraćajni institut CIP d.o.o. “Građevinski institut Makedonija” AD – Skoplje, 2019.g.; revident: “VU-TI Inženjering”- Bar 2. Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - “Aqua mont service” doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont” doo – Herceg Novi,	Početak izvođenja radova je bio planiran za početak novembra 2020.g., ali je planirana dinamika izmijenjena zbog ponavljanja postupka izbora vršioca stručnog nadzora, iz razloga formalno-pravne prirode.

		<p>3. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i sa istim zaključen Ugovor o javnoj nabavci</p> <p>4. Podnesena Prijava građenja Urbanističko-građevinskoj inspekciji</p>	<p>3. Odluka br. 6738 od 27.11.2020.g i Ugovor br. 7338/1 od 23.12.2020.g</p> <p>4. Prijava građenja</p>	<p>3. novembar/decembar 2020.g.</p> <p>4. decembar 2020.g.</p>		<p>član; „Aqua mont service” doo – Split, član:</p> <p>3., Stručni nadzor: „Monteput” doo- Podgorica</p>	
2021.		<p>1. Započeli su radovi na rekonstrukciji konstrukcije operativne obale Volujica (15.03.2021.g.); prva faza: sanacija lamele 6;</p> <p>2. Izvršena je korekcija dinamičkog plana realizacije projekta – korigovane su dužine planiranih perioda realizacije radova po lamelama, bez izmjene ukupnog perioda realizacije projekta – 36 mjeseci (produžen je period realizacije radova na lamelama 6 i 5, planirani period rekonstrukcije lamele 4 je ostao isti, a skraćeni su periodi realizacije radova na lamelama 1, 2, 3 i 7).</p>	<p>1. Zapisnik o uvođenju izvođača radova u posao (od 10.03.2021.g.)</p> <p>2. 2.1 Odluka Odbora direktora br. OD/219-7 od 26.08.2021.g. 2.2 Aneks 3 Ugovora o izvođenju radova br. 4538 od 25.08.2020.g. (arhivski broj Aneksa 3 je 5093 od 27.08.2021.g.)</p>	<p>1. mart 2021.</p> <p>2. avgust 2021.</p>	„Luka Bar” AD	<p>Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - „Aqua mont service” doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont” doo – Herceg Novi, član; „Aqua mont service” doo – Split, član:</p> <p>Stručni nadzor: „Monteput” doo- Podgorica</p>	
2022.		<p>1. Završetak radova u okviru prve faze – sanacija lamele 6; primopredaja realizovanih sanacionih radova;</p> <p>2. Realizacija druge faze sanacije: sanacija lamele 5;</p>	<p>1. Izvještaj Stručnog nadzora; Primopredajni zapisnik;</p> <p>2. Izvještaj Stručnog nadzora;</p>	<p>1. april 2022.</p> <p>2. maj 2022.</p>	„Luka Bar” AD	<p>Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - „Aqua mont service” doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont” doo – Herceg Novi, član; „Aqua mont service” doo – Split, član:</p> <p>Stručni nadzor: „Monteput” doo- Podgorica</p>	

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.3.2	<u>REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA</u>	997.802,76 ¹⁸	-	-	997.802,76 – "Luka Bar" AD
2021.g.		-	-	-	-
2022.g.		1.059.848,51	-	-	1.059.848,51 – "Luka Bar" AD

Projektni Plan: IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere	
		2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)		
9.2.3.3	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI	Povećani kapaciteti u Slobodnoj zoni za pretovar i skladištenje cementa u rasutom stanju				„TCK Montenegro“ DOO	„Luka Bar“ AD	2.000.000			Investitor („TCK Montenegro“ DOO): 2.000.000 €	Izveštaj o napretku projekta

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.3.3	<p>1. Sklopljen Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni između "Luka Bar" AD i "TCK Montenegro" doo;</p> <p>2. Obezbijeđeni urbanističko tehnički uslovi</p>	<p>1. Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni br.2844 od 07.06.2019.g.</p> <p>2. Urbanističko -tehnički uslovi br.1063-324/2, izdati od strane</p>	<p>1. decembar 2018.g. – jun 2019.g.</p> <p>2. jun – avgust 2019.g.</p>	"TCK Montenegro" DOO	"Luka Bar" AD	"Luka Bar" AD je, shodno Ugovoru o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni dala u dugoročni zakup dio k.p.6501/1, KO Novi Bar, površine 392 m ² radi izgradnje Terminala za skladištenje i rukovanje rasutim cementom i ostalim cementnim proizvodima (uključujući i građenje

¹⁸ Avansna uplata po osnovu Ugovora o izvođenju radova, ukupne vrijednosti 4.989.013,80€ (sa PDV-om).

			<p>Ministarstva održivog razvoja i turizma Potvrda Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom br. 0207-3035/4 od 22.08.2019.g.;</p> <p>3. Pisana komunikacija između "Luka Bar" AD i "TCK Montenegro" doo;</p>	<p>3. jun 2019.g. – 31.12.2020.g</p>			<p>silosa za rasuti cement i ostale cementne proizvode).</p> <p>Dinamika realizacije projekta je značajno usporena zbog COVID 19 krize.</p>
2021.		-	-	-	"TCK Montenegro" DOO	"Luka Bar" AD	<p>Zbog COVID krize, nije bilo konkretnih aktivnosti na realizaciji projekta.</p> <p>Korisnik Slobodne zone, firma "TCK Montenegro" doo kontinuirano plaća obaveze prema "Luka Bar" AD koje se odnose na zakup lokacije (i podrmiruje određene ostale obaveze definisane Ugovorom o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni);</p> <p>Na sastanku predstavnika "TCK Montenegro" doo i "Luka Bar" AD, koji je održan 5. novembra 2021.g., je razmotrena aktuelna situacija i zaključeno da će se projektne aktivnosti intenzivirati tokom 2022.g.</p>
2022.		-	-	-	"TCK Montenegro" DOO	"Luka Bar" AD	<p>Na sastanku predstavnika "TCK Montenegro" doo i "Luka Bar" AD, koji je održan 1. februara 2022.g., je sagledana trenutna faza aktivnosti na realizaciji projekta i zaključeno je da će se projektne aktivnosti intenzivirati tokom 2022.g.;</p> <p>"Luka Bar" AD treba da dobije dinamički plan aktivnosti na realizaciji projekta od firme "TCK Montenegro" doo (Korisnika Slobodne zone Luka Bar);</p>

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.3.3	<u>IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI¹⁹</u>				
2021.		-	-	-	-
2022.	--- ²⁰	-	-	-	-

¹⁹ Još uvijek nema utroška, jer je projekat u fazi izrade tehničke dokumentacije i sprovođenja inicijalnih geomehaničkih istraživanja.

²⁰ „Luka Bar“ AD treba da dobije projekciju troškova za 2022.g. od Investitora, firme „TCK Montenegro“ doo; u momentu izrade ovog izvještaja, odnosni podaci nisu raspoloživi;

Prioritet 4. Razvoj saobraćajne infrastrukture

Projektni Plan: IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (izgradnja luke Virpazar)

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.1.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (Izgradnja Luke Virpazar I faza)	- poboljšanje saobraćajne infrastrukture				- Vlada Crne Gore	- Opština Bar	2.806.000,00		366.000,00	2.440.000,00	-izrada idejnog rješenja -projektno – tehnička dokumentacija -revizija projektno tehničke dokumentacije - izvještaj o prijemu radova

Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.1.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (Izgradnja Luke Virpazar I faza)	1. Idejno rješenje Luke Virpazar 2. Tenderska dokumentacija za izradu Luke Virpazar I faza	2.29.11.2021 br.02-011/21-1291/1	2021	2. Ministarstvo Kapitalnih Investicija		
2022		3. Izrada projektno tehničke dokumentacije	3. Ugovor za izradu projektno tehničke dokumentacije Luke Virpazar I faza				18.03.2022. GODINE poništen tender za realizaciju Faze I za izgradnju luke Virpazar zbog nepostojanja definisanih zona Nacionalnog parka i zbog neizvršene analize uticaja na životnu sredinu.

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.1.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM (Izgradnja Luke Virpazar I faza)				
2022.					

Projektni Plan: IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.2.	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM	- poboljšanje saobraćajne infrastrukture			- Uprava javnih radova	- Opština Bar	723.324,52	18.697,82	704.626,71		- projektno – tehnička dokumentacija - izvještaj o prijemu radova

Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.2.	<u>IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM</u>	<p>1. Izrađena revidovana projektno tehnička dokumentacija</p> <p>2. Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Odabran najpovoljniji izvođač radova i zaključen Ugovor sa njim.</p> <p>3. Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača za vršenje stručnog nadzora. Odabran stručni nadzor i potpisan ugovor sa njim.</p>	<p>1. Uvid u glavni projekat Obavještenja o ishodu odgovarajućih postupaka javnih nabavki</p> <p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-1410 od 28.02.2020.g. Ugovor br. 01-334/20-2228/1 od 01.04.2020. g.</p> <p>3. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova br. 01-426/20-2308 od 06.04.2020. Ugovor br. 01-334/20-2896 od 04.05.2020. g.</p>	2019-2021	<p>1. Opština Bar</p> <p>2. Uprava javnih radova</p> <p>3. Uprava javnih radova</p>	<p>1. doo "Put inženjering" Podgorica doo "Kov Atelje" Nikšić.</p> <p>2. "Putevi Bar" d.o.o, Bar</p> <p>3. "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D., Podgorica</p>	<p>1. Shodno zaključenom Sporazumu Vlade Crne Gore I Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla-Zogaj, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat je urađen od strane doo "Put inženjering" Podgorica, a revidovan od strane doo "Kov Atelje" Nikšić. Takođe, Opština Bar je ispunila obavezu izrade geodetskih podloga i plana parcelacije. Ukupni troškovi Opštine po ovom osnovu iznosili su 18.697,80 €, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 690.226,70€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Ukupna vrijednost ugovorene usluge stručnog nadzora iznosi 14.400,00€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole za izgradnju ove saobraćajnice, nakon čega se može očekivati početak izvođenja pripremnih radova i realizacija ostalih ugovorenih poslova. Kapitalnim budžetom za 2022. god. Vlada Crne Gore opredjelila je 433.100,00€ za izgradnju lokalnog puta I graničnog prelaza Ckla I graničnog prelaza Božaje, Tuzi.</p>

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.2.	<u>IZGRADNJA SAOBRAČAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM</u>	18.697,82	18.697,82 ²¹		
2022					

Projektni Plan: STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.					Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.3.	STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU	-poboljšanje saobraćajne infrastrukture, rasterećenje magistralnog puta, ubrzan i optimizovan putnički transport				-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-izrada/izrađeno idejno rješenje -izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izveštaji o implementaciji projekta

²¹Shodno zaključenom sporazumu, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat u vrijednosti od 14.850€ je urađen od strane doo "Put inženjering" Podgorica, dok je revizija projekta urađena od strane doo "Kov Atelje" Nikšić iznosila 968€ sa PDV-om. Izrada geodetskih podloga i plana parcelacije iznosila je 2.879,80€.

Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.3.	<u>STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU</u>						-Realizovana je Analiza imovinsko pravnih odnosa od strane Sekretarijata za imovinu zastupanje i investicije
2022							Pokrenuta izrada izmjena i dopuna DUP-a Sutomore centar

Finansijska realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.3.	<u>STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU</u>				

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1)-KAMENIČKI MOST-KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)

9.2.4.7.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)	-Poboljšanje saobraćajne infrastrukture			-Uprava za saobraćaj	-Opština Bar	9.000.000	666.588 ²²	1.340.280,93 ²³ 1.050.000,00 ²⁴		-postupak eksproprijacije zemljišta -izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta

²²21.12.2021 godine iznos uplaćen po osnovu eksproprijacije zemljišta za potrebe saobraćajnice

²³Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 godinu / Aktivnost 17 020 K01 022 / Rekonstrukcija regionalnog puta – Kamenički most – Krute

²⁴Prijedlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2023 godinu / Aktivnost 17 020 K01 022 / Rekonstrukcija regionalnog puta - Kamenički most - Krute

Realizacija Projekta

9.2.4.7.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
2020 - 2021	REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)	<ol style="list-style-type: none"> Zaključen Sporazum o sufin. rekonstrukcije reg. puta R-29 Bar-Kamenički most Shodno Sporazumu, od strane Uprave za saobraćaj dostavljeni su Elaborati parcelacije, a Opština Bar je iste ovjerila i sprovela kod Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Bar. Postupak procjene zemljišta (bez odgovarajućih građevinskih i poljoprivrednih pripadnosti) kod Uprave za katastar i državnu imovinu je završen. Opština Bar je u 2021. god. na ime depozita za eksproprijaciju nepokretnosti uplatila iznos od 666.588,00€ na poseban račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja. U toku je obilježavanje trase saobraćajnice 	<ol style="list-style-type: none"> Sporazum o sufin. rekonstrukcije region. puta R-29 Bar-Kamenički most, br. 01-018/20-2089 od 05.08.2020.g. Elaborati parcelacije Izveštaj o procjeni vrijednosti nepokretnosti, br. 04-427/21-244 od 21.12.2021.g. Geodetski elaborati 	<ol style="list-style-type: none"> Avg/20 Jan/21 – Jan/22 Feb/21 – Dec/21 Feb/22 - 	Uprava za saobraćaj Opština Bar	<ol style="list-style-type: none"> DOO "Geomax" PG Komisija za procjenu nepokretnosti Uprave za katastar i državnu imovinu DOO "Cading" BR 	<p>Budžetom Opštine Bar za 2022. godinu planirana su sredstva za otkup poljoprivrednih i građevinskih pripadnosti nakon sprovođenja odgovarajućeg postupka procjene vrijednosti.</p> <p>Centralna i južna komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti Uprave za katastar I državnu imovinu izvršila je procjenu vrijednosti poljoprivrednih pripadnosti – zasada za dio katastarskih parcela u KO Dobra Voda i KO Pečurice.</p> <p>Predlogom budžeta Crne Gore za 2023. godinu planiran je iznos od 1.050.000,00€ za rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most-Krute (Aktivnost 17 020 K01 022).</p>
2022							

Finansijska realizacija

9.2.4.7.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)		666.588,00		
2022					

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.		2022.					Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.4.9. REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)	-Poboljšanje saobraćajne infrastrukture					-Uprava za saobraćaj	-Opština Bar	225.398,80	250.000	32.321,95 ²⁵		-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikator i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.9. REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)	1. Sproveden postupak j. nabavke i izabran najpovoljniji ponuđač za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta. Postupak izrade projektno-tehn. dokumentacije je u toku.	1.Ugovor za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta 01-018/22-812 21.03.2022.	1. Dec/21 – Mart/22		1. DOO "CIVIL inženjering" PG	Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja i glavnog projekta iznosi 225.398,80€ .
2022						

²⁵Zakon o budžetu 2022/ Aktivnost 17 020 K04 082 / Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar

Finansijska realizacija

	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.9.	REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)				
2022					

Projektni Plan: IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU

9.2.4.12.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU	-Povećanje bezbjednosti pješaka posebno u ljetnjim mjesecima kada je veoma izražena frekventnost u saobraćaju -Povećanje protoka saobraćajnih vozila			- Opština Bar	- Opština Bar -pješaci i vozači	Procij.vrijednost 1.171.479,00€		470.428,97 ²⁶ 4.159.159,00 ²⁷ 1.100.001,00 ²⁸		-idejno rješenje -tender za izradu projektno- tehničke dokumentacije -tender za izbor najboljeg ponuđača

Realizacija Projekta

9.2.4.12.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD	1. Sproveden postupak javnih nabavki za izradu glavnog projekta	1. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/20-1545/2 od 06.07.2020.g.	Jul /20 – Nov/21	Opština Bar	1. DOO "Via Project" Pg	Vrijednost izrade glavnog projekta iznosila je 10.000,00€ sa PDV-om.

²⁶Zakon o budžetu 2022 / Aktivnost 17 020 K04 041 / Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

²⁷Shodno Planu javnih nabavki Uprave javnih radova za 2022. godinu.

²⁸Prijedlog budžeta CG za 2023 / Aktivnost 17 020 K04 041 / Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar

	<u>MAGISTRALNE U ŠUŠANJU</u>	<p>2. Sproveden postupak javnih nabavki za vršenje revizije glavnog projekta.</p> <p>3. Urađen glavni projekat sa revizijom.</p> <p>4. Uprava javnih radova poništila je postupak javne nabavke zbog nedostataka u revidovanom glavnom projektu</p> <p>5. Uprava za kapitalne investicije pokrenula je novi postupak javne nabavke i donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude. Ugovor o izvođenju radova još uvijek nije zaključen.</p>	<p>Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju podzemn. pješačkog prelaza u Šušnju sa uređenjem terena broj 01-018/20-1872 od 16.07.2020.g</p> <p>2. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/21-1856/1 od 01.07.2021.g. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta broj 01-018/21-1881 od 05.07.2021.g. Plaćena faktura DOO "Arhitektura aurea" Pg za vršenje revizije glavnog projekta</p> <p>3. Plaćena faktura DOO "Via Project" PG za izradu glavnog projekta.</p> <p>4. Odluka o poništenju postupka javne nabavke Uprave javnih radova, br. 01-426/22-1723/3 od 12.05.2022g</p> <p>5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/22-2522/4 od 14.10.2022.g.</p>			<p>2. DOO "Arhitektura aurea" Pg</p> <p>3. DOO "Via Project" PG</p>	<p>Ugovorena vrijednost vršenja revizije glavnog projekta iznosila je 2.420,00 sa PDV-om. Vrijednost radova shodno revidovanom glavnom projektu iznosi 743.941,57€.</p> <p>Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta za izgradnju podzemnog pješačkog prelaza u Šušanju sa uređenjem terena iznosila je 10.000,00 sa PDV-om.</p> <p>Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđena je izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, procijenjene vrijednosti 1.125.300,00€ sa PDV-om</p> <p>Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova, procijenjene vrijednosti 33.759,00€ sa PDV-om.</p> <p>U 2022. godini očekuje se sprovođenje postupaka javnih nabavki za odabir izvođača i stručnog nadzora.</p>
2022							-Sproveden postupak javne nabavke za izbor izvođača radova

9.2.4.12.	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU</u>	12.420,00	12.420,00		
2022					

Finansijska realizacija

Projektni Plan: DRUGA FAZA VIDEO NADZORA

9.2.4.14.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	DRUGA FAZA VIDEO NADZORA	-povećenje stepena bezbjednosti saobraćaja -zaštite imovine i lica i održanja komunalnog reda.			- Opština Bar,		Troškovi realizacije projekta biće definisane projektno tehničkom dokumentacijom				- izrada projektne tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

Realizacija Projekta

Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta

9.2.4.14.	DRUGA FAZA VIDEO NADZORA						
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Finansijska realizacija

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.14. DRUGA FAZA VIDEO NADZORA				

Projektni Plan: NABAVKA SPECIJALIZOVANE OPREME I VOZILA ZA SLUŽBU ZAŠTITE

9.2.5.1.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021	2022	2023				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	NABAVKA SPECIJALIZOVANOG VOZILA I OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE	-Unaprjeđenje efikasnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti spašavanja, sa akcentom na omogućenje prilaska vatrogasaca nepristupačnim predjelima u gradskim i vangradskim područjima				- Opština Bar - Služba zaštite Opštine Bar	- donatori 200.000,00				- nabavka opreme shodno zakonskim procedurama	

Realizacija Projekta

9.2.5.1.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	NABAVKA SPECIJALIZOVANOG VOZILA I OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE						
2019-2022		1.Nabavka vozila iz donacije - Sproveden postupak odabira i nabavke vatrogasnog vozila iz donacije	1. nabavka opreme shodno zakonskim procedurama, Nabavka vozila preko donatora, izrada projekne dokumentacije prema donatoru; odabir odgovarajućeg vozila i prateće opreme; isporuka vozila Službi	1. decembar 2019. -realizovano jun 2022.	1.Opština Bar Služba zaštite i spašavanja	1. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država	1. Ugovorena vrijednost donacije 100.000,00 eura Isporuca vozila je realizovana, ukupna cijena 104.000 €
2021-2022		2. Nabavka vozila iz budžeta opštine sproveden postupaj javne nabavke, postupak javne nabavke nije realizovan	2. Nabavka vozila iz budžeta opštine: tenderska procedura za odabir ponuđača, poništenje tendera	2. decembar 2021. -maj 2022.	2. Opština Bar, Služba zaštite i spašavanja		2. Ugovorena vrijednost nabavke 70.000,00 eura

Finansijska Realizacija

9.2.5.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	NABAVKA SPECIJALIZOVANOG VOZILA I OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE				

2022		104.000,00			104.000,00 ²⁹
------	--	------------	--	--	--------------------------

Projektni Plan: RAZVOJ INFORMACIONO-TEHNOLOŠKOG OKRUŽENJA OPŠTINE BAR

9.2.5.4	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021	2022	2023				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	RAZVOJ INFORMACIONO- TEHNOLOŠKOG OKRUŽENJA U OPŠTINI BAR	-Ustanoviti jedinstveno radno okruženje za sve zaposlene, uz akcentiranj e sigurnosti podataka, poboljšanje ekonomičn osti i brzine u radu				- Opština Bar	- privatni partner	Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom				- nabavka opreme shodno zakonskim procedurama

Realizacija Projekta

9.2.5.4.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	RAZVOJ INFORMACIONO- TEHNOLOŠKOG OKRUŽENJA U OPŠTINI BAR			kontinuirano			
	-obnova licenci za Fortinet support service na 12 mjeseci	-obnova licenci za Fortinet support service na 12 mjeseci	-obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.04-427/22- 2005/1 od 19.12.2022		Opština Bar	NIS DOO	

²⁹ Donacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori

	-isporuka i instalacija opreme FIREWALL	-FortiGate-100F -FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	-obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-419/1 od 02.03.2022 god -ugovor za isporuku i instalaciju opreme Firewall-Fortinet FG-100F br.01-018/22-665 od 03.03.2022		Opština Bar	NISS DOO	ugovor za isporuku i instalaciju opreme Firewall-Fortinet FG-100F u iznosu od 4.950,00 i PDV u iznosu od 1.039,50
	-zakup cloud servera, fiksne IP adrese, baze podataka i povezanih servisa	-poboljšanje kvaliteta i sigurnosti pristupa bazama podataka i povezanim servisima	- obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.04-426/22-1554/1 od 14.09.2022 - ugovor za vršenje usluge zakupa cloud baziranog servera, fiksne IP adrese, baze podataka i povezanih servisa br. 01-018/22-2973 od 19.09.2022 god.		Opština Bar	Sektor Montenegro DOO	Ugovor za vršenje usluge zakupa cloud baziranog servera, fiksne IP adrese, baze podataka i povezanih servisa, zaključen u iznosu od 4.900,00 € i PDV u iznosu od 1.029,00 €
	-usluga izrada web sajta opštine Bar	- poboljšanje dizajna, povećanje i olakšanje pristupa web sajtu bar.me	-obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.04-426/22-1555/1 od 14.09.2022 god. -ugovor za pružanje usluga izrade web sajta br.01-018/22-2976 od 19.09.2022god		Opština Bar	MM HUB DOO	Ugovor za izradu web sajta zaključen u iznosu od 4.950 € i PDV u iznosu od 1.036,5 €
	-podizanje virtualne mašine lokalnog servera	-podizanje virtualne mašine lokalnog servera i čuvanje fajlova velikog formata -povezivanje servera sa portalom -kreiranje administratorskog naloga -dodjeljivanje pristupa i adresa -strukturiranje podataka -back up podataka	- obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.04-426/22-1735/1 - ugovor za podizanje virtualne mašine lokalnog servera br.01-018/22-3278 od 21.10.2022 godine		Opština Bar	MM HUB DOO	Ugovor za podizanje virtualne mašine lokalnog servera zaključen u iznosu od 4.200,00 € i PDV u iznosu od 882,00 €
	-implementacija pomoćnog servisa na portalu za slijepe i slabovide	-implementacija pomoćnog servisa na portalu za slijepe i slabovide	- obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br.04-426/22-1824				

Finansijska Realizacija

9.2.5.4.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	RAZVOJ INFORMACIONO-TEHNOLOŠKOG OKRUŽENJA U OPŠTINI BAR	27.830,00	27.830,00		
	-obnova licenci za Fortinet support service na 12 mjeseci	3.025,00	3.025,00		
	-isporuka i instalacija opreme FIREWALL Fortinet FG100	5.989,50	5.989,50		
	-zakup cloud servera, fiksne IP adrese, baze podataka i povezanih servisa	5.929,00	5.929,00		
	-usluga izrada web sajta opštine Bar	5.989,50	5.989,50		
	-podizanje virtualne mašine lokalnog servera	5.082,00	5.082,00		
	-implementacija pomoćnog servisa na portalu za slijepe i slabovide	1.815,00	1.815,00		

Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar

Prioritet 1. Unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU

9.3.1.1.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU	Unapređenje predškolskog obrazovanja u opštini Bar i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe djece i vaspitača				Ministarstvo prosvjete -Vlada Crne Gore	- Opština Bar Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				projektno tehnička dokumentacija

Realizacija Projekta

9.3.1.1.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU</u>	1. Opština Bar predložila je lokaciju za izgradnju objekta dječijeg vrtića u okviru DUP-u "Topolica-Bjeliši"		1. Feb/19 2. 04.11.2021-12.01.2022			Opština Bar je učestvovala u konsultacijama za određivanje lokacije sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizmana kojima je usvojen predlog Opštine Bar o lokaciji za izgradnju dječijeg vrtića.

		2. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru od 04.11.2021. Konkurs je realizovan i izabrano je idejno arhitektonsko rješenje.					<p>Vlada Crne Gore je kapitalnim budžetom za 2022. godinu opredjelila iznos od 20.200€ za ovu namjenu. Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta biće precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom</p> <p>Predlogom budžeta Crne Gore za 2023. godinu opredjeljen je iznos od 10.000€ za ovu namjenu (Aktivnost 19 032 K04 01). Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta biće precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom</p> <p>-Ministarstvo sprovelo konkurs za izbor idejnog rješenja vrtića</p>
2022							

Finansijska realizacija

9.3.1.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU</u>				
2022					

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA

9.3.1.6.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	

	<u>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</u>	-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija postojećih dječjih igrališta -Poboljšanje uslova za boravak djece na otvorenom; - unapređenje pejzažnog uređenja i infrastrukture, uređenje urbanih džepova				kontinuirano	-Opština Bar -Ministarstvo za kapitalne investicije Uprava za kapitalne investicije	-Opština Bar -J.P.Morsko Dobro -donatori -DOO „Sportsko – rekreativni centar“	64.850,00 58.282,80 726.411,22 1.100.000,00	64.850,00 ³⁰ 58.282,80 ³¹ 726.411,22 ³²	1.100.000,00 ³³		-Izrada projektne dokumentacije, - tenderska procedura za odabir izvođača radova, -izvještaj predsjednika o realizovanim radovima.
--	--	--	--	--	--	--------------	---	--	--	--	----------------------------	--	--

Realizacija Projekta

9.3.1.6.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</u>						
2021/2022	Adaptacija sportskog poligona u zahvatu DUP-a „Topolica II“	1. Urađena geodetska podloga 2. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za radove na I fazi adaptacije. Radovi su realizovani 3. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za vršenje stručnog nadzora	1. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 04-426/21-2614 2. Ugovor za adaptaciju sportskog poligona, broj 01-018/22-151 od 25.01.2022.god 3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora broj 01-018/22-377 od 11.02.2022.g. 4. Ugovor za izradu i montažu ograde oko	1. Nov/21 2. Nov/21 – Mart/22 3. Jan/22 – Mart/22 4. Mart/22 – Maj/22	Opština Bar	1. DOO "Cading" BR 2. DOO "Gradnja inženjering MNE" 3. DOO "Art Construction" 4. DOO "Tecta Inženjering" PG	Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 302,50€ sa PDV-om. Ugovorena vrijednost izvođenja radova iznosi 43.970,24€ sa PDV-om. Ugovorena vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 726,00€ sa PDV-om. Ugovorena vrijednost za izradu i montažu ograde iznosi 9.438,00€ sa PDV-om.

³⁰ Adaptacija sportskog poligona u zahvatu DUP-a „Topolica II“

³¹ [Uređenje igrališta za djecu na setalistu](#) Kralja Nikole

³² Uređenje trga Vladimira i Kosare

³³ Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici

		<p>4. II faza podrazumjeva izradu zaštitne ograde i postavljanje konstrukcije koševa.</p> <p>5. Izvedeni radovi na j. rasvjeti igrališta</p>	<p>sp. poligona, br. 01-018/21-1243 i Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke za nabavku košarkaških konstrukcija, broj 04-426/22-706</p> <p>5. Faktura DOO "Kom. delatnosti", br 04-402/22-1/499</p>	5. Maj/22		<p>DOO "Rondo" PG</p> <p>5. DOO "Komunalne delatnosti" BR</p>	<p>Troškovi nabavke i ugradnje košarkaških konstrukcija na poligonu iznose 3.339,60€ sa PDV-om.</p> <p>Vrijednost radova na javnoj rasvjeti iznosi 7.073,66€ sa PDV-om.</p> <p>Radovi na adaptaciji sportskog poligona su realizovani</p>
2021/2022	Uređenje igralista za djecu na setalistu Kralja Nikole	<p>1. Urađena geodetska podloga</p> <p>2. Sproveden postupak javne nabavke za odabir izvođača i zaključen ugovor o izvođenju radova na uređenju igrališta.</p> <p>3. Izvođenje pripremnih radova i postavljanje podloge igrališta</p> <p>4. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor za vršenje stručnog nadzora</p> <p>5. Nabavka i postavljanje stolova za tekbol</p>	<p>1. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 04-426/21-2614</p> <p>2. Ugovor za uređenje dječijeg igrališta, br. 01-018/22-616 od 28.02.2022.g.</p> <p>3. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 04-426/22-847/1 od 28.04.2022.g.</p> <p>4. Ugovor za vršenje stručnog nadzora broj 01-018/22-733 od 10.03.2022.g</p> <p>5. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, br. 04-426/22-827/1 od 21.04.2022.g.</p>	<p>1. Nov/21</p> <p>2. Jan/22 – Feb/22</p> <p>3. Apr 22</p> <p>4. Mart/22 – Maj/22</p> <p>5. Maj/22</p>	Opština Bar	<p>1. DOO "Cading" BR</p> <p>2. DOO "Gradnja inženjering MNE"</p> <p>3. DOO "Art gradnja" BR</p> <p>4. DOO "Oliver-Ing" BD</p> <p>5. DOO "Futuristic" PG</p>	<p>Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 302,50€ sa PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost uređenja igrališta iznosi 47.652,22€ sa PDV-om.</p> <p>Vrijednost pripremnih radova i izrade podloge iznosila je 6.026,53€.</p> <p>Ugovorena vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 671,55€ sa PDV-om.</p> <p>Troškovi nabavke i ugradnje stolova za tekbol iznose 3.630,00€ sa PDV-om.</p> <p>Radovi na uređenju igrališta su realizovani</p>
2022	Uređenje trga Vladimira i Kosare	<p>1. Izrada projekta konstrukcije trga</p> <p>2. Izrada projekta hidromaš. i elektro instalacija za walk trough fontanu, u sklopu projekta uređenja trga u Baru</p>	<p>1. Ugovor za izradu projekta konstrukcije trga broj 01-018/21-2740</p> <p>2. Ugovor za izradu projekta hidromašin. i elektro instalacija</p>	<p>1. Sep/22 – Okt/22</p> <p>2. Sep/22 – Okt/22</p>	Opština Bar	<p>1. DOO "AG inženjering"</p> <p>2. DOO "Saniteko Group"</p>	<p>Ugovorena vrijednost izrade projekta konstrukcije 2.178,00€ sa uračunatim PDV-om..</p> <p>Ugovorena vrijednost izrade projekta hidromašin. i elektro instalacija fontane 2.988,70€ sa uračunatim PDV-om..</p>

		<p>3. Projekat adaptacije elektroinstalacija trga Vladimira i Kosare</p> <p>4. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova na uređenju trga.</p> <p>5. Oblaganje postamenta mermerom na trgu</p> <p>6. Nabavka i ugradnja elektro kablova na trgu</p> <p>7. Isporuka i montaža klupa za trg Vladimira i Kosare</p> <p>8. Sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za vršenje stručnog nadzora</p>	<p>fontane broj 01-018/21-2726</p> <p>3. Ugovor za izradu projekta adaptacije elektroinstalacija broj 01-018/21-2741</p> <p>4. Ugovor za radove na uređenju trga, br. 01-018/22-281 od 07.02.2022.g.</p> <p>5. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, br. 04-426/22-1202/1 od 24.06.2022.g.</p> <p>6. Račun R2202196</p> <p>7. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, br. 04-426/22-1067/1 od 30.05.2022.g.</p> <p>8. Ugovor za vršenje stručnog nadzora, broj 01-018/22-503 od 18.02.2022.g.</p>	<p>3. Sep/22 – Okt/22</p> <p>4. Feb/22</p> <p>5. Jun/22</p> <p>6. Maj/22 – Jun/22</p> <p>7. Maj/22</p> <p>8. Feb/22</p>		<p>3. DOO "Red Flame"</p> <p>4. DOO "Bomakos" PG</p> <p>5. DOO "R 2000" BR</p> <p>6. DOO "Komunalne djelatnosti" Bar</p> <p>7. DOO "Oprema Liv" PG</p> <p>8. DOO "Oliver-Ing" BD</p>	<p>Ugovorena vrijednost izrade projekta adaptacije elektroinstalacija na trgu 847,00€ sa uračunatim PDV-om..</p> <p>Ugovorena vrijednost radova na uređenju trga iznosi 592.381,47€ sa uračunatim PDV-om..</p> <p>Troškovi oblaganja mermerom iznosili su 943,80€ sa uračunatim PDV-om..</p> <p>Troškovi nabavke i ugradnje elektro kablova iznose 1.925,93€ sa PDV-om.</p> <p>Troškovi nabavke i isporuke klupa iznosili su 2.722,00€ sa uračunatim PDV-om..</p> <p>Troškovi stručnog nadzora iznose 4.900,00€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Radovi na uređenju trga Vladimira i Kosare su realizovani.</p>
2022	izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici	<p>1. Opština Bar je 2022. godine kandidovala projekat izgradnje multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog centra prema Ministarstvu finansija u okviru postupka planiranja kapitalnog budžeta CG za 2023. godinu.</p> <p>2. Vladina Komisija za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države uvrstila je ovu investiciju u Predlog liste prioritetnih projekata.</p>	<p>1. Obrazac zahtjeva za prijavu i finansiranje kapitalnog projekta</p> <p>2. Informacija o Prijedlogu liste prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države za 2023. godinu objavljena na sajtu Vlade CG.</p>	<p>1. Mart/22</p> <p>2. Nov/22</p>			<p>Predlogom budžeta CG za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00€ za izradu projekta izgradnje multifunkcion. sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici</p>

		3. Predlogom budžeta CG za 2023. godinu planirana su sredstva za izradu projekta izgradnje multifunkcion. sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici (Aktivnost 19 038 K01 008)	3. Predlog budžeta CG za 2023.g. objavljen na sajtu Vlade Cg	Nov/22			
--	--	---	--	--------	--	--	--

Finansijska realizacija

9.3.1.6.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA</u>		849.544,02		
2022	Adaptacija sportskog poligona u zahvatu DUP-a „Topolica II“	64.850,00€	64.850,00€		
2022	Uređenje igrališta za djecu na setalistu Kralja Nikole	58.282,80€	58.282,80€		
2022	Uređenje trga Vladimira i Kosare	726.411,22€	726.411,22€		
2023	Izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici				

Projektni Plan: PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)				Drugi izvori (€)			
9.3.1.7.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)	-povećati prevenciju, ranu dijagnozu i optimizaciju u liječenju od raka sa poboljšanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru			do 31.05.2022 godine	-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar	- Zavod za javno zdravstvo Zadar -Opća bolnica Zadar -Institut za javno zdravlje Crne Gore, -Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke	854.585,50				-izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.7.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)	1. Izvršena optimizacija projekta 2. Zaključen Ugovor o kofinansiranju između MA (Management Authority)-upravljačkog tijela i LP (Lead Partnership)-vodećih partnera 3. Zaključen partnerski sporazum između MA i LP 4. Održana online početna	1. Optimizovan projekat u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima 2. Uvid u Ugovor 3. Uvid u Sporazum 4. Izvještaj i fotografije sa konferencije, medijski	1. mart 2020. 2. maj 2020. 3. jun 2020. 4. decembar 2020.g.	Zavod za javno zdravstvo Zadar-vodeći partner Projekta	Datum početka projekta odlagan je nekoliko puta zbog pandemije nove zarazne bolesti COVID-19. Projekat je još uvijek u početnoj fazi, a u narednoj fazi biće sprovedeno raspisivanje tendera po EU pravilima za nabavku endoskopskog stuba i elektrohirurške jedinice. Ovaj projekat se sprovodi u okviru Programa Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv, a sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 813.445,71 €.

		<i>konferencija ON TIME</i>	<i>izvještaji (prilog Barinfo i RTCG)</i>					
2021		<p>5. Angažovan ekspert za izradu specifikacije i ekspert za realizaciju tendera po EU pravilima</p> <p>6.Redovna OnLine komunikacija, sastanci sa LP i ostalim PP</p> <p>7. Redovan projektni sastanak uživo Bar</p> <p>8. Raspisan tender za endoskopski stub i elektrohiruršku jedinicu za polipektomije</p> <p>9. Radionica za NVO udruženja u Grudama (BiH)</p> <p>10. Učešće u izradi promo filma za projekte na programu Interreg IPA CBC HR-BA-</p>	<p>5. Mjesečni sastanci čl. tima sa menadžmentom i ekspertima, Ugovor</p> <p>6. Zapisnici, PrtScr, modifikacije projekta</p> <p>7. Zapisnici, potpisne liste, fotografije, konferencija za novinare, medijski izvještaji (društvene mreže (FB, Instagram), OB Bar site, Barinfo, RTCG, Pobjeda, Jedro, Feral)</p> <p>8. Tenderska i ostala prateća dokumentacija, objave (OB Bar site, Interreg IPA CBC HR-BA-ME site, Dan)</p> <p>9. Objave (OB Bar site, IJZCG site, portal Analitika, Barinfo)</p> <p>10. Promo film, objave (gov.me site, site EU kancelarija u CG, site</p>	<p>5. januar-mart 2021.g.</p> <p>6. januar-decembar 2021.g.</p> <p>7. 5. i 6. jul 2021.g.</p> <p>8. 26. jul – 30. avgust 2021.g.</p> <p>9. 29. jul 2021.g.</p> <p>10. 1.oktobar 2021.g.</p>				

		<p><i>ME za Dan evropske saradnje</i></p> <p>11. Edukacija zaposlenih na Webinar-u 15. evropskom kolorektalnom kongresu – St. Gallen</p> <p>12. Isporuka, instalacija i obuka zaposlenih na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</p> <p>13. Vršenje pregleda na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</p> <p>13a. Isporuka, instalacija i obuka zaposlenih na endoskopskom stubu i elektrohirurškoj jedinici za polipektomije</p>	<p>Opštine Bar, site OB Bar, portal Bar, Jedro, Feral, RTCG, Barinfo, Pobjeda, Dan, YouTube, društvene mreže)</p> <p>11. Učešće 6 zaposlenih (PrtScr, Participation List), objava site OB Bar, društvene mreže</p> <p>12. Faktura sa pratećom dokumentacijom, potpisne liste, fotografije</p> <p>13. Potpisne liste, .exl tabela</p> <p>13a. Zapisnik, potpisna lista, fotografije, objave društvene mreže, site OB BAR</p>	<p>11. 28. novembar – 2. decembar 2021.g.</p> <p>12. 29. novembar – 3. decembar 2021.g.</p> <p>13. od 2. decembra 2021.g. do kraja trajanja projekta</p> <p>13a. Instalacija i obuka 2. i 3. decembra 2021.g.</p>		
2022 god.		<p>14. Promotivno-informativne radionice u Baru i Ulcinju (opšta populacija, zdravstveni radnici, lokalne vlasti, NVO) u</p>	<p>14. Potpisne liste, fotografije, objave na društvenim mrežama, site-u OB BAR i</p>	<p>14. 29.03.2022. g. Opština Bar; 30.03.2022.g. Opština Ulcinj</p>		

		<p>saradnji sa PP IJZCG</p> <p>15. Nadogradnja e-health alata ON TIME (unaprjeđenje ranije razvijenog e-health alata koji je bio jedan od rezultata projekta MELAdetect). Ovaj alat biće baza za nadogradnju i stvaranje platforme za komunikaciju između pacijenata i zdravstvenih stručnjaka</p> <p>16. Nabavka opeme za COVID centar (infuzomati i perfuzori)</p> <p>17. Presentacija ostvarenih rezultata PG, Final conference Zadar</p>	<p>IJZCG, mediji i portali</p> <p>15. Korisnici baze podataka</p> <p>16. Faktura sa pratećom dokumentacijom, potpisne liste, fotografije</p> <p>17. Potpisne liste, fotografije, objavena društvenim mrežama, site</p>	<p>15. Od sredine aprila 2022. g. do kraja trajanja projekta 31.05.2022 godine</p> <p>16. Tokom aprila 2022. g. nabavka i praćenje do kraja trajanja projekta 31.05.2022 godine</p> <p>17. Tokom maja 2022.g.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Finansijska realizacija

	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.7.	<u>PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)</u> ³⁴	168.471,15			5.132,07 ³⁵ -IPA Izvještaj 1.1 13.990,91 ³⁶ -IPA Izvještaj 2.1 17.924,96 ³⁷ -IPA Izvještaj 3.1 131.423,21 ³⁸ -IPA Izvještaj 4.1

³⁴ NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dočim 15% predstavlja učešće OB BAR.

³⁵ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

³⁶ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

³⁷ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

³⁸ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

**Projektni Plan: POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE
DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)**

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere			
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)				
9.3.1.8.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)	-poboljšanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite - povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike - poboljšanje infrastrukture - edukacija iz oblasti laboratorijske dijagnostike.				projekat traje do 14.09. 2022.godine	-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar	-Zavod za javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih hercegboanske županije	999.050,20				- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.8.	<u>POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB- OP)</u>	1.Izvršena optimizacija projekta 2.Zaključen ugovor o kofinansiranju između Upravljačkog tijela i Vodećih partnera 3.Održana početna (Kick Off) konferencija	1.Optimizovan projekat u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima 2. Uvid u Ugovor 3.Izveštaj i fotografije sa konferencije, medijski izveštaji	1. mart 2020.g. 2. maj 2020.g. 3. 29.06.2020.g	JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska) Opća bolnica Zadar (Hrvatska) - vodeći partner Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegboanske županije (Bosna i Hercegovina)	Zbog epidemiološke situacije nastale usled pandemije nove zarazne bolesti COVID-19, došlo je do pomjeranja roka za potpisivanje ugovora, te samim tim i do odlaganja početka implementacije projekta i sprovođenja pojedinih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi 978.236,45€, od čega će Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar kroz ovaj projekat biti alocirano EUR 411.659,40 €. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. g. a trajeće 24 mjeseca.Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, unapređenje infrastrukture i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unapređenja nivoa pružene usluge. -Implementacija projekta LAB-OP planirana je 14. maja 2022. godine, međutim, zbog implementacije PTS-a (vazdušne pošte) u OB BAR, tražen je produžetak trajanja implementacije projekta do 14.09. 2022.g. , za šta još čekamo da nam odobre iz MA (Upravljačkog tijela).

2021		<p>4. Pokrenut postupak izrade Glavnog projekta PTS sistema (tzv. vazdušne pošte) i povećanje inicijalne linije sa 3 na 8</p> <p>5. Angažovan revident i ekspert za realizaciju tendera po EU pravilima</p> <p>6. Redovna OnLine komunikacija, sastanci sa LP i ostalim PP</p> <p>7. Istraživanje tržišta, single tender, ugovor, isporuka i plaćanje za promotivni materijal, uz izradu CIP-a za brošure kod Nacionalne biblioteke CT</p> <p>8. Istraživanje tržišta, single tender, ugovor, isporuka i plaćanje za 2 laptop računara sa operativnim sistemom i kancelarijskim programima i 2 monitora za članove projektnog tima OB Bar</p>	<p>4. Zaključeni podgovori sa izvođačima za izradu glavnog projekta</p> <p>5. Mjesečni sastanci čl. tima sa menadžmentom i revidentom i ekspertom, Ugovor</p> <p>6. Zapisnici, PrtScr, modifikacije projekta</p> <p>7. Tenderska i ostala prateća dokumentacija za nabavku promo materijala</p> <p>8. Tenderska i ostala prateća dokumentacija za računarsku opremu</p> <p>9. Zapisnici, potpisne liste,</p>	<p>4. početak 2021. g.</p> <p>5. januar-decembar 2021.g.</p> <p>6. januar-decembar 2021.g.</p> <p>7. jun-avgust 2021.g.</p> <p>8. jun-avgust 2021.g.</p> <p>9. 7. i 8. jul 2021.g.</p>			
------	--	---	--	--	--	--	--

		<p>9. Redovan projektni sastanak uživo Bar</p> <p>10. Učešće u izradi promo filma za projekte na programu Interreg IPA CBC HR-BA-ME za Dan evropske saradnje</p> <p>11. Organizacija međunarodnog putovanja za predstavljanje primjera dobre prakse</p> <p>12. Raspisan tender za nabavku i instalaciju PTS</p>	<p>fotografije, konferencija za novinare, medijski izvještaji (društvene mreže (FB, Instagram), OB Bar site, Barinfo, RTCG, Pobjeda, Jedro, Feral)</p> <p>10. Promo film, objave (gov.me site, site EU kancelarija u CG, site Opštine Bar, site OB Bar, portal Bar, Jedro, Feral, RTCG, Barinfo, Pobjeda, Dan, YouTube, društvene mreže)</p> <p>11. Troškovi putovanja, potpisna lista, fotografije, objave na site OB Bar i društvenim mrežama</p> <p>12. Tenderska i prateća dokumentacija</p>	<p>10. 1.oktobar 2021.g.</p> <p>11. 24. – 26. oktobar 2021.g.</p> <p>12. 28.12.2022.g. otvaranje 4.feb.2022.g.</p>			
2022		<p>13. Zaključen ugovor sa izabranim ponuđačem</p> <p>14. Uštede - nabavka laboratorijske i prateće opreme, zahtjev za</p>	<p>13. Ugovor i prateća dokumentacija</p> <p>14. Istraživanje tržišta, specifikacija opreme, tender,</p>	<p>13. 21.02.2022.g. isporuka sa instalacijom 60 dana</p> <p>14. Podnesen zahtjev za modifikaciju 22. marta 2022.g., još</p>			

		<p><i>produžetak roka trajanja projekta</i></p> <p>15. Domaćin info dana u CG za opštu populaciju u saradnji sa ZJZZD– podizanje svijesti o pripremi za laboratorijske nalaze</p> <p>16. Organizacija edukativnih radionica za primarni i sekundarni nivo zdravstvene zaštite u CG</p> <p>17. Presentacija ostvarenih rezultata i Final conference Zadar</p>	<p><i>prateća dokumentacija</i></p> <p>15. Potpisne liste, fotografije, objave na društvenim mrežama i site-u OB BAR</p> <p>16. Potpisne liste, fotografije, objave na društvenim mrežama i site-u OB BAR</p> <p>17. Potpisne liste, fotografije, objavene društvenim mrežama, site</p>	<p><i>uvijek čekamo odobrenje MA</i></p> <p>15. Održano 4. aprila 2022. g.</p> <p>16. Tokom aprila-maja 2022. g.</p> <p>17. Do kraja trajanja implementacije projekta</p>		
--	--	--	---	---	--	--

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.8.	<u>POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)³⁹</u>	9.368.41 ⁴⁰			6.689,18 ⁴¹ -IPA Izveštaj 3.1 2.679,23 ⁴² -IPA Izveštaj 4.1

Projektni Plan: DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	-unapređenje brige o starima u opštini Bar - obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe starih		28.02.2022	-Opština Bar -Caritas		188.428,07	9.421,40 5% od ukupnih troškova realizacije projekta		179.006,67 €	- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

Realizacija Projekta

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.9.	<u>DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)</u>	1. Opremljen je i stavljen u funkciju Dnevni boravak u okviru Caritasovog centra	1. Tenderska dokumentacija, inventarska lista, fakture i računi, fotografije, Izveštaj o		Caritas	Opština Bar	Projekat se realizuje planiranom dinamikom. Realizacijom ovog projekta unaprijeđen je nivo socijalne brige o licima starije životne dobi i obezbjeđeni su adekvatni uslovi za pružanje usluge dnevnog boravka za tu populaciju.

³⁹ NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dočim 15% predstavlja učešće OB BAR.

⁴⁰ Troškovi se prijavljuju po principu Flat Rate, tako da u prva dva izvještajna perioda nije bilo prijave troškova.

⁴¹ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

⁴² Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

		<p>2. 30 korisnika je obuhvaćeno uslugama Dnevnog boravka</p> <p>3. Sačinjen je i distribuiran informativni letak o projektu</p> <p>4. Pokrenut je postupak za izdavanje licence od strane resornog ministarstva Caritasu, kao pružaocu ove socijalne usluge</p>	<p>aktivnostima Dnevnog centra</p> <p>2. Dosjei korisnika Dnevnog centra, fotografije, izvještaj o aktivnostima Dnevnog centra</p> <p>3. Letak, račun</p> <p>4. Zahtjev i prateća dokumentacija pripremljena u skladu sa Pravilnikom za licenciranje</p>	2020- 2021-2022		<p>Servis Dnevnog boravka za starije osobe je licenciran za 30 korisnika kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja.od 15.06.2021.</p> <p>Dnevni boravak je svečano otvoren 30.09.2021. od strane gospodina Dušana Raičevića, predsjednika opštine Bar, gospođe Ljulje Dušaj, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja I nadbiskup barski mons Rrok Gjonlleshaj.</p>
--	--	--	--	-----------------	--	--

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	144 342,97			144 342,97- IPA

Prioritet 2. Obezbjedenje veće uključenosti ranjivih grupa

Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

9.3.2.1.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)				Drugi izvori (€)			
	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU</u>	- Omogućen adekvatan dnevni boravak djeci sa smetnjama u razvoju.					-Vlada Crne Gore	1.454.254,99	63.000,00	137.000,00 (Uplaćeno od strane Min. finansija 2009. godine)		- Odluka o osnivanju Dnevnog centra - Izvještaj o tehničkom prijemu -Izvještaj o radu predsjednika -Izvještaji Min rada, Min. prosvjete i Min. finansija	
							- Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Ministarstvo finansija -Opština Bar			342.879,88 ⁴³ 520.000,00 ⁴⁴			

Realizacija Projekta

9.3.2.1.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovo- đenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada idejnog rješenja)</u>	1.Raspisan Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju 2.Izabrana idejna rješenja u formi prve, druge i treće nagrade i izvršena dva otkupa idejnih rješenja 3.U galeriji Kulturnog centra organizovana je izložba svih radova pristiglih na Konkurs	1. Tekst Konkursa objavljen na sajtu Opštine Bar, u štampanim i elektronskim medijima 2. Završni izvještaj žirija br. 01-018/21-845 3.Fotografije sa izložbe	2020 -2021	Opština Bar	- Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Ministarstvo finansija -Opština Bar	Odlukom predsjednika Opštine Bar dana 31.12.2020. raspisan je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Za sprovođenje ovog projekta u budžetu Opštine Bar za 2021.godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00€ . Važno je podsjetiti da je dio sredstava za ovu namjenu, u iznosu od 137.000,00€ , uplaćen Opštini Bar 2009. godine, od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, na osnovu prethodno potpisanog Sporazuma. Nažalost, zbog nedobijanja saglasnosti Upravnog odbora OŠ "Meksiko" o ustupanju dijela parcele koja je DUP-om "Polje-Zaljevo" određena za izgradnju ovog objekta, nije bilo moguće pokrenuti radnje kojima bi bila započeta realizacija ovog projekta. Troškovi konkursa za dodjelu nagrada iznosili su 10.000,00€ . Troškovi geod. radova iznosili su 1.452,00€ sa PDV-om.

⁴³Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 / Aktivnost 22 025 K01 007 / Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

⁴⁴Prijedlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2023 / Aktivnost 22 025 K01 007 / Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

		4. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za izradu glavnog projekta dnevnog centra	4. Ugovor za izradu glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, br. 01-018/21-2448 od 27.08.2021.g	4. Avg/21 – Nov/21		4. DOO "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" PG	Ugovorena vrijednost radova za izradu glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa DOO "Republički zavod za urbanizam i projektovanje" iznosi 11.797,50€ . Glavni projekat je urađen i nalazi se u postupku revizije
		5. Sproveden postupak javne nabavke za vršenje revizije glavnog projekta	5. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, br. 01-018/21-3322 od 10.11.2021.g.	5. Okt/21		5. DOO "Kov atelje" NK	Ugovorena vrijednost radova za vršenje revizije glavnog projekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa DOO "Kov atelje" NK iznosi 2.879,80€ sa PDV-om. Shodno glavnom projektu vrijednost radova na izgradnji objekta iznosi 1.454.254,99€ .
		6. Sproveden postupak javne nabavke za izvođenje geotehničkih istraživanja	6. Ugovor za izvođenje geotehničkih istraživanja, br. 01-018/21-28/8 od 29.09.2021.g.	6. Sept21- Okt/21		6. DOO "Geoprojekt" PG	Ugovorena vrijednost radova za izvođenje geotehničkih istraživanja sa DOO "Geoprojekt" PG iznosi 3.472,70€ sa PDV-om. U narednim fazama, učešće u realizaciji ovog projekta, pored Opštine Bar, treba da preuzmu i državni organi, u prvom redu resorna ministarstva i Uprava javnih radova. S tim u vezi, Vlada Crne Gore je predlogom budžeta za 2023. godinu opredjelila iznos od 520.000,00€ (Aktivn. 22 025 K01 007) za ovu namjenu.
		7. Sproveden postupak javne nabavke za izvođenje geotehničkih istraživanja	7. Ugovor za izvođenje geotehničkih istraživanja, br. 01-018/21-28/8 od 29.09.2021.g.	7. Sept21- Okt/21		7. DOO "Geoprojekt" PG	Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je sprovođenje postupka za odabir izvođača. Procijenjena vrijednost izgradnje objekta je 1.116.400,00€ sa PDV-om Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je sprovođenje postupka za odabir stručnog nadzora na izgradnji objekta procijenjene vrijednosti 30.250,00€ sa PDV-om.
2022							Pokrenut je postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji Dnevnog centra

Finansijska Realizacija

9.3.2.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada ideinog rješenja)</u>	22.182,10	22.182,10		
2021		22.182,10	10.384,60 ⁴⁵ 11.797,50 ⁴⁶		
2022					

⁴⁵Sredstva opredjeljena kao novčani Fond za organizovanje Konkursa i dodjelu nagrada

⁴⁶Izrada glavnog projekta

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI

9.3.2.3.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI	-Eliminisanje arhitektonskih i ambijentalnih barijera; -podizanja svijesti o neophodnosti uvođenja elemenata pristupačnosti			-Opština Bar		150.000,00	150.000,00			-Tehnička dokumentacija -Izveštaj predsjednika opštine

Realizacija Projekta

9.3.2.3.	Projektat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI</u>						
2021	Rekonstrukcija pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića	1. Orjentacione mape naručene za zgradu Opštine 2. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za odabir izvođača za radove na rekonstrukciji pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića. Radovi su realizovani. 3. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za vršenje stručnog nadzora	2. Ugovor za rekonstrukciju pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Stojanovića, br. 01- 018/21-3526, od 29.11.2021.g. 3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora, br. 01-018/21-3844 od 17.12.2021.g.	kontinuirano	Opština Bar	2. DOO "Bomakos" PG 3. DOO "Art Construction" BR	Ugovorena vrijednost radova iznosi 36.215,18€ . Radovi na rekonstrukciji su realizovani pri čemu su postavljene i taktilne ploče u centru grada (ispred Cosmetics-a). Vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 363,00€ .
2022	Rekonstrukcija pješačke staze u Beogradskoj ulici od kružnog toka kod Lakovića do stare raskrsnice	1. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za izradu idejnog rješenja staze 2. U toku je postupak javne nabavke za uređenje pješačke staze	1. Ugovor za izradu idejnog rješenja, br. 01-018/22-959, od 25.03.2022.g. 2. Tenderska dokumentacija, br. 01-018/22-1719/1 od 25.05.2022.g.	1. Mar 22 2. Maj 22/ Jun 22	Opština Bar	1. DOO "Art Construction" BR 2. -	Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja iznosi 2.904,00€ . Predviđeno je postavljanje taktilnih ploča. Procijenjena vrijednost javne nabavke za uređenje pješačke staze u Beogradskoj ulici iznosi 100.140,00€ .

2022	Radovi na javnoj površini – staze (od raskrsnice kod Doma zdravlja do raskrsnice kod benzinske pumpe)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geod. snimanje situacije za trotoar od benz. pumpe do D. zdravlja 2. Sproveden postupak javnih nabavki za radove na stazi i zaključen ugovor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obavještenje o ishodu postupka j. nabavke, br. 04-426/22-200 2. Ugovor za radove na stazi od Doma zdravlja do benzinske pumpe, br. 01-018/22-890, od 21.03.2022.g. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mar 22 2. Mart 22/ Jun 22 	Opština Bar	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOO "Cading" BR 2. DOO "Bomakos" PG 	<p>Vrijednost izrade geodetskih snimanja iznosi 181,50€.</p> <p>Ugovorena vrijednost radova iznosi 40.057,65€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Predviđeno je postavljanje taktilnih ploča</p>
2020 / 2022	Uređenje kaldrme u Starom Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za izradu Glavnog projekta uređenja kaldrme u Starom Baru i zaključen ugovor 2. Sproveden postupak jednostavne javne nabavke za izradu konzervatorskog projekta uređenja kaldrme 3. Revizija glavnog projekta uređenja kaldrme 4. Revizija glavnog projekta elektrotehničkog projekta 5. Sproveden otvoreni postupak javne nabavke za radove na uređenju kaldrme u Starom Baru i zaključen ugovor 6. Vršenje konsultantskih usluga na projektu realizacije uređenja kaldrme 7. Sproveden postupak javne nabavke za vršenje stručnog 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ugovor za izradu glavnog projekta broj 01-018/20-1948 od 22.07.2020.g. 2. Ugovor za izradu konzervatorskog projekta broj 01-018/20-1949 od 22.07.2020.g. 3. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta, broj 01-018/20-2905 I 01-018/21-3577 4. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, br. 04-426/21-248/1 od 16.02.2021.g. 5. Ugovor za uređenje kaldrme u Starom Baru, broj 01-018/21-3226 od 03.11.2021.g 6. Ugovor za vršenje konsultantskih usluga, br. 01-018/21-3196 od 23.12.2021 7. Ugovor za vršenje stručnog nadzora na uređenju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jul 20/ Sep 20 2. Jul 20/ Sep 20 3. Nov 21/ Dec 21 4. Feb 21/ Mar 21 5. Sep 21/ Nov 21 6. Dec 21/ Jan22 7. Nov 21/ - 	Opština Bar	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOO "Inkoplan" PG 2. DOO "Inkoplan" PG 3. DOO "369 Studio" 4. DOO "All Ing" KO 5. DOO "Koto" BG 6. "Project Engineer. Renaissance" 7. DOO "Oliver-Ing" BD 	<p>Vrijednost izrade glavnog projekta rekonstrukcije kaldrme iznosi 14.600,00€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Vrijednost izrade konzervatorskog projekta rekonstrukcije kaldrme iznosi 9.350,00€ sa uračunatim PDV-om</p> <p>Vrijednost vršenja revizije glavnog projekta iznosi 2.904,00€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Vrijednost revizije projekta elektrotehnike iznosila je 302,50€ sa PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost radova na uređenju kaldrme u Starom Baru iznose 506.831,73€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Vrijednost vršenja konsultantskih usluga iznosi 968,00 sa PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 4.181,76€ sa uračunatim PDV-om.</p>

		nadzora na uređenju kaldrme i zaključen ugovor	kaldrme u Starom Baru, broj 01-018/21-3504 od 25.11.2021.g				Ugovorena vrijednost vršenja projektno-arhitektonskog nadzora iznosi 4.961,00€ sa uračunatim PDV-om.
		8. Sproveden postupak javne nabavke za vršenje projektno-arhitektonskog nadzora na uređenju kaldrme i zaključen ugovor	8. Ugovor za vršenje proj.-tehničkog nadzora na uređenju kaldrme u Starom Baru, broj 01-018/21-3389 od 23.11.2021.g.	8. Nov 21/-		8. DOO "Inkoplan" PG	Ugovorena vrijednost vršenja konzervatorskog nadzora iznosi 2.000,00€ sa uračunatim PDV-om.
		9. Vršenje konzervatorskog nadzora na uređenju kaldrme	9. Ugovor za vršenje konzervatorskog nadzora, br. 01-018/21-3381 od 23.11.2021.g.	9. Nov 21/-		9. Arhitektonski fakultet Podgorica	Prilagođavanje javne površine za pristup lica smanjene pokretljivosti planirano je u narednoj fazi izvođenja radova.

Finansijska Realizacija

9.3.2.3.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI</u>	568.483,09			
	2021	36.578,18			
	2022	531.904,91			
2021	Rekonstrukcija pješačke staze u ul. V. Rolovića i J. Tomaševića	36.578,18	36.578,18		
2022	Rekonstrukcija pješačke staze u Beogradskoj ulici od kružnog toka kod Lakovića do stare raskrsnice	2.904,00	2.904,00		
2022	Radovi na javnoj površini – staze (od raskrsnice kod Doma zdravlja do raskrsnice kod benzinske pumpe)	41.209,32	41.209,32		
2020 / 2022	Uređenje kaldrme u Starom Baru	487.791,59	487.791,59		

Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)				Drugi izvori (€)			
9.3.3.1.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU	-Rekonstrukcija objekta radi stvaranja boljih uslova rada i proširenja djelatnosti (pozorišni, muzički program, filmske projekcije, amaterska scena i edukacija građana), za potrebe stanovništva i podizanje nivoa kulture				- J.P.Kulturni centar Bar	- Ministarstvo kulture -Opština Bar	218.525,02		130.626,84 ⁴⁷		-izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektno tehničke dokumentacije -izvještaj o realizovanom tender za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije -izvještaj o sprovedenom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.1.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU	1.zamjenjenje daske na velikoj sceni 2.savremena audio mikseta 3.remontovan centralni sistem za grijanje sale	1.ugovor br.221 od 05.11.2019g. 2.ugovor br.2332 od 03.12.2019.g. 3.ugovor br.770 od 30.10.2019.g. i br. 895 od 16.12.2019.g	2021-2022	-J.P.Kulturni centar Bar -Ministarstvo kulture -Opština Bar	-EURO-UNIT -firma Potrlica doo Pljevlja -"D2 systems" doo Podgorica
2020		4.Instalirana četiri elektro-motorna cuga sa kompletnom instalacijom	4.ugovor br.664 od 03.06.2020. g.			4. -"ElektroVat"Čačak - IPA projekt Comlicities u iznosu 16,002,00€

⁴⁷ Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 20 021 K01 012 / Rekonstrukcija Doma Kulture "Vladimir Popović Španac"

2021		5.kompletna zamjena sjedišta, obnova scenske tehnike i ugradnja pozorišnih/binskih zavjesa 6.digitalizaciju kino opreme Doma kulture, odnosno, nabavku savremenog DCP projektora najnovije generacije 4K rezolucije, kao i DOLBY 7.1 sistem ozvučenja	5.po tenderu br.1004 od 24.08.2021.g. ugovor br.03-3-426/21-1451 od 04.11.2021.g 6.po tenderu br.923od 04.08.2021.g. ugovor 03-3-426/21-1350/2 od 15.11.2021.g.			5.-"Gat Montenegro" DOO Kotor 6. Filmski Centar Crne Gore	-izvršena je i kompletna zamjena sjedišta, obnova scenske tehnike i ugradnja pozorišnih/binskih zavjesa" -Opština Bar je "Sporazumom o transferu sredstava" broj 01/018/21-239 od 19.08.2021 godine prenela sredstva u iznosu od 41.273,00€ - IPA projekta Comlicities 46,252,00€ -110.000,00€ Ministarstvo kulture 50.000,00€ Filmski centar 60.000,00€
2022							

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.3.1.	<u>REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU</u>	218.525,02	41.273,00	50.000,00 Ministarstvo Kulture	5.000,00 JU Kulturni centar Bar 62.252,02 IPA projekat Comlicities 60.000,00 Filmski centar
2022					

Projektni Plan: SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.3.2.	SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU	-zaštita i adekvatna prezentacija ekspozata i pokretnih kulturnih dobara		do 17.04.2022	- J.P.Kulturni centar Bar	-Ministarstvo Kulture Crne Gore - Uprava za zaštitu kulturnih dobara -Opština Bar	280.000,00	65.000,00	195.000,00	20.000,00 Kulturni centar Bar	-izvještaj o zaključenom ugovoru za izradu sanaciono konzervatorskog projekta -izvještaj o realizaciji

Realizacija Projekta

	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.2.	<u>SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU</u>	1.izrada konzeratorskog projekta krova na zgradi Dvorca kralja Nikole 2.(javni poziv za izvođenje građevinskih radova u toku)	1.ugovor br 03-3- 426/21-1395/2 od 22.10.2021. 2.javni poziv br. 03- 3-426/21-1498 od 18.11.2021.g.	2021-2022	- Opština Bar -Ministarstvo Kulture Crne Gore -Uprava za zaštitu kulturnih dobara	- "Restarting" DOO Budva	Opština Bar dana 07.09.2021. godine, u skladu sa "Sporazumom o transferu finansijskih sredstava za potrebe adaptacije dijela zgrade muzeja – Dvorca kralja Nikole", potpisanim 06.09.2021. godine, transferisala iznos od 75.000,00 eura JP Kulturnom centru Bar. 18.11.2021. godine sproveden je Javni poziv za izvođenje restauratorskih radova na sanaciji krova " Dvorca kralja Nikole". 20.12.2021. godine su pristigle tri ponude: firma " Montal " DSD-Podgorica, KOTO Doo-Beograd i BomBeton- Cetinje. Odlukom postavljenom na sajtu 30.12. 2021. godine, kao ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana je firma BomBeton – Cetinje.
2022		3.potpisan ugovor za izvođenje restauratorskih radova na sanaciji krova " Dvorca kralja Nikole (JU Kulturni centar i BomBeton- Cetinje) 4.javni poziv za vršenje stručnog nadzora nad radovima sanacije krova Dvorca kralja Nikole u Baru)	3. ugovor br.03-3- 426/21-1697/2 od 28.01.2022.g. 4. ugovor br.03-3- 426/22-30/5 od 24.01.2022.godine			3.BomBeton d.o.o – Cetinje 4."Restarting" DOO Budva	18.01.2021. godine sproveden je Javni poziv (jednostavne nabavke) za vršenje stručnog nadzora nad radovima sanacije krova Dvorca kralja Nikole u Baru.21.01.2022. godine su pristigle tri ponude: firma " Restart ing " – Budva,EnForma-Kotor,Dema Doo-Kotor.Kao ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana je firma Restarting-Budva Po ugovoru br.03-3-426/21-1697/2 od 28.01.2022.g.(JP Kulturni centar-BomBeton) radovi na sanaciji krova Dvorca kralja Nikole započeli su 15.02.2022. godine, a završetak

							radova je planiran u roku od 60 dana, shodno vremenskim uslovima.
--	--	--	--	--	--	--	---

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.3.2.	<u>SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU</u>	79.840,00	75.000,00		4.840,00 sopstvena sredstva
2022					

Projektni Plan: ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)

9.3.3.4.	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)	- uređenje enterijera - rekonstrukcija krova - uređenje zapadne fasade		01.05.2022	- JP Kulturni centar Bar - Opština Bar	- Vlada Crne Gore	90.000,00	20.000,00	70.000,00		- izvještaj o enterijerskom uređenju prostora - izvještaj o urađenim radovima

Realizacija Projekta

9.3.3.4.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIJEPIŠKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)</u>	<p>1. Izvršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu (rekonstrukcija krova i otvora na istočnoj fasadi)</p> <p>2. Izrađen projekat enterijera</p> <p>3. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji enterijera i sa istim zaključen Ugovor</p> <p>4. Ugovor za nadzoru nad izvođenjem radova</p>	<p>1. Ugovor o izvođenju radova br.156 od 18.11.2020. Izvještaj o izvedenim radovima</p> <p>2. Ugovor o javnoj nabavci br.113/2019 od 5.11.2019.g.</p> <p>3. Ugovor o javnoj nabavci br.01-334/20-1567 od 06.03.2020, zaključen između Uprave javnih radova i d.o.o. "Bombeton" sa Cetinja, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/20-810 od 07.02.2020.g</p>	<p>1. novembar 2020- januar 2021.g.</p> <p>2. januar 2020.</p> <p>3. mart 2021.</p>	<p>1. JP Kulturni centar Bar</p> <p>2. Ministarstvo Kulture</p> <p>3. Uprava za javne radove</p>	<p>1. "Montal DSD" d.o.o. Podgorica</p> <p>2. "Studio Prostor" d.o.o., Podgorica</p> <p>3. "Bombeton" d.o.o. Cetinje</p> <p>4. "Enforma" d.o.o. Kotor</p>	<p>1. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 23.534,50€, sa uračunatim PDV-om. Da bi se stvorili uslovi za valorizaciju ovog objekta u muzejske svrhe, prvobitno je neophodno bilo izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na objektu, što je u ovoj fazi projekta i realizovano. Naredna faza se odnosi na adekvatno uređenje enterijera.</p> <p>2. Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 5.989,50 , sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Ugovor sa "Bombeton" d.o.o. Cetinje br.01-334/20-1567 od 06.03.2020. sa uračunatim PDV-om iznosi 91.499,99 €. Nakon završetka radova na uređenju enterijera objekta, preostali dio projekta se odnosi na njegovo opremanje muzealijama.</p> <p>4. Ministarstvo kulture je ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova zaključilo 17.07.2020 godine, broj 01/334-205581 sa firmom "Enforma" d.o.o. Kotor u iznosu od 4.500,00 €.</p>
2022		5. javni poziv za izradu izložbenih vitrina (jednostavne nabavke)				5. Anglian" doo Bar	Ekonomski najpovoljniji ponuđač firma "Anglian" Bar izradila je izložbene vitrine za potrebe arheološkog odjeljenja u iznosu od 5.200,00 eura. Otvaranje arheološkog odjeljenja planirano je do kraja aprila 2022. Godine.

Finansijska Realizacija

9.3.3.4.	Projektat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPIŠKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)	25.712,5	20.000,00 ⁴⁸		5.712,50-JP "Kulturni centar"
2021		101.989,49		5.989,50 ⁴⁹ 91.499,99 4.500,00	
2022		5.200,00			5200,00-JP "Kulturni centar"

Prioritet 4. Razvoj sportske infrastrukture

Projektni Plan: IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI

9.3.4.1.	Projektat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.					Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI	-Izgradnja natkrivenog terena -unapređenje sporta u Mrkojevićima				-Ministarstvo prosvjete	- Opština Bar - MZ Pečurice	702.779,31	150.000,00 ⁵⁰		50.000,00 \$ ⁵¹	-Izrada idejnog projekta -izvještaj o izradi glavnog projekta; izvještaj revizije glavnog projekta; -Izvještaj o sprovedenim tenderskim procedurama; -Izvještaji o realizaciji izvještaj o tehničkom prijetu

⁴⁸ II faza projekta -2020. godina 25.712,50 eura (Opština Bar 20.000,00 + 5.712,50 sopstvena sredstva)

⁴⁹izvor finansiranja Kapitalni budžet Crne Gore

⁵⁰ Memorandumom o realizaciji i sufinansiranju projekta "Izgradnja školske sportske sale JU OŠ "Mrkojevići", opština Bar" zaveden u Službi Predsjednika pod brojem 01-018/20-3216 od 30.11.2020. godine.

⁵¹ iznos je predviđen u dolarima (\$) – donator Udruženje "Rumija-Čikago"

Realizacija Projekta

9.3.4.1.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
2021	<u>IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI</u>	1. Idejni projekat fiskult. sale OŠ "Mrkojevići"	1. Ugovor za izradu idejnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići”, broj 01-018/21-1670 od 16.06.2021.g.	Jun 2021 – Avg 2021	Opština Bar	1. "Archistudio" DOO Ulcinj	Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosil 3.630,00€ sa PDV-om.
		2. Urađen glavni projekat fiskult. sale OŠ "Mrkojevići"	2. Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići” broj 01-018/21-1683 od 17.06.2021.g	Jun 2021- Dec 2021		2. "Archistudio" DOO Ulcinj	Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosi 5.445,00€ sa PDV-om.
		3. Urađena revizija glavnog projekta	3. Ugovor za vršenje revizije glavnog projekta za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Mrkojevići”, broj 01-018/21-13642 od 06.12.2021.g	3. Dec 21-		3. DOO "Arch and Soul" BP	Ugovorena vrijednost vršenja revizije glavnog projekta izgradnje fiskult. sale iznosi 3.477,15€ sa PDV-om. Vrijednost izgradnje objekta shodno glavnom projektu iznosi 702.779,31€ sa PDV-om.
2022							

Finansijska Realizacija

9.3.4.1.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI</u>	9.075,00			
2021		9.075,00	9.075,00 ⁵²		
2022					

⁵² troškovi izrade idejnog i glavnog projekta

Projektni Plan: IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)				Drugi izvori (€)			
9.3.4.2.	IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA	-Izgradnja bazena za potrebe stanovništva; -razvoj sportskih aktivnosti i turizma -unaprijeđenje sportske infrastrukture					-Direkcija javnih radova Crne Gore	- Opština Bar -privatni partner	8.000.000		66.060,72 ⁵³		-izrada idejnog rješenje ili idejnog projekati; -izrada glavnog projekta; - revizija glavnog projekta; -sprovođenje tenderskih procedura; -odabir izvođača radova; -izvođenje radova; - tehnički prijem radova;

Realizacija Projekta

	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.4.2.	<u>IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA</u>	1. Urađeni geodetski radovi i situacioni plan 2. Sproveden konkurs za idejno arhitektonsko rješenje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru. Nije izabrano pobjedničko rješenje.	1. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 04-426/21-1908 2. Odluka o raspisivanju javnog konkursa i Izveštaj konkursne komisije	1. 2021.g. 2. Nov/21-Feb/22			Troškovi geodetskih radova iznosili su 1.452,00€ sa PDV-om. Ukupan konkursni fond iznosi 35.000,00 eura. Nagradni fond iznosi 26.500,00 eura sa uračunatim porezima. Na Konkursu nije izabrano pobjedničko rješenje zbog nedostataka odgovarajućih urbanističkih parametara predmetne lokacije.
2022							-Izrada izmjeneI dopuna DUP-a Topolica 3 u toku, sa preporukama konkursnog žirija za korekciju UTU za ovu lokaciju

⁵³Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 19 032 K02 026 / Projekat izgradnje olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.4.2.	<u>IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA</u>	13.452,20	13.452,20 ⁵⁴		
2022					

⁵⁴ Troškovi realizacije konkursa i troškovi geodetskih radova

Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar

Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastrukture

Projektni Plan: GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.1.	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA	-analiza i izrada idejnog rješenja -izrada glavnog projekta; -revizija glavnog projekta			- JP Regionalni vodovod	- Opština Bar	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Tenderska procedura za izradu glavnog projekta/zaključen ugovor sa najboljim ponuđačem -Tenderska procedura za reviziju glavnog projekta/zaključen ugovor za reviziju glavnog projekta

Realizacija Projekta

	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.1.	<u>GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA</u>	1.analiza i izrada idejnog rješenja (u toku)		12 mjeseci	-Regionalni vodovod Crnogorsko primorje d.o.o., Budva		
2022							

Finansijska Realizacija

	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.1.1.	<u>GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA</u>				
2022					

Projektni Plan. OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU

9.4.1.4.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.					Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)	
	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja				-Opština Bar	Opština Bar -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar	313.536,62	313.536,62			- izrada projektne tehničke dokumentacije -izrada studija zaštite parkova -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine.

Realizacija Projekta

9.4.1.4.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>						
2020	Park na UP Z20, blok "2", zona "B", po DUP-u "Topolica Bjeliši"	1. Urađeno idejno rješenje	1. Ugovor za izradu idejnog rješenja za uređenje parkovske površine, br. 01-018/20-2715 od 19.10.2020.g.	1. Okt/20	Opština Bar	1. DOO "Arch & Construction" UL	1. Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja 332,75€sa PDV-om.

		<p>2. Urađen Glavni projekat</p> <p>3. Sproveden postupak javne nabavke za čišćenje i uređenje terena na parceli parka</p>	<p>Faktura izvođača DOO "Arch & Construction" UL</p> <p>2. Ugovor za izradu gl.projekta za izgradnju i uređenje parkovske površine, br. 01-018/20-1901 od 20.07.2020.g. Faktura izvođača DOO "Arch & Construction" UL</p> <p>3. Ugovor za za čišćenje i uređenje terena na dijelu kat. Parcele 5004/1 KO Novi Bar, br. 01-018/22-1375 od 04.05.2022.g.</p>	<p>2. Okt/20- Nov/20</p> <p>3.Maj/20- Jun/20</p>		<p>2. DOO "Arch & Construction" UL</p> <p>3. DOO "Vučetić VIP" BR</p>	<p>2. Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta je 12.899,00€ sa PDV-om.</p> <p>3. Ugovorena vrijednost čišćenja i uređenja terena iznosi 3.460,60€.</p>
2021		<p>4. Izvršena revizija glavnog projekta</p> <p>5. Sproveden postupak javnih nabavki i izabran izvođač radova DOO "Grand design" iz Podgorice</p> <p>6. Ugovor o izvođenju radova je raskinut</p> <p>7. Sproveden novi postupak javne nabavke i izabran izvođač radova DOO "Civil engineer" iz Podgorice</p> <p>8. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir stručnog nadzora na izgradnji.</p>	<p>4. Ugovor</p> <p>5. Ugovor za uređenje javne površine – parka Topolica Bjeliši na UP Z20, br. 01-018/21-1898 od 05.07.2021.g.</p> <p>6. Izjava o jednostranom raskidu ugovora, br. 01-018/21-2911/1 od 06.10.2021.g.</p> <p>7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude</p> <p>8. Ugovor za vršenje stručnog nadzora br. 01-018/21-2042 od 16.07.2021.g.</p>	<p>4. Dec/20- Feb/21</p> <p>5. Apr/21- Jul/21</p> <p>6. Nov/21</p> <p>7. Okt/21- Nov/21</p> <p>8. Jul/21</p>		<p>4. DOO "Mageling" BR</p> <p>5. "Grand design" PG</p> <p>6. "Grand design" PG</p> <p>7. "Civil engineer" iz Podgorice</p> <p>8. Konzorc. DOO "Arhitektura aurea" PG I DOO "Planplus" PG</p>	<p>4. Vršnje revizije glavnog projekta predstavlja donaciju DOO "Mageling" iz Bara</p> <p>5. Ugovor sa izvođačem DOO "Grand design" zaključen je na iznos od 152.680,62€ sa PDV-om.</p> <p>6. Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza koje se odnose na ugovorenu dinamiku i kvalitet radova, ugovor sa DOO "Grand design" PG je raskinut</p> <p>7. Vrijednost radova na uređenju parka shodno ugovoru zaključenom sa DOO "Civil engineer" iz Podgorice iznosi 200.040,63€ sa PDV-om. Realizacija radova je u toku.</p> <p>8. Ugovorena vrijednost usluge vršenja stručnog nadzora iznosi 4.961,00€ sa PDV-om.</p> <p>Radovi na izgradnji parka su realizovani.</p>
2021	Park na UP Z16, blok "2", zona "B", po DUP-u "Topolica Bjeliši"	<p>1. Izrada geodetske podloge i Elaborata parcelacije</p> <p>2. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja I glavnog projekta.</p>	<p>1. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-1380 od 21.07.2021.g.</p> <p>2. Ugovor za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta pejzažne arhitekt., br.</p>	<p>1. Jul/21- Sep/21</p> <p>2. Nov/21</p>	Opština Bar	<p>1. DOO "Ekvidistanca" BR</p> <p>2. DOO "Planplus" PG</p>	<p>1. Vrijednost izrade geodetskih radova je 363,00€ sa PDV-om.</p> <p>2. Ugovorena vrijednost izrade idejnog rješenja i glavnog projekta iznosi 2.620,00€ sa PDV-om.</p>

			01-018/21-3029 od 18.10.2021.g.				Vrijednost radova shodno gl projektu iznosi 48.807,77€ sa PDV-om.
2021	Adaptacija pionirskog parka	1. Urađen katastarsko – topografski plan	1. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-2614	1. Nov/21	Opština Bar	1. DOO "Cading" BR	1. Troškovi geodetskih radova iznose 544,50€ sa PDV-om.
		2. Sproveden postupak javnih nabavki i izabran izvođač radova	2. Ugovor za adaptaciju pionirskog parka, br. 01-018/21-3578 od 01.12.2021.g.	2. Dec/21		2. Konzorcijum "Gradnja inženjering MNE" – Montecontrol"	2. Ugovor za adaptaciju pionirskog parka zaključen je na iznos 42.362,97€ sa PDV-om.
		3. Sproveden postupak javnih nabavki za odabir stručnog nadzora na adaptaciji parka	3. Ugovor za vršenje stručnog nadzora br. 01-018/21-3844 od 17.12.2021.g.	3. Dec/21- Mart/22		3. DOO "Art Construction" BR	3. Ugovorena vrijednost usluge vršenja stručnog nadzora je 605,00€ sa PDV-om
2022		4. Nabavka i sadnja čempresa u Pionirskom parku	4. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/22-704, od 05.04.2022.g.	4. Apr/22		4. DOO "Komunalne djelatnosti" BR	4. Vrijednost nabavke i sadnje čempresa iznosi 4.015,47€ .
							Radovi su realizovani
2022	Nabavka i ugradnja teretane na otvorenom u parku Šumice	1. Sproveden postupak javne nabavke i izabran najpovoljniji ponuđač za izradu teretane na otvorenom	1. Ugovor za izvođenje radova, nabavku, transport i ugradnju teretane, br. 01-018/22-1296 od 19.04.2022.g.	1. Mart/22 – Apr/22	Opština Bar	1. DOO "Eksplorer" KL	1. Ugovorena vrijednost za izvođenje radova, nabavku, transport i ugradnju teretane iznosi 42.287,07€ .
							Radovi su realizovani

Finansijska Realizacija

9.4.1.4.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH. KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>	329.419,80			
2020		123.001,90	123.001,90		
2021		160.115,35	46.537,47		
2022		46.302,55	46.302,55		
2020	Park na UP Z20, blok "2", zona "B", po DUP-u "Topolica Bjeliši"	236.579,78	123.001,90 ⁵⁵		
2021			113.577,88		
2021	Park na UP Z16, blok "2", zona "B", po DUP-u "Topolica Bjeliši"	3.025,00	3.025,00 ⁵⁶		
2021	Adaptacija pionirskog parka	47.527,94	43.512,47		
2022			4.015,47		
2022	Nabavka i ugradnja teretane na otvorenom u parku Šumice	42.287,08	42.287,08 ⁵⁷		

⁵⁵ Troškovi izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, čišćenja terena, I i II privr. situacije za radove na uređenju parka.

⁵⁶ Troškovi geodetskih radova i izrade idejnog i glavnog projekta.

⁵⁷ Izdaci za izvođenje radova, nabavku, transport i ugradnju teretane.

Projektni Plan: UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.5.	UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja			-Opština Bar -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar	200.000,00				-Odluka o izboru lokacija namjenjenih za unaprijeđenje sistema -izrada projektno tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.5.	<p><u>UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</u></p> <p>1.-bunar kod Dvorca Kralja Nikole, djelimično urađen sistem za zalivanje.</p> <p>-bunar, neposredno uz Bulevar Dinastije Petrović ispred zgrade H24, urađen sistem za zalivanje</p> <p>-bunar kod zelene pijace</p> <p>-bunar kod zgrade F16</p> <p>2.-Zelena površina ispred sportske dvorane "Topolica" sa ugrađenim automatskim zalivanjem 4.500 m² površine.</p> <p>-Razdjelno ostrvo od kružnog tokak mosta Željeznice do "Mimoze" (sistem kap po kap sa automatskim upravljanjem)</p> <p>-Kružni tok kod "Mimoze" (kap po kap sa automatskim upravljanjem)</p>	<p>1.Tehnička dokumentacija</p> <p>2.Tehnička dokumentacija</p>	<p>1.realizovano</p> <p>2.realizovano</p>	<p>1.Komunalne djelatnosti DOO</p> <p>2.Komunalne djelatnosti DOO</p>		
2022						

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.1.5.	<u>UNAPREĐENJE</u> <u>SISTEMA ZA</u> <u>KVALITETNO</u> <u>ODRŽAVANJE JAVNIH</u> <u>ZELENIH POVRŠINA</u>	20.400,00			1. 2.400,00 Komunalne djelatnosti DOO 2. 18.000,00 Komunalne djelatnosti DOO
2022					

Projektni Plan: IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE

9.4.1.6.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE	-Obezbeđivanje adekvatnih uslova za zbrinjavanje napuštenih životinja, prvenstveno pasa lutilica na teritoriji opštine Bar			-Opština Bar	-D.O.O. "Lovstvo" Bar -nevladine organizacije i udruženja,	540.060,44				-Odluka o opredjeljivanju lokacije namijenjene za izgradnju -izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektno tehničke dokumentacije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

Realizacija Projekta

9.4.1.6.	Projekt	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	<u>IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</u>	1.Izrada geodetske podloge i Elaborata parcelacije 2.Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta skloništa za napuštene životinje. 3.Izrada Elaborata geotehničkih ispitivanja	1.Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 04-426/21-917 od 28.04.2021.g. Faktura DOO "Ekvidistanca" BR Faktura DOO "Cading" BR 2.Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke za izradu idejnog rješenja objekta br. 04-426/21-1079 od 28.05.2021. Faktura DOO "Basketing" BR Ugovor za izradu glavnog projekta za izgradnju objekta skloništa sa pratećom infrastrukturuom br. 01-018/21- 2313 od 11.08.2021.g. Faktura DOO "Basketing" BR	1. Maj/21 - Nov/21 2. Maj/21 - Dec/21	Opština Bar	1. DOO "Ekvidistanca" BR DOO "Cading" BR 2. DOO "Basketing" BR 3. DOO "Geotehnika" NK	1. Troškovi izrade geo podloge i elaborate parcelacije iznose 726,00 € sa PDV-om. 2. Troškovi izrade idejnog rješenja iznose 3.327,50€, a ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta iznosi 6.037,90€ sa PDV-om

		<p>4. Izrada revizije Glavnog projekta</p> <p>5. Objavljen postupak javnih nabavki za odabir izvođača. Postupak je poništen jer nije bilo podnijetih ponuda.</p> <p>6. Objavljen novi postupak javnih nabavki za odabir izvođača.</p>	<p>3. Ugovor za izradu geotehničkog elaborata br. 01-018/21-2817 od 29.09.2021.g. Faktura DOO "Geotehnika" NK</p> <p>4. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke za izradu revizije projekta br. 04-426/21-1745/1 od 04.10.2021.g. Faktura DOO "Magelling" BR</p> <p>5. Odluka o poništenju postupka javne nabavke br.01-018/21-3626/1 od 06.12.2021.g</p> <p>6. Tenderska dokumentacija</p>	<p>3. Sept/21 - Okt/21</p> <p>4. Okt- Nov/21</p> <p>5. Dec/21</p> <p>6. Dec/21</p>		<p>4. DOO "Mageling" BR</p>	<p>3. Ugovorena vrijednost izrade geotehničkog elaborata iznosi 3.707,44€ sa PDV-om.</p> <p>4. Troškovi revizije glavnog projekta iznose 968,00€ sa PDV-om.</p>
2022		<p>7. Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke zaključen je ugovor za izgradnju objekta sa najpovoljnijim ponuđačem</p> <p>8. Sproveden postupka javne nabavke I odabran najpovoljniji ponuđač za vršenje stručnog nadzora</p> <p>9. Radovi na izgradnji objekta započeti u aprilu</p> <p>10. Radovi na izgradnji objekta su realizovani</p>	<p>7. Ugovor za izgradnju azila za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom, broj 01-018/22-670 od 04.03.2022. god.</p> <p>8. Ugovor za vršenje stručnog nadzora, broj 01-018/22-846 od 17.03.2022.god.</p>	<p>7. Mart/22</p> <p>8. Apr/22</p> <p>9. Apr/22-</p> <p>10. Dec/22</p>		<p>7. DOO "Kalamper" BR</p> <p>8. DOO "Art Construction" BR</p>	<p>Ugovorena vrijednost izgradnje objekta i prateće infrastrukture iznosi 540.060,44€ sa uračunatim PDV-om.</p> <p>Ugovorena vrijednost stručnog nadzora na izgradnji objekta i prateće infrastrukture iznosi 5.929,00€ sa uračunatim PDV-om</p> <p>Budžetom Opštine Bar planirana su sredstva nabavku neophodne opreme</p>

Finansijska Realizacija

9.4.1.6.	Projekt	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
	<u>IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</u>	273.046,47			
2021		11.438,44	11.438,44		
2022		261.608,03 ⁵⁸	110.841,94 150.766,09		

Prioritet 2: Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadom

Projektni Plan: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „MOŽURA“

9.4.2.4.	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „MOŽURA“	-Izgradnja postrojenja za kompostiranje i dobijanje komposta kao organskog đubriva			-Ministarstvo održivog razvoja i turizma -Agencija za zaštitu životne sredine -„Možura“ D.O.O.	- Opština Bar,	3.645.062,72 €				-Studija izvodljivosti - izrada projektno tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izveštaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

⁵⁸ Izdaci za izradu geo podloge, revidovane projektno-tehničke dokumentacije, geotehničkog elaborata, I, II i III privremene situacije.

Realizacija Projekta

9.4.2.4.	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONJI „MOŽURA“	1.Studija izvodljivosti za izgradnju Centra za selekciju i Centra za kompostiranje	1.Ugovor o izradi studije izvodljivosti 28.09.2019.	2022-	-Ministarstvo održivog razvoja i turizma -Agencija za zaštitu životne sredine -Možura” D.O.O.	1. „Stantec sa/nv” iz Belgije	Potrebno je izvršiti promjenu Urbanističkog projekta Možure. Aktivnosti u ovom dijelu su preduzete. Očekujemo da u toku 2022. godine bude realizovana izmjena UP Možura.
2022							Ministarstvo pokrenulo izradu izmjena I dopuna PUP-a Bara

Finansijska Realizacija

9.4.2.4.	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONJI „MOŽURA“	230.000,00			230.000,00 - Donacija Evropske komisije
2022					

Projektni Plan: PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaci ji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2021.	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.2.5. PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“	-Duži životni vijek rada deponije, dugoročno rješavanje pitanja odlaganja komunalnog otpada primorskih opština				-Vlada Crne Gore -“Možura” D.O.O. -Opština Bar		4.500.000				-konceptualno rješenje za izgradnju novih sanitarnih kada Izrađeno je konceptualno rješenje za izgradnju novih sanitarnih kada, geodetski i geomehanički elaborat u zahvatu Urbanističkog projekta. Završeno je geodetsko snimanje dijela koji je u privatnom vlasništvu, a oslanja se na deponiju. Potrebno je uraditi ldejno rješenje. Nakon izbora lokacije za proširenje, pristupiće se izradi Glavnog projekta i dobijanju neophodnih dozvola za izgradnju ili principa „projektuj i izgradi“.

Realizacija Projekta

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.2.5. PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“	1.decembar 2021 godine rapisan tender za izradu konceptualnog rješenja. U periodu novembar – decembar 2021.godine, održan je niz sastanaka sa predstavnicima državnih i međunarodnih institucija kako bi se iznašao model I sredstva za proširenje kapaciteta deponije	1.Ugovor za izradu konceptualnog rješenje zaključen (datum i broj ugovora)	2022-	“Možura” DOO Bar “Možura” DOO Bar, Agencija za zaštitu životne sredine, Eko fond, Ministarstvo ekologije I zaštite životne sredine, EBRD	1.(firma koja je izradila konceptualno rješenja)	Nije bilo zainteresovanih učesnika. Postupak će biti ponovljen.

2022							
------	--	--	--	--	--	--	--

Finansijska Realizacija

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.2.5.	PROŠIRENJE TIJELA DEPONJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONJI „MOŽURA“				
2022					

ZAKLJUČAK

Od ukupno 99 projekata zastupljenih u Strateškom planu razvoja opštine Bar 2020-2025, za realizaciju u toku 2022. godine bilo je predviđeno je 38 projekata, od čega je okončano njih 11 okončano u 2022. Godini, dok su ostali u različitim fazama realizacije.

Ono što je karakteristično za period tokom cijele 2022. godine je potpuni gubitak koordinacije od strane Vlade i zapostavljanje nadležnosti koje ima u okviru realizacije projekata. Naime, u predmetnom periodu dva puta je izglasavan Zakon o budžetu koji je djelimično uspio da predvidi finansijska ulaganja koje Vlada ima u realizaciji projekata, ali se planirana sredstva nisu iskoristila i imamo situaciju da nijedan projekat u nadležnosti Vlade u 2022. godini nije realizovan.

Naime, u odnosu na 2020. i 2021. godinu, kada je procenat ulaganja iz državnog budžeta iznosio **23,76%** odnosno **6,68%**, za ovaj izvještajni period iznosi **0%**, što ukazuje na to da planiranje i usaglašavanje projekata u kojima se Vlada javlja kao investitor ili učesnik, sa postojećim Strateškim planom opštine Bar 2020-2025, nema potrebni kontinuitet. Ovakva dinamika realizacije utiče na predviđene vremenske rokove u realizaciji SPR 2020-2025, posebno time da svi oni projekti u kojima je Vlada primarna u realizaciji (plansko tehnička dokumentacija, finansijska ulaganja) bivaju odloženi ili potpuno zapostavljeni.

Značajno je napomenuti da projekat Izgradnja graničnih prelaza Virpazar i Ckla sa republikom Albanijom tj. izgradnja luke Virpazar je od planiranog do isplaniranog, doživio preobražaj i to u obimu koji je prvobitno bio vezan u cjelosti sa graničnim prelazima Virpazar i Ckla i lukom Virpazar kao neophodnim dijelom. Projektom je definisana samo luka Virpazar. Kao nosioci projekta su Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Kroz niz iteracija je pokušano da se luka Virpazar definiše kako bi se zadovoljili uslovi koje propisuje "RAMSAR" lista za NP Skadarsko jezero. Od prvobitnog pristupa rješenju se odustalo, jer je bio neophodan monitoring uticaja na okolinu NP Skadarsko jezero, što sam EU projekat tajmingom nije zadovoljavao i moralo bi se odustati od investicija u iznosu od 2.440.000,00 € EU sredstava, tako da je na drugi način pokušano rješavanje problema luke Virpazar. Na kraju ni ovaj način nije uspio te je ovaj iznos u potpunosti izgubljen.

Slična situacija je sa dva projekta od izuzetne regionalne važnosti: Izgradnja postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada na sanitarnoj deponiji „Možura“ i Proširenje tijela deponije izgradnjom novih sanitarnih kada za odlaganje komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji „Možura“ za koje opština Bar nema mogućnosti da sama rješi problem. Takođe, izgubljena je mogućnost realizacije projekta Valorizacija lokacije up44 u cilju izgradnje tržnog centra jer još uvijek nijesu usvojene izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Topolica III, te je realizacija ovog projekta upitna.

Godišnji akcioni plan za 2022. bilježi povećanje u kontinuitetu projekata koje vodi lokalna samouprava i koji imaju trend konstantnog rasta i to: Podrška razvoju poljoprivrede u opštini Bar; Podrška preduzetništvu kroz biznis ideje; Podrška ženskom preduzetništvu kroz biznis ideje. Ovi projekti su realizovan sa ulaganjem od preko 260.000 €. Takođe, ovo su sve jednogodišnji projekti koji se u kontinuitetu realizuju. Veoma je važno, zbog uspješnosti realizacije Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 obratiti pažnju na disbalans koji se odnosi na strateške ciljeve i prioritete u odnosu planirano-realizovano gdje se disproporcija iskazuje kroz Specifični strateški cilj 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unaprjeđenje ostalih privrednih grana u odnosu na ostale strateške ciljeve.

U vezi sa navedenim važno je napomenuti da se Godišnji akcioni plan Strateškog plana razvoja 2020-2025 može okarakterisati kao uspješno realizovan u dijelu sprovođenja projekata koji su bili u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave. Sa druge strane, evidentan je neuspjeh u dijelu projekata za čiju realizaciju je bilo neophodno uključivanje Vlade i referentnih državnih službi i organa, gdje se primjećuje konstantno opadajuće učešće.
