



OPŠTINA BAR

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BAR (2020-2025.)
za 2020.godinu**

maj, 2021.godine

Sadržaj

Uvod.....	3
Strateški okvir politike lokalnog razvoja.....	3
Metodologija izrade Izvještaja.....	4
Stepen realizacije ukupnih ulaganja.....	5
Stepen realizacije broja projekata.....	5
Analiza strukture izvora finansiranja.....	7
Opis i status projekata.....	9
Godišnji izvještaj sprovođenja projekata.....	26
Finansijski izvještaj	49
Zaključak	62

Uvod

Zakonski osnov za izradu Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana opštine Bar (2020-2025.) za 2020. godinu, sadržan je u članu 11 stav 3 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, broj 20/11, 26/11, 20/15, 47/19), koji definiše obavezu jedinica lokalne samouprave da pripreme i dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana.

Predmet ovog izvještaja su podaci o statusu realizacije projekata koji su bili propisani Godišnjim akcionim planom za 2020.godinu, a koji su u funkciji sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 (u daljem tekstu Strateški plan). Svi u njemu navedeni podaci dobijeni su od strane institucija koje su nosioci projekta, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata, na osnovu službene korespondencije sa Sekretarijatom za razvoj.

U cilju praćenja i kontrole sprovođenja Strateškog plana, kao i procjene efekata koji se postižu realizacijom njime predviđenih projekata, lokalna uprava je uspostavila sistem monitoring zasnovan na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno i to u dijelu procesnih indikatora (faza u kojoj se nalazi realizacija projekta), finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku) i indikatora efikasnosti (prikupljanje podataka o učincima i efektima). Za taj proces, bila je zadužena Radna grupa, imenovana Rješenjem predsjednika Opštine br.01-018/21-156 od 28.01.2021.godine, u sastavu: Ćazim Alković, menadžer Opštine Bar, Suzana Crnovršanin, dipl.ing.arh, savjetnica u Službi predsjednika Opštine i Deda Đelović, dr mašinstva, AD "Luka Bar" (Prilog 1). Za koordinatorku Radne grupe imenovan je Igor Gojnić, sekretar Sekretarijata za razvoj.

Strateški okvir politike lokalnog razvoja

Strateški plan, koji je Skupština opštine Bar usvojila na sjednici održanoj 24.juna 2020.godine, predstavlja strateški okvir za vođenje politike lokalnog razvoja. Ovaj dokument usklađen je sa strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore i predstavlja preduslov za izradu drugih strateških dokumenata na lokalnom nivou.

Polazeći od toga da su ključni pravci razvoja crnogorske ekonomije pametan, održiv i inkluzivni rast, opština Bar je, u funkciji njihovog dostizanja, kao svoj strateški cilj definisala ***dinamičan i održiv privredni rast i razvoj, uz otvorenost za sve građane***. Ovako široko postavljen opšti strateški cilj predstavlja veliki izazov i stoga u njegovo ostvarenje mora biti uključena cjelokupna zajednica.

Dostizanje zacrtanog strateškog cilja ostvaruje se kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritarnih oblasti koje su najrelevantnije za ravnomjeran razvoj cijele opštine. U tom smislu, opšti cilj je operacionalizovan kroz četiri specifična strateška cilja sa prioritetima:

1. **UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE**, prioritarno na bazi uređenja obalnog područja i unapređenja postojećih, odnosno uvođenja novih turističkih proizvoda;

2. **ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE KROZ UNAPREĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA** (razvoj poljoprivrede, smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva, iskorišćenje potencijala Slobodne zone Luke Bar, razvoj saobraćajne infrastrukture, unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave);

3. ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, putem obezbjeđenja veće uključenosti ranjivih grupa, na bazi razvoja i promocije kulturne baštine i razvoja sportske infrastrukture;

4. UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR, uključujući kao prioritete razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sistema upravljanja otpadom i unapređenje energetske efikasnosti.

Polazeći od navedenog, implementacija Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025.g., odnosno Akcionog plana za 2020. godinu, fokusirana je na realizaciju prioriteta i mjera u ključnim oblastima razvoja, kroz projekte koji su mjerljivi, ostvarivi, jasno formulisani, međusobno usklađeni i usmjereni na ostvarenje strateškog cilja.

Metodologija izrade Izveštaja

Metodologija izrade predmetnog izvještaja bazira se na prikazu realizacije Godišnjeg akcionog plana (GAP) za implementaciju Strateškog plana za 2020. godinu, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16). U vezi sa tim, važno je naglasiti da je Godišnji akcioni plan za 2020. godinu pripremljen u saradnji lokalne samouprave sa organima državne uprave i ostalim partnerima koji participiraju u realizaciji planiranih projekata. (prilog 2). Akcioni plan je organizovan oko ključnih prioriteta iz oblasti sva četiri specifična strateška cilja i sadrži ukupno **30 projekata**. Za svaki pojedinačni projekat, pored njegovog naziva, navedeni su očekivani rezultati, period realizacije, nosioci aktivnosti, učesnici u implementaciji, troškovi realizacije specifikovani prema izvoru finansiranja, kao i indikatori i sredstva provjere.

Prema utvrđenoj metodologiji, predmetni izvještaj sačinjen je iz dva dijela - Godišnjeg izvještaja o sprovođenju projekata i Finansijskog izvještaja. Izvještaj obuhvata period od dana stupanja na snagu Strateškog plana do 31.marta 2021.godine.

Izvještaj je usmjeren na prikaz stepena napretka i ostvarenih rezultata projekata i aktivnosti koji su u funkciji ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta, pa je i strukturiran na takav način da omogućava uvid u projekte po ključnim prioritetima, odnosno specifičnim strateškim ciljevima. Svi inputi dobijeni su od strane institucija koje su nosioci projekata, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata i isti su integrisani u metodološki utvrđenu tabelarnu formu. Na osnovu dostavljenih podataka i uvida u realno ostvareno stanje, izvršena je adekvatna analiza učinaka.


Stepen realizacije ukupnih ulaganja

Za realizaciju razvojnih projekata utvrđenih Godišnjim akcionim planom za 2020.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **22.119.501,78€**. Prema raspoloživim podacima, realizovana ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog plana, za izvještajni period do 31.03.2021. godine, iznose **5.247.898,38 €**. U skladu sa tim, procenat realizacije Akcionog plana iz ugla ukupnih ulaganja iznosio bi **23,72%**. Ovdje je važno napomenuti da su u pitanju projekti u višegodišnjem trajanju za koje se dinamika isplate odvija u tranšama, prema dostavljenim izvođačkim situacijama i izvještajima o realizaciji projekta, što pretpostavlja da će se dio ulaganja kroz projekte u kontinuitetu nastaviti, pa se stoga i navedeni iznos od **22.119.501,78€** odnosi na ukupnu vrijednost projekata a period u kojem će se sprovoditi, a ne samo za 2020. godinu.

Ukupno planirana ulaganja	Ukupno realizovana ulaganja
22.119.501,78€	5.247.898,38 €
Procenat realizacije ulaganja do 31.03.2021.	
23,72%	

Stepen realizacije broja projekata

Godišnjim akcionim planom predviđena je realizacija 30 projekata od kojih je 10 u potpunosti realizovano, 18 je u fazi sprovođenja, a 2 projekta nijesu započeta. Za dva projekta, koja su uvrštena u Godišnji akcioni plan na bazi očekivane podrške spoljnog donatora, nijesu odobrena finansijska sredstva te iz tog razloga njihova realizacija nije ni započeta. Može se konstatovati da procenat sprovođenja Godišnjeg akcionog plana iznosi 93%.

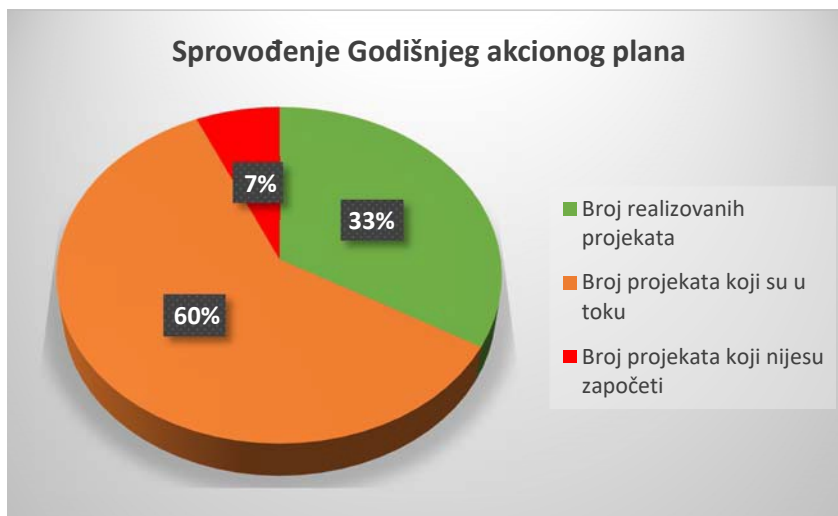

Radi preglednijeg uvida u status realizacije pojedinačnih projekata, prikazujemo ih u donjoj tabeli, gdje su zelenom bojom označeni realizovani projekti, žutom projekti koji su u različitim fazama sprovođenja, a crvenom projekti koji nijesu započeti:


	Naziv projekta
1.	REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE
2.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA
3.	IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE
4.	ZAVRŠETAK IZGRADNJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU KUĆE MASLINA U STAROM BARU
5.	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
6.	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR
7.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU
8.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU
9.	DEFINISANJE SETA PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTITORE U RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI
10	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA
11	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI
12	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
13	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
14	NADVOŽNJAK PREKO PRUGE BEOGRAD - BAR NA MJESTU PRUŽNOG PRELAZA BJELIŠI U BARU
15	UNAPRJEĐENJE SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE
16	OTVARANJE ODJELJENJA HISTOPATOLOGIJE SA OBDUKCIONOM SALOM I BOLNIČKOM ARHIVOM

17	POBOLJŠANJE JEDINICE ZA AKUTNI PRIJEM (PRIJEMNO-URGENTNOG BLOKA) SA OPERACIONOM (MALOM) SALOM ZA HITNE PROCEDURE
18	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)
19	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)
20	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)
21	IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
22	UMJETNIČKI ATELJEI U STAROM BARU – (OBJEKAT 85) - CREATIVE HUB
23	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)
24	RESTAURACIJA I KONZERVACIJA OTOMANSKOG GROBLJA I MESDŽIDA (OBJEKTI 150-153)
25	STUDIJA VODOSNABDJEVANJA OPŠTINE BAR
26	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA „ČAFE“
27	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
28	POSTAVLJANJE POLU-PODZEMNIH KONTEJNERA U GRADSKOM JEZGRU BARA
29	UREĐENJE JEDNOBRAZNIH KONTEJNERSKIH MJESTA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE BAR
30	„ZELENO OSTRVO“ – IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNOG SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE SPORTSKE DVORANE „TOPOLICA“ ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Analiza strukture izvora finansiranja

Slijedeći propisanu metodološku matricu, izvori finansiranja prikazani su kroz budžetski udio tri ključna subjekta- lokalne samouprave, države i ostalih aktera koji su prepozantni kao nosioci projektnih aktivnosti.

Shodno tome, u ukupnom ostvarenju Godišnjeg akcionog plana za 2020.godinu, koje iznosi **5.247.898,38 €**, učestvovali su Opština Bar, sa iznosom od **2.443.499,58**, odnosno 46,56%, zatim Vlada Crne Gore sa sredstvima iz kapitalnog budžeta u iznosu od **1.246.716,86 €**, odnosno 23,76 %, kao i drugi subjekti u ukupnom iznosu od **1.557.681,94 €**, odnosno 29,68%.

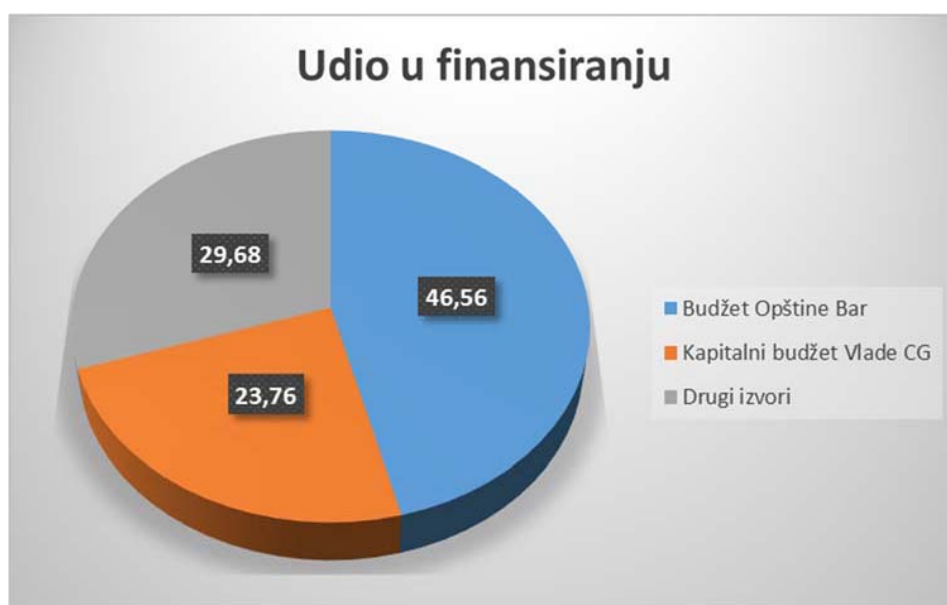

Distribucija finansijskog učešća drugih subjekata koji su participirali u ostvarenju Godišnjeg akcionog plana je sljedeća: Luka Bar sa iznosom od 997.802,76€ (64,06%), Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sa iznosom od 243.737,03 € (15,65%), EU preko sredstava pretprijetupne pomoći (IPA) u iznosu od 163.159,79€ (10,47%), Komunalne djelatnosti d.o.o. Bar sa iznosom od 69.141,04€ (4,44%), Ministarstvo kulture sa iznosom od 45.989,5€ (2,95%), Turistička organizacija Bar sa iznosom od 21.578,32 € (1,39%), JP "Kulturni centar" sa iznosom od 8.954,5 (0,57%), UNDP kroz donatorska sredstva u iznosu od 4.178,00€ (0,27%) i Bisnis Start-up centar sa sredstvima u iznosu od 3.141,00€ (0,20%). Udio svih navedenih subjekata prikazujemo i grafički:

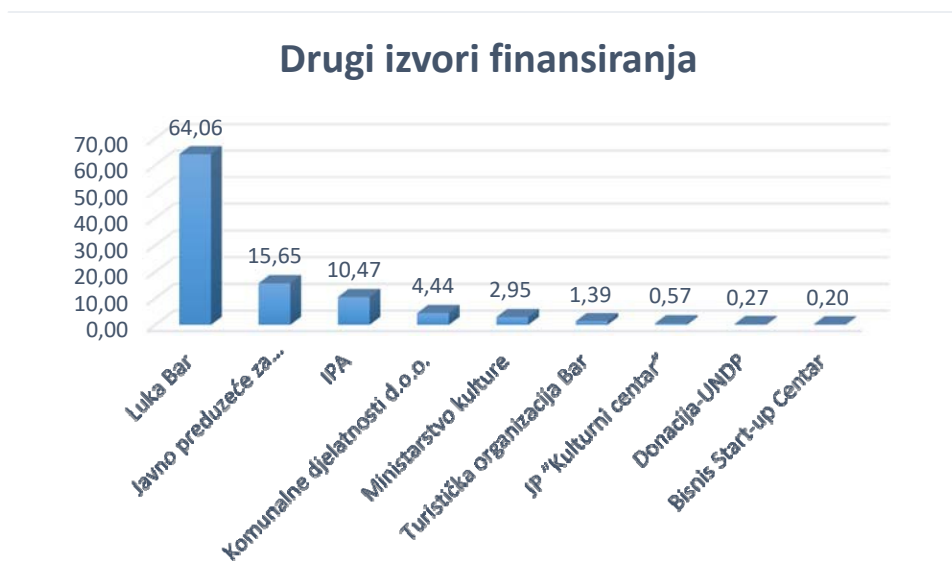

Opis i status projekata

Slijedi sažeti opis projekata sa osnovnim podacima o nosiocu i učesnicima u projektu, vrijednosti projekta i utrošku sredstava u izvještajnom periodu, planiranom trajanju projekta, indikatorima uspješnosti i statusu projekta.

Detaljne informacije o projektima date su dalje u tabelarnom prikazu, kao i finansijski dio izvještaja sa zaključkom.

Projekat br. 1

9.1.1.2. REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: JP "Morsko dobro" i Opština Bar

Učesnici u implementaciji: IGP "Fidija" kao izvođač i "Decom" doo iz Podgorice kao nadzor nad izvođenjem radova, izabrani putem tendera/javnog nadmetanja.

Ukupna vrijednost projekta: 965.925,21€,

Utrošeno u 2020.godini: 343.737,03 € (isplata dvije privremene situacije u navedenom iznosu)

Učešće Opštine Bar : 100.000 €.

Trajanje projekta: februar 2020. godine- jun 2021. godine.

Indikatori uspješnosti : Izvedeni radovi na ukupnoj površini od 4800m², u sklopu kojih je urađeno sledeće:

- položene cijevi za atmosfersku kanalizaciju;
- izrađeni vodovodni priključci od objekata na plaži do postojećeg distributivnog vodovoda;
- izrađen sistem za navodnjavanje sa hidrantima;
- postavljen sistem javne rasvjete;
- postavljeni betonski ramovi za tende,
- izvedeni ogradni zidovi, kao i telekomunikaciona kanalizacija;
- izvedeni radovi na popločavanju šetališta, saobraćajnice i trga.

Status realizacije: u toku

Projekat br. 2

9.1.2.1. DIGITALIZACIJA STAROG BARA - Projekat FORTITUDE (Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development)

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac

Učesnici u implementaciji: Multiprint (dobavljač), RestartIng (Izvođač radova), Dema (Nadzor), EDUCO centar (obuka), Zlatko Glamočak (autor taktilne mape u bronzi)

Izvor finansiranja: IPA II, program Interreg Hr-BiH-CG (85% budžeta)

Ukupna vrijednost projekta: 253.597,49€

Utrošeno u 2020.godini: 40.610,02 €

Učešće Opštine Bar : 6.091,51€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Nabavljena tri seta računara i prateća oprema za potrebe participanata u projektu ispred Opštine Bar
- Izrađeni konzervatorski projekti za zgradu Carinarnice i Ljetnju scenu u Starom gradu
- Nabavljen namještaj za zgradu Carinarnice, stolarija, bravarija i tehnička oprema
- Tri zaposlena u JP Kulturni centar u procesu pohađanja akreditovanog kursa engleskog jezika - EDUCO centar
- Započeta izrada taktilne reljefne mape Starog grada u bronzi
- Održana tri redovna projektna sastanka- Kick off, Kick off Konferencija, SCM – Bar

Status realizacije: u toku

Projekat br. 3

9.1.2.4. IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE

Nosilac projekta: Turistička organizacija Bar

Učesnici u projektu: Opština Bar

Učesnici u implementaciji: Institut za turizam iz Zagreba (izrada strategije)

Izvor finansiranja: Sredstva TO Bar

Ukupna vrijednost projekta: 70.000 €

Utrošeno u 2020.godini: 13.965 €

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Strategije
- Zaključen Ugovor sa Institutom za turizam iz Zagreba o javnoj nabavci usluga izrade Strategije, ukupne vrijednosti 53.240,00 eura
- Završene dvije faze u izradi Strategije: prva koja se odnosi na tržišnu i situacionu analizu, i druga koja se odnosi na izradu strateškog okvira

Status realizacije: u toku

Projekat br. 4

9.2.1.1. PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA **ECOVINEGOALS – ECO logical VINEyards GOVERNance Activities for Landscape's Strategies**

Nosilac projekta: BSC Bar

Učesnici u projektu: Opština Bar i osam partnerskih institucija iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije

Učesnici u implementaciji: BSC Bar, Opština Bar i osam partnerskih institucija iz Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije

Ukupna vrijednost projekta: 165.740€

Učešće Opštine Bar: 1.978,96€

Utrošeno u 2020.godini: 34.133,10€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

1. Izvršena analiza vinogradarsko-vinarskog područja Crmnice kroz anketiranje 30 vinogradara i vinara
Izvršen odabir zainteresovanih strana sa lokalnog i nacionalnog nivoa za učešće u projektu
Objavljena dva rada u naučnim časopisima i prezentovana na konferencijama
2. Usvojen Akcioni plan projekta
Održana dva online projektna sastanka
3. Letak i bilten o projektu prevedeni na crnogorski jezik i distribuirani zainteresovanim stranama
Kreirana Facebook stranica projekta ECOVINEGOALS
4. Izrađena dva projektna izvještaja

Status realizacije: u toku

Projekat br. 5

9.2.1.2. ZAVRŠETAK IZGRADNJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU KUĆE MASLINA U STAROM BARU

Nosilac projekta: Uprava javnih radova, Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja

Učesnici u projektu: Opština Bar

Učesnici u implementaciji: doo "Bombeton" Cetinje (izvođač radova), doo "Nik com" Nikšić (stručni nadzor)

Ukupna vrijednost projekta: 926.077,03€

Učešće Opštine Bar: Za potrebe izgradnje ovog objekta Opština Bar je ustupila zemljište ukupne površine 930m2 (katastarska parcela br. 1075/2 KO Stari Bar) i finansirala izradu geodetskih podloga za izradu glavnog projekta.

Utrošeno u 2020.godini: 926.077,03€

Trajanje projekta: 2019- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Izgrađen objekat Kuće maslina u skladu sa projektom tehničkom dokumentacijom

Status realizacije: realizovan*

*Građevinski radovi na objektu su završeni u skladu sa planiranim budžetom. U toku je postupanje resornog ministarstva u vezi sa definisanjem uslova upravljanja i osnivanja kao pravnog subjekta, kao i stavljanja objekta u funkciju.

Projekat br. 6

9.2.1.6. PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu:

Učesnici u implementaciji: Korisnici subvencija

Ukupna vrijednost projekta: 52.604,11€

Učešće Opštine Bar: 52.604,11€

Utrošeno u 2020.godini: 52.604,11€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Odobreno 90 subvencija

Zaključeni ugovori sa korisnicima subvencija

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 7

9.2.2.1. PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: /

Učesnici u implementaciji: Korisnici subvencija

Ukupna vrijednost projekta: 208.551,16€

Učešće Opštine Bar: 208.551,16€

Utrošeno u 2020.godini: 208.551,16€

(od toga:

- 89.500 € prenesena sredstva iz Budžeta za 2019.godinu koja su raspodijeljena u 2020. godini, shodno Odluci o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2019. godinu, br. 01/134 od 24.01.2020.

- 121.651,16€ sredstva opredijeljena Budžetom za 2020.godinu koja su raspodijeljena shodno Odluci o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2020.godinu, br.01-018/20-2115 od 07.08.2020.)

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

Podržano 40 biznis ideja

Zaključeni ugovori sa korisnicima sredstava

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 8

9.2.2.2. PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: /

Učesnici u implementaciji: Korisnice subvencija

Ukupna vrijednost projekta: 35.000€

Učešće Opštine Bar: 35.000€

Utrošeno u 2020.godini: 35.000€

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

Podržano 12 biznis ideja

Zaključeni ugovori sa korisnicama sredstava

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 9

9.2.3.1. DEFINISANJE SETA PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTITORE ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: AD Luka Bar

Učesnici u implementaciji: Investitori

Ukupna vrijednost projekta: /*

Učešće Opštine Bar: /*

Utrošeno u 2020.godini: /*

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

Izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijetim u 2020.godini, investitori koji ulažu u izgradnju objekata za proizvodnju, preradu i skladištenje oslobođeni su obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (član 239).

Status realizacije: realizovan

*Vrijednost projekta nema finansijske pokazatelje

Projekat br. 10

9.2.3.2. REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA

Nosilac projekta: AD Luka Bar

Učesnici u projektu: /

Učesnici u implementaciji: Saobraćajni institut CIP d.o.o. "Građevinski institut Makedonija" AD Skoplje (projektant); doo "VU-TI Inženjering" Bar (revident); „Aqua mont” doo Herceg Novi i „Aqua mont service” doo Split (izvođači radova); „Montepuť” doo Podgorica (stručni nadzor)

Ukupna vrijednost projekta: 3.400.000€

Učešće Opštine Bar: /

Utrošeno u 2020.godini: 997.802,76€

Trajanje projekta: 2020-2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Završen postupak izbora najpovoljnijeg izvođača radova I stručnog nadzora; Podnijeta prijava građenja nadležnom ministarstvu

Status realizacije: u toku

Projekat br. 11

9.2.3.3. IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI

Nosilac projekta: TCK “ Montenegro” doo

Učesnici u projektu: AD Luka Bar

Učesnici u implementaciji:

Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000€

Učešće Opštine Bar: /

Utrošeno u 2020.godini: /*

Trajanje projekta: 2020-2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Zaključen je Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni između “Luka Bar” AD i TCK “Montenegro” doo;
- Obezbijeđeni su urbanističko tehnički uslovi;
- Započeta je priprema projektne dokumentacije i u tu svrhu su sprovedena geomehanička istraživanja na lokaciji

Status realizacije: u toku

*Nema utrošenih sredstava jer je u toku faza projektovanja

Projekat br. 12

9.2.4.1. IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Opština Bar

Učesnici u implementaciji:

Ukupna vrijednost projekta: 2.440.000€,

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2022. godina

Indikatori uspješnosti :

Izrada tehničke dokumentacije u toku

Status realizacije: u toku

Projekat br. 13

9.2.4.2. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: Opština Bar

Učesnici u implementaciji: DOO "Put Inženjering" Podgorica (projektant), doo "Kov Atelje" Nikšić (revident)

Ukupna vrijednost projekta: 820.000€,

Utrošeno u 2020.godini: 18.697,80€

Učešće Opštine Bar : 18.697,80€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Izrađen revidovani glavni projekat

Status realizacije: u toku

Projekat br. 14

9.2.4.4. NADVOŽNJAK PREKO PRUGE BEOGRAD-BAR NA MJESTU PRUŽNOG PRELAZA BJELIŠI

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: /

Učesnici u implementaciji: "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" Podgorica (projektant i stručni nadzor), " doo " 7 Ing" Podgorica (revident), doo "Putevi Bar" (izvođač radova), izabrani putem tendera/javnog nadmetanja.

Ukupna vrijednost projekta: 1.853.346,74€

Utrošeno u 2020.godini: 1.655.511,90€

Učešće Opštine Bar : 1.655.511,90€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Izgrađen nadvožnjak preko pruge Beograd-Bar na mjestu pružnog prelaza Bjeliši

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 15

9.2.4.14. UNAPRJEĐENJE SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: TO Bar

Učesnici u implementaciji:

Ukupna vrijednost projekta: 52.551,24€

Utrošeno u 2020.godini: 52.551,24€

Učešće Opštine Bar : 44.937,92€

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

Na više lokacija u okviru gradskog i prigradskog područja postavljena nova i obnovljena postojeća horizontalna i vertikalna signalizacija i oprema.

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 16

9.3.1.3. OTVARANJE ODJELJENJA HISTOPATOLOGIJE SA OBDUKCIONOM SALOM I BOLNIČKOM ARHIVOM

Nosilac projekta: JZU Opšta bolnica " Blažo Orlandić" (OB Bar)

Učesnici u projektu:

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Ministarstvo zdravlja Bugarske

Ukupna vrijednost projekta: 178.374,05€

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Projekat nije odobren

Status realizacije: nije realizovan

Projekat br. 17

9.3.1.4. POBOLJŠANJE JEDINICE ZA AKUTNI PRIJEM (PRIJEMNO-URGENTNOG BLOKA) SA OPERACIONOM (MALOM) SALOM ZA HITNE PROCEDURE

Nosilac projekta: JZU Opšta bolnica “ Blažo Orlandić” (OB Bar)

Učesnici u projektu:

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Vlada Japana

Ukupna vrijednost projekta: 1.946.000€

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

Projekat nije odobren

Status realizacije: nije realizovan

Projekat br. 18

9.3.1.7. PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)

Nosilac projekta: Zavod za javno zdravstvo Zadar

Učesnici u projektu: Opća bolnica Zadar, Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica " Blažo Orlandić" (OB Bar), Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke

Izvor finansiranja: Program Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv, a sufinansiran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 854.585,50€

Utrošeno u 2020.godini: 5.132,07€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021 godina

Indikatori uspješnosti :

- Izvršena optimizacija projekta
- Zaključen Ugovor o kofinansiranju između Upravljačkog tijela i vodećeg partnera
- Zaključen partnerski sporazum između vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera
- Održana online početna konferencija ON TIME

Status realizacije: u toku

Projekat br. 19

9.3.1.8. POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)

Nosilac projekta: Opća bolnica Zadar

Učesnici u projektu: JZU Opšta bolnica " Blažo Orlandić" (OB Bar), Zavod za javno zdravstvo Zadar I Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi I prognanih hercegbosanske županije

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Program Interreg IPA Program prekogranične saradnje

Ukupna vrijednost projekta: 999.050,20€

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izvršena optimizacija projekta
- Zaključen ugovor o kofinansiranju između Upravljačkog tijela i vodećeg partnera
- Održana početna (Kick Off) konferencija

- Pokrenut postupak izrade Glavnog projekta PTS sistema (tzv. vazdušne pošte) i povećanje inicijalne linije sa 3 na 8

Status realizacije: u toku

Projekat br. 20

9.3.1.9. DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE- BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY-BAR)

Nosilac projekta: Opština Bar, Caritas

Učesnici u projektu:

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Program Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv, a sufinansiran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 188.428,07€

Utrošeno u 2020.godini: 94.496,07€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspjehnosti :

- Opremljen je i stavljen u funkciju Dnevni boravak u okviru Caritasovog centra
- 30 korisnika je obuhvaćeno uslugama Dnevnog boravka
- Sačinjen je i distribuiran informativni letak o projektu
- Pokrenut je postupak za izdavanje licence od strane resornog ministarstva Caritasu, kao pružaocu ove socijalne usluge

Status realizacije: u toku

Projekat br. 21

9.3.2.1. IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Nosilac projekta: Vlada Crne Gore

Učesnici u projektu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Opština Bar

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Državni budžet, budžet JLS, donacija IPA II

Ukupna vrijednost projekta: 399.666,50€

Utrošeno u 2020.godini: 10.384,60€

Učešće Opštine Bar : 10.384,60€

Trajanje projekta: 2020 - 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Izabrana su idejna rješenja u formi prve druge i treće nagrade i dva otkupa idejnih rješenja U galeriji Kulturnog centra organizovana je izložba svih radova pristiglih na konkurs.

Status realizacije: u toku

Projekat br. 22

9.3.3.3. UMJETNIČKI ATELJEI U STAROM BARU (OBJEKAT 85) – CREATIVE HUB

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: Opština Bar, JP Kulturni centar Bar

Učesnici u implementaciji: doo "Euromont stil" (izvođač radova)

Izvor finansiranja: Državni budžet

Ukupna vrijednost projekta: 281.630,83€

Utrošeno u 2020.godini: 256.630,83€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji Palate-Objekta br. 85 za potrebe uspostavljanja "Creative Hub"-a
- Izvedeni radovi na adaptaciji objekta Palata-Objekat br.85 za potrebe uspostavljanja „CREATIVE HUB“-a Bar; Izvršeni restauratorsko-konzervatorski radovi na objektu
- Adaptiran i opremljen prostor ukupne površine 200 m² i isti priveden namjeni
- Uspostavljen Creative Hub

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 23

9.3.3.4. ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA - ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: Opština Bar, JP Kulturni centar Bar

Učesnici u implementaciji: DOO " Bombeton" Cetinje(izvođač radova)

Izvor finansiranja: Državni budžet, budžet JLS

Ukupna vrijednost projekta: 256.630,83€

Utrošeno u 2020.godini: 31.702,00€

Učešće Opštine Bar : 20.000€

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izvršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu (rekonstrukcija krova i otvora na istočnoj fasadi)
- Izrađen projekat enterijera
- Izvršen izbor izvođača radova na poslovima uređenja enterijera

Status realizacije: u toku

Projekat br. 24

9.3.3.7. RESTAURACIJA I KONZERVACIJA OTOMANSKOG GROBLJA I MESDŽIDA (OBJEKTI 150-153)

Nosilac projekta: Ministarstvo kulture

Učesnici u projektu: Opština Bar, JP Kulturni centar Bar

Učesnici u implementaciji: Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Izvor finansiranja: Državni budžet, drugi izvori

Ukupna vrijednost projekta: 100.000€

Utrošeno u 2020.godini: 18.242€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020- 2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Restauracija velikog potpornog zida sa zapadne strane grobljanskog platoa do visine od oko 4 metra
- Restauracija južnih zidova objekta 148, 149 radi sprečavanja eventualnog obrušavanja
- Restauracija sjevernoistočnog zida „Svratišta za putnike“/mesdžida (153)
- Restauracija mihraba i mimbera
- Restauracija postojećih zidanih grobnica

Status realizacije: u toku

Projekat br. 25

9.4.1.14. IZRADA STUDIJE VODOSNABDIJEVANJA OPŠTINE BAR

Nosilac projekta: Uprava javnih radova

Učesnici u projektu: Opština Bar, doo "Vodovod i kanalizacija" Bar

Učesnici u implementaciji: doo "E3 Consulting" Podgorica (obrađivač studije)

Izvor finansiranja: Državni budžet

Ukupna vrijednost projekta: 64.009€

Utrošeno u 2020.godini: 64.009€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspjehnosti :

- Izrađena Studija vodosnabdijevanja opštine Bar
- Studija je predata na implementaciju d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Bar,
- Sprovedena je obuka zaposlenih u d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" za korišćenje hidrauličkog modela.

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 26

9.4.2.1. SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "ČAFE"

Nosilac projekta: Vlada Crne Gore

Učesnici u projektu: Uprava javnih radova, Opština Bar

Učesnici u implementaciji:

Izvor finansiranja: Državni budžet, IPA fond

Ukupna vrijednost projekta: /

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020-2021. godina

Indikatori uspješnosti :

Projektni zadatak za raspisivanje javnog nadmetanja po principu "projektuj i izgradi"

Status realizacije: u toku**

** Sredstva za realizaciju ovog projekta bila su obezbijeđena iz IPA fondova i državnog budžeta, ali zbog prekida u njegovom izvođenju i spora koji je u toku, nijesu dobijeni podaci o utrošenim sredstvima, odnosno dugovanjima i potraživanjima.*

*** Dalja realizacija ovog projekta je neizvjesna, jer ista zavisi od ishoda sudskog spora i raspoloživih sredstava iz državnog budžeta.*

Projekat br. 27

9.4.2.2. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Izvor finansiranja: Budžet JLS

Ukupna vrijednost projekta: 80.000€

Utrošeno u 2020.godini: 3.250€

Učešće Opštine Bar : 3.250€

Trajanje projekta: 2020-2021. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izrađeno Idejno rješenje Reciklažnog centra
- Data saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje

Status realizacije: u toku

Projekat br. 28

9.4.2.7. POSTAVLJANJE POLU-PODZEMNIH KONTEJNERA U GRADSKOM JEZGRU BARA I NABAVKA SPECIJALIZOVANIH VOZILA

Nosilac projekta: Opština Bar

Učesnici u projektu: doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Izvor finansiranja: Budžet JLS, sredstva doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Ukupna vrijednost projekta: 355.632,66€

Utrošeno u 2020.godini: 335.638,62€

Učešće Opštine Bar : 286.491,62€

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

- Nabavljeno i ugrađeno 19 polupodzemnih kontejnera od 5 m3,
- Nabavljen i ugrađen jedan polupodzemni kontejner od 5 m3 za odvojeno sakupljanje otpada,
- Nabavljeno specijalno vozilo za pražnjenje i odvoz otpada iz polupodzemnih kontejnera

Status realizacije: realizovan

Projekat br. 29

9.4.2.8. UREĐENJE JEDNOOBRAZNIH KONTEJNERSKIH MJESTA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE BAR

Nosilac projekta: doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Učesnici u projektu: Opština Bar

Izvor finansiranja: sredstva doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Ukupna vrijednost projekta: 20.000€

Utrošeno u 2020.godini: /

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

- Uređeno 20 lokacija sa polupodzemnim kontejnerima

Status realizacije: u toku

Projekat br. 30

9.4.3.1. „ZELENO OSTRVO“ – IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNOG SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE SPORTSKE DVORANE „TOPOLICA“ ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Nosilac projekta: doo "SC Topolica" Bar

Učesnici u projektu: Opština Bar, UNDP

Izvor finansiranja: sredstva doo "Komunalne djelatnosti" Bar

Ukupna vrijednost projekta: 400.000€

Utrošeno u 2020.godini: 4.178€

Učešće Opštine Bar : /

Trajanje projekta: 2020. godina

Indikatori uspješnosti :

- Izrađena tehnička dokumentacija

Status realizacije: u toku

Godišnji izvještaj sprovođenja projekata

Specifični strateški cilj 1: Unapređenje turističke ponude opštine Bar

Prioritet 1: Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.1.2.	REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE	<p>1. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I sa istim zaključen Ugovor</p> <p>2. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora i sa istim zaključen Ugovor</p> <p>3. Započeto izvođenje radova</p> <p>4. Izvedeni radovi na ukupnoj površini od 4800m² u sklopu kojih je urađeno sledeće: - položene cijevi za atmosfersku kanalizaciju; - izrađeni vodovodni priključci od objekata na plaži do postojećeg distributivnog vodovoda; - izrađen sistem za navodnjavanje sa hidrantima; - postavljen sistem javne rasvjete; - postavljeni betonski ramovi za tende, - izvedeni ogradni zidovi, kao i telekomunikaciona kanalizacija; - izvedeni radovi na popločavanju šetališta, saobraćajnice i trga.</p>	<p>1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-3182 od 12.05.2020.g. i Ugovor br. 01-334/20-4063 od 08.06.2020.g.</p> <p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-1566 od 06.03.2020.g. i Ugovor o javnoj nabavci br. 01-334/20-2501 od 15.04.2020.g.</p> <p>3. Saopštenje Vlade CG</p> <p>4. Plaćena prva privremena situacija</p> <p>Plaćena druga privremena situacija</p> <p>Dostavljena treća privremena situacija za plaćanje</p> <p>Izveštaj o prijemu radova</p>	<p>1. februar-jun 2020</p> <p>2. mart-april 2020.</p> <p>3. avgust 2020.g.</p> <p>4. decembar 2020.g.- mart 2021.g.</p>	<p>1. Uprava javnih radova</p> <p>2. Uprava javnih radova</p> <p>4. IGP "Fidija" d.o.o. Podgorica</p>	<p>1. IGP "Fidija" d.o.o. Podgorica</p> <p>2. "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica</p>	<p>1. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 968.383,36€ sa PDV-om</p> <p>2. Ugovorena cijena vršenja usluge stručnog nadzora iznosila je 26.299,35€ sa PDV-om</p> <p>4. Radovi su izvođeni na kvalitetan način, zadovoljavajućom dinamikom, a konačan završetak istih očekuje se do kraja juna 2021. godine. Kvalitetno uređenje centralnog dijela Sutomora već doprinosi pozitivnim efektima kada je u pitanju turistički imidž ovog mjesta. U narednom periodu očekuje se pokretanje procedure za realizaciju ostalih faza ovog projekta.</p>

Prioritet 2. Unapređenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA - Projekat FORTITUDE Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development	1. Nabavljena tri seta računara i prateća oprema za potrebe participanata u projektu ispred Opštine Bar 2. Izrađeni konzervatorski projekti za zgradu Carinarnice i Ljetnju scenu u Starom gradu. Nabavljen namještaj za zgradu Carinarnice, stolarija, bravarija i tehnička oprema. 3. Tri zaposlena u JP Kulturni centar u procesu pohađanja akreditovanog kursa engleskog jezika - EDUCO centar 4. Započeta izrada taktilne reljefne mape Starog grada u bronzi 5. Održana tri redovna projektna sastanka- Kick off, Kick off Konferencija, SCM - Bar 6. Izrađena dva projektna izvještaja	1. tender br. 355-1, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju PDV-a, izvod iz banke 2. tender br. 355-2, ugovor, račun, potvrda o oslobađanju od PDV-a, izvod iz banke, odobrenje UZKD na konzervatorske projekte za oba objekta, ugovor sa nadzorom, fotografije namještaja i tehničke opreme za Carinarnicu 3. tender 355-3, ugovor, interim report 4. tender 355-4, ugovor, račun, izvod iz banke 5. agende, zapisnici, fotografije 6. FLC sertifikati	1. 13.05.-10.07. 2020 2. 12.06.2020-15.06.2021 3. 10.11.2020 – 16.06.2021 4. 13.11.2020 – 20.06.2021 5. 15.05.2020. 16.07.2020. 25.11.2020	Opština Bar	1. dobavljač Multiprint 2. Izvođač radova: RestartIng; Nadzor: Dema Saglasnost: Uprava za zaštitu kulturnih dobara 3. Obuke sprovodi EDUCO centar 4. autor Zlatko Glamočak 5. Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac i Opština Bar 6. Ministarstvo finansija CFCU	Projekat se realizuje planiranom dinamikom, pri čemu su određene aktivnosti prilagođene epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom COVID-19 (sastanci se održavaju online).

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioци aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta	
9.1.2.4.	<p>IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE</p>	<p>1. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Strategije</p> <p>2. Zaključen Ugovor sa Institutom za turizam iz Zagreba o javnoj nabavci usluga izrade Strategije, ukupne vrijednosti 53.240,00 eura</p> <p>3. Završene dvije faze u izradi Strategije: prva koja se odnosi na tržišnu i situacionu analizu, i druga koja se odnosi na izradu strateškog okvira</p>	<p>1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke br. 16, od 14.01.2019.g.</p> <p>2. Ugovor br. 69 od 29.01.2020.g.</p> <p>Anex Ugovora br. 69/1 od 10.08.2020. godine</p> <p>3. Izvještaji Komisije za praćenje realizacije projekta</p>	2019 - 2021	Turistička organizacija Bar	<p>1. Institut za turizam iz Zagreba</p> <p>Subjekti lokalne turističke privrede</p> <p>Institucije iz oblasti turizma na lokalnom i nacionalnom nivou</p>	<p>Na realizaciju ovog projekta negativno je uticala pandemija COVID 19, pa je anexom Ugovora rok za završetak izrade Strategije produžen sa prvobitnih 8 na 17 mjeseci od dana zaključenja Ugovora. U skladu sa tim, rok za završetak ovog projekta je jun 2021.g. Na realizaciji preostale dvije faze Strategije, koje se tiču izrade strateških ciljeva i smjernica razvoja turizma, kao i izrade Akcionog plana, aktivno se radi, tako da će opština Bar dobiti ovaj važan strateški dokument u utvrđenom roku.</p>

		<p>2. Izvršen izbor stručnog nadzora i sa istim zaključen Ugovor</p> <p>3. Započeti radovi na izgradnji objekta</p> <p>4. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje poslova tehničkog pregleda izvedenih radova i obavljen tehnički pregled</p> <p>5. Izgrađen objekat Kuće maslina u skladu sa projektom tehničkom dokumentacijom</p>	<p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-6577/1 od 04.09.2019.g. Ugovor br.01-7773/1 od 10.10.2019.</p> <p>3. oktobar 2019.g.</p> <p>4. Ugovor br.01-334/20-10523/1 od 07.12.2020. Izvještaj o tehničkom pregledu</p> <p>5. Uvid u izvedeno stanje</p>			<p>2. "Nik com" d.o.o. Nikšić</p> <p>3. "Bombeton" d.o.o. Cetinje</p> <p>4. "Monteput" d.o.o. Podgorica</p>	<p>2. Vrijednost ugovorenih poslova stručnog nadzora, sa uračunatim PDV-om, iznosila je 49.600,00 €.</p> <p>4. Vrijednost ugovorenih poslova tehničkog pregleda, sa uračunatim PDV-om, iznosila je 2.400,00€.</p> <p>5. Građevinski radovi na objektu su završeni. U toku je postupanje resornog ministarstva u vezi sa definisanjem uslova upravljanja i osnivanja kao pravnog subjekta, kao i stavljanja objekta u funkciju.</p>
9.2.1.6	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	<p>1. Odobreno 90 subvencija lokalnim poljoprivrednim proizvođačima</p> <p>2. Zaključeni ugovori sa korisnicima sredstava</p> <p>3. Izvršena uplata sredstava</p> <p>4. Monitoring podržanih poljoprivrednika</p>	<p>1. Rješenja o odobravanju podnijetih zahtjeva</p> <p>2. Ugovori</p> <p>3. Dokazi o izvršenim uplatama</p> <p>4. Izvještaji korisnika sredstava, Izvještaj o radu Sekretarijata za privredu u sklopu Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2020.g.</p>	2020-2021	Opština Bar	Sekretarijat za privredu	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 52.604,11€ izvršena je na osnovu objavljenih Javnih poziva, u skladu sa Odlukom o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede ("Službeni list CG-opštinski propisi, br.046/16 I 018/19).

Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.2.1.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	1.Odobrena sredstva za ukupno 40 biznis ideja 2.Zaključeni ugovori sa korisnicima sredstava 3.Izvršena uplata sredstava 4.Monitoring realizacije podržanih biznis planova	1.Odluke o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2019.g. (br. 01-134 od 24.01.2020.) i za 2020.g. (br.01-018/20-2115 od 07.08.2020.g). 2. Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava 3. Potvrde o uplati 4.Finansijski i narativni izvještaji korisnika opštinskih sredstava Izvještaji Komisije	2020-2021	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava Bisnis start-up Centar, Bar Podnosioci biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 208.551,16€ izvršena je na osnovu objavljenih Javnih poziva, u skladu sa Programom podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar za period 2019. do 2022.godine ("Službeni list CG-opštinski propisi, br. 44/19). Monitoring sprovođenja podržanih biznis ideja i namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava vrši se u kontinuitetu.
9.2.2.2.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	Podržano ukupno 12 biznis ideja kroz dva objavljena Javna konkursa	-Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (br.01-018/20-1977 od 24.07.2020 i br.01-018/20-3523 od 23.12.2020) - Ugovori sa korisnicima opštinskih sredstava -Dokazi o izvršenoj uplati -Finansijski i narativni izvještaji korisnica sredstava -Izvještaji Komisije	2020-2021	Opština Bar	Komisija za raspodjelu sredstava Podnositeljke biznis planova	Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 34.600,00€ izvršena je na osnovu objavljenih Javnih konkursa, u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Službeni list CG-opštinski propisi, br. 44/19). Realizacija podržanih biznis planova je u toku, a rok za podnošenje finalnih izvještaja je godinu dana od dana potpisivanja ugovora, što znači do 18.08.2021. godine za projekte podržane na prvom Konkursu, odnosno do 30.12.2021. za projekte podržane po osnovu drugog Konkursa.

Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala slobodne zone "Luka Bar"

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.3.1	DEFINISANJE SETA PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTITORE U RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI	Definisan je set podsticajnih mjera i isti je implementiran kao zakonsko rješenje po kojem su investitori u razvoj djelatnosti u slobodnoj zoni oslobođeni plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	Broj sklopljenih ugovora o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni – upoređenje prije i nakon uvođenja podsticajnih mjera -Godišnji izvještaj o radu Slobodne zone Luka Bar	2020.-	Luka Bar AD	Opština Bar	Izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijetim u 2020.g., investitori koji ulažu u izgradnju objekata za proizvodnju, preradu i skladištenje oslobođeni su obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (član 239).
9.2.3.2	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALJE VOLUJICA	1. Kompletirana projektna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 2. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i sa istim zaključen Ugovor 3. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova I sa istim zaključen Ugovor o javnoj nabavci 4. Podnesena Prijava građenja Građevinsko-urbanističkoj inspekciji	1. Uvid u projektnu dokumentaciju 2. Odluka br. OD/207-8 od 25.08.2020.g. i Ugovor br. 4538 od 25.08.2020.g.. 3. Odluka br. 6738 od 27.11.2020.g i Ugovor br. 7338/1 od 23.12.2020.g 4. Prijava gradnje	1. 2018-2020 2. avgust 2020.g 3. novembar/decembar 2020.g. 4. decembar 2020.g.	Luka Bar AD	1. Saobraćajni institut CIP d.o.o. "Građevinski institut Makedonija" AD - Skoplje, 2019.g.; revident: "VU-TI Inžejering"- Bar 2. „Aqua mont”doo – Herceg Novi i „Aqua mont service” doo – Split 3. „Montepuť” doo-Podgorica	Početak izvođenja radova je bio planiran za početak novembra 2020.g., ali je planirana dinamika izmijenjena zbog ponavljanja postupka izbora vršioca stručnog nadzora, iz razloga formalno-pravne prirode.
9.2.3.3	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI	1. Sklopljen Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni između "Luka Bar" AD I "TCK Montenegro" doo; 2. Obezbijeđeni urbanističko tehnički uslovi	1. Ugovor o obavljanju djelatnost u Slobodnoj zoni br.2844 od 07.06.2019.g. 2. Urbanističko -tehnički uslovi br.1063-324/2, izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Potvrda	1. decembar 2018.g. – jun 2019.g. 2. jun – avgust 2019.g.	"TCK Montenegro" DOO	"Luka Bar" AD	"Luka Bar" AD je, shodno Ugovoru o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni dala u dugoročni zakup dio k.p.6501/1, KO Novi Bar, površine 392 m, ² radi izgradnje Terminala za skladištenje i rukovanje rasutim cementom i ostalim cementnim proizvodima (uključujući i građenje silosa za rasuti cement i ostale cementne proizvode).

		<p>3. Započela je priprema projektne dokumentacije i u tu svrhu su sprovedena geomehanička istraživanja na lokaciji</p>	<p>Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom br. 0207-3035/4 od 22.08.2019.g.;</p> <p>3. Pisana komunikacija između "Luka Bar" AD i "TCK Montenegro" doo;</p>	<p>3. jun 2019.g. – 31.12.2020.g</p>			<p>Dinamika realizacije projekta je značajno usporena zbog COVID 19 krize.</p>
--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--

Prioritet 4. Razvoj saobraćajne infrastrukture

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.2.4.1.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM	Započet je postupak projektovanja	-Uvid u idejno rješenje	2019-2022	-Ministarstvo kapitalnih investicija - Uprava javnih radova		Izrađeno je idejno rješenje koje je prezentirano resornom Ministarstvu. Dalji koraci u pravcu realizacije ovog projekta zavisice od opredjeljenosti budžetskih sredstava za njegovo sprovođenje.

9.2.4.2.	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM	<p>1. Izrađena revidovana projektno tehnička dokumentacija</p> <p>2. Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Odabran najpovoljniji izvođač radova i zaključen Ugovor sa njim.</p> <p>3. Sprovedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg izvođača za vršenje stručnog nadzora. Odabran stručni nadzor i potpisan ugovor sa njim.</p>	<p>1. Uvid u glavni projekat Obavještenja o ishodu odgovarajućih postupaka javnih nabavki</p> <p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/20-1410 od 28.02.2020.g.</p> <p>Ugovor br. 01-334/20-2228/1 od 01.04.2020. g.</p> <p>3. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova br. 01-426/20-2308 od 06.04.2020.</p> <p>Ugovor br. 01-334/20-2896 od 04.05.2020. g.</p>	2019-2021	<p>1. Opština Bar</p> <p>2.i 3. Uprava javnih radova</p>	<p>1. doo "Put inženjering" Podgorica</p> <p>doo "Kov Atelje" Nikšić.</p> <p>2. "Putevi Bar" d.o.o, Bar</p> <p>3. "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D., Podgorica</p>	<p>1. Shodno zaključenom Sporazumu Vlade Crne Gore I Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla-Zogaj, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat je urađen od strane doo "Put inženjering" Podgorica, a revidovan od strane doo "Kov Atelje" Nikšić. Takođe, Opština Bar je ispunila obavezu izrade geodetskih podloga i plana parcelacije. Ukupni troškovi Opštine po ovom osnovu iznosili su 18.697,80 €, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 690.226,70€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>3. Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi 14.400,00 €, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>U toku je postupak dobijanja građevinske dozvole za izgradnju ove saobraćajnice, nakon čega se može očekivati početak izvođenja pripremnih radova i realizacija ostalih ugovorenih poslova.</p>
----------	---	--	--	-----------	--	--	---

9.2.4.4.	NADVOŽNJAK PREKO PRUGE BEOGRAD - BAR NA MJESTU PRUŽNOG PRELAZA BJELIŠI U BARU	<p>1. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadvožnjaka u Bjelišima I sa istim zaključen Ugovor</p> <p>2. Izvršen izbor izvođača radova i isti uveden u posao</p> <p>3. Izrađen Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu</p> <p>4. Izvršena geodetska mjerenja i izrađen Elaborat uslovne parcelacije</p> <p>5. Izvedeni radovi na izmještanju NN voda</p> <p>6. Ugovoreno izvođenje dodatnih radova</p>	<p>1. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, br. 04-460119-2978/2 od 25.12.2019. g. Ugovor za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadvožnjaka 01-4057 od 27.12.2019</p> <p>2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-3850/1 od 16.12.2019.g. Ugovor za izgradnju nadvožnjaka u bjelišima (produžetak buleva revolucije) 01-4068 od 27.12.2019</p> <p>3. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/20-1153 od 13.05.2020.g.</p> <p>4. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/20-1251 od 26.05.2020. g.</p> <p>5. Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04-426/20-1660/2 od 17.07.2020.g.</p> <p>6. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.</p>	2020.- 2021.	Opština Bar	<p>1. "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" AD, Podgorica</p> <p>2. IGP "Fidija", D.O.O., Podgorica</p> <p>3. "MMK Control" d.o.o., Bar</p> <p>4. "Ekvidistanca" d.o.o., Bar</p> <p>5. "MAGELing" d.o.o., Bar</p> <p>6. IGP "Fidija", D.O.O., Podgorica</p>	<p>1. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosila je 14.883,00 €, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 1.558,587,24 €, sa uračunatim PDV-om.¹</p> <p>3. Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosila je 1.694,00€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>4. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosila je 181,50 €, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>5. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 3.810,00€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>6. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 119.745,50 €, sa uračunatim PDV-om.</p>
----------	---	---	---	--------------	-------------	--	---

¹ U cilju stvaranja uslova za realizaciju ovog projekta, u periodu prije 2020.godine sprovedene su sljedeće radnje:

- Izrađeno idejno rješenje i glavni projekat.

Idejno rješenje i glavni projekat uradilo je "Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" iz Podgorice, kao najpovoljniji ponuđač u sprovedenim tenderskim postupcima. Shodno Ugovoru o izradi idejnog projekta, br.01-3440 od 27.11.2017, vrijednost ugovorenih usluga iznosila je **14.280,00€** sa PDV-om, a shodno Ugovoru o izradi glavnog projekta br.01-3448 od 22.11.2017.g., vrijednost ugovorenih usluga iznosila je **14.280,00€**, sa uračunatim PDV-om.

-Izvršena revizija Glavnog projekta

Reviziju Glavnog projekta izvršio je najpovoljniji ponuđač "Sedam-Ing" d.o.o. iz Podgorice, shodno Ugovoru br.01-2596 od 09.09.2019.g., a vrijednost ugovorene usluge iznosila je **6.050,00€**, sa uračunatim PDV-om.

			01-018/21-105/1 od 22.01.2021.g. Ugovor za izvođenje dodatnih radova na izgradnji nadvožnjaka 01-018/21-125 od 25.01.2021.g.				Projekat je u završnoj fazi. Uslovi za korišćenje nadvožnjaka stvoriće se nakon izgradnje kružnog toka i saobraćajnice koja ga povezuje sa Bulevarom revolucije.
9.2.4.15.	UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	Na više lokacija u okviru gradskog i prigradskog područja postavljena je nova i obnovljena postojeća horizontalna i vertikalna signalizacija i oprema	Ovjerene fakture o izvršenim radovima Izveštaj o radu Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije	2020.- 2021.	-Opština Bar -TO Bar	1. "Korita Sig" d.o.o., Podgorica 2."SBCC" d.o.o., Cetinje 3. "Fircik" d.o.o., Podgorica 4."S&N Invest" d.o.o., Podgorica	Ovo je projekat koji će se u kontinuitetu sprovoditi i čijom realizacijom će se konstantno unapređivati informisanost građana i turista,kao i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Zbog pojave pandemije COVID 19 rok za završetak izrade turističke signalizacije na teritoriji opštine Bar (uži dio grada) je produžen.

Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar

Prioritet 1. Unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.1.3.	OTVARANJE ODJELJENJA HISTOPATOLOGIJE SA OBDUKCIONOM SALOM I BOLNIČKOM ARHIVOM						JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar aplicirala je sa ovim projektnim predlogom na poziv koji je bio otvoren u sklopu zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske. Kako prijedlog projekta nije prošao u postupku evaluacije, odnosno kako za njegovo sprovođenje nijesu odobrena tražena sredstva, može se konstatovati da isti nije pokrenut.
9.3.1.4.	POBOLJŠANJE JEDINICE ZA AKUTNI PRIJEM (PRIJEMNO-URGENTNOG BLOKA) SA OPERACIONOM (MALOM) SALOM ZA HITNE PROCEDURE						JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar aplicirala je sa navedenim projektnim prijedlogom na poziv koji je bio raspisan od strane Vlade Japana u okviru bilateralne saradnje za Japansku fiskalnu godinu 2020. (od 01.04.2020 do 31.03.2021). Kako prijedlog projekta nije prošao u postupku evaluacije, odnosno kako za njegovo sprovođenje nijesu odobrena tražena sredstva, može se konstatovati da isti nije pokrenut.
9.3.1.7.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)	1. Izvršena optimizacija projekta 2. Zaključen Ugovor o kofinansiranju između MA (Management Authority)-upravljačkog tijela i LP (Lead Partnership)-vodećih partnera	1. Optimizovan projekat u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima 2. Uvid u Ugovor	1. mart 2020. 2. maj 2020. 3. jun 2020.	Zavod za javno zdravstvo Zadar-vodeći partner Projekta	Opća bolnica Zadar ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar Zavod za javno zdravstvo	Datum početka projekta odlagan je nekoliko puta zbog pandemije nove zarazne bolesti COVID-19. Projekat je još uvijek u početnoj fazi, a u narednoj fazi biće sprovedeno raspisivanje tendera po EU pravilima za nabavku endoskopskog stuba i elektrohirurške jedinice. Ovaj projekat se sprovodi u okviru Programa Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv, a sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 813.445,71 €.

		3. Zaključen partnerski sporazum između MA i LP 4. Održana online početna konferencija ON TIME	3. Uvid u Sporazum 4. Izvještaj i fotografije sa konferencije, medijski izvještaji (prilog Barinfo i RTCG)	4. decembar 2020.g.		Županije Zapadno – hercegovačke	
9.3.1.8.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)	1. Izvršena optimizacija projekta 2. Zaključen ugovor o kofinansiranju između Upravljačkog tijela i Vodećih partnera 3. Održana početna (Kick Off) konferencija 4. Pokrenut postupak izrade Glavnog projekta PTS sistema (tzv. vazdušne pošte) i povećanje inicijalne linije sa 3 na 8	1. Optimizovan projekat u skladu sa novonastalim epidemiološkim okolnostima 2. Uvid u Ugovor 3. Izvještaj i fotografije sa konferencije, medijski izvještaji 4. Zaključeni podgovori sa izvođačima za izradu glavnog projekta	1. mart 2020. g. 2. maj 2020. g. 3. 29.06.2020. g. 4. početak 2021. g.	Opća bolnica Zadar (Hrvatska) - vodeći partner	JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska) Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina) Opća bolnica Zadar (Hrvatska) - vodeći part	Zbog epidemiološke situacije nastale usled pandemije nove zarazne bolesti COVID-19, došlo je do pomjeranja roka za potpisivanje ugovora, te samim tim i do odlaganja početka implementacije projekta i sprovođenja pojedinih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi 978.236,45€, od čega će Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar kroz ovaj projekat biti alocirano EUR 411.659,40 €. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. g, a trajeće 24 mjeseca. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, unapređenje infrastrukture i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unapređenja nivoa pružene usluge.
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	1. Opremljen je i stavljen u funkciju Dnevni boravak u okviru Caritasovog centra	1. Tenderska dokumentacija, inventarska lista, fakture i računi, fotografije, Izvještaj o		Caritas	Opština Bar	Projekat se realizuje planiranom dinamikom. Realizacijom ovog projekta unaprijeđen je nivo socijalne brige o licima starije životne dobi i obezbjeđeni su adekvatni uslovi za pružanje usluge dnevnog boravka za tu populaciju.

		<p>2. 30 korisnika je obuhvaćeno uslugama Dnevnog boravka</p> <p>3. Sačinjen je i distribuiran informativni letak o projektu</p> <p>4. Pokrenut je postupak za izdavanje licence od strane resornog ministarstva Caritasu, kao pružaocu ove socijalne usluge</p>	<p>aktivnostima Dnevnog centra</p> <p>2. Dosjei korisnika Dnevnog centra, fotografije, Izvještaj o aktivnostima Dnevnog centra</p> <p>3. Letak, račun</p> <p>4. Zahtjev i prateća dokumentacija pripravljena u skladu sa Pravilnikom za licenciranje</p>	2020- 2021			
--	--	--	--	------------	--	--	--

Prioritet 2. Obezbjedenje veće uključenosti ranjivih grupa

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.2.1.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada idejnog rješenja)	<p>1. Raspisan Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju</p> <p>2. Izabrana idejna rješenja u formi prve, druge i treće nagrade i izvršena dva otkupa idejnih rješenja</p> <p>3. U galeriji Kulturnog centra organizovana je izložba svih pristiglih na Konkurs</p>	<p>1. Tekst Konkursa objavljen na sajtu Opštine Bar, u štampanim i elektronskim medijima</p> <p>2. Završni izvještaj žirija br. 01-018/21-845</p> <p>3. Fotografije sa izložbe</p>	2020 -2021	Opština Bar	<p>- Ministarstvo rada i socijalnog staranja</p> <p>- Ministarstvo finansija</p> <p>- Opština Bar</p>	<p>Odlukom predsjednika Opštine Bar dana 31.12.2020. raspisan je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.</p> <p>Kao naredni korak u ovom postupku slijedi raspisivanje tendera za izbor projektanta za izradu glavnog projekta i revidenta istog. Nakon revidovanja glavnog projekta i obezbjeđivanja potrebnih finansijskih sredstava pristupiće se raspisivanju tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača i nadzornog organa. U narednim fazama, učešće u realizaciji ovog projekta, pored Opštine Bar, treba da preuzmu i državni organi, u prvom redu resorna ministarstva i Uprava javnih radova.</p> <p>Za sprovođenje ovog projekta u budžetu Opštine Bar za 2021. godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00€. Važno je podsjetiti da je dio sredstava za ovu namjenu, u iznosu od 137.000,00€, uplaćen Opštini Bar 2009. godine, od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, na osnovu prethodno potpisanog Sporazuma. Nažalost, zbog nedobijanja saglasnosti Upravnog odbora OŠ "Meksiko" o ustupanju dijela parcele koja je DUP-om "Polje-Zaljevo" određena za izgradnju ovog objekta, nije bilo moguće pokrenuti radnje kojima bi bila započeta realizacija ovog projekta.</p>

Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.3.3.3.	UMJETNIČKI ATELJEI U STAROM BARU – (OBJEKAT 85) - CREATIVE HUB	<p>1. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji Palate-Objekta br. 85 za potrebe uspostavljanja "Creative Hub"-a. Sa istim zaključen Ugovor i uveden u posao. Završeni restauratorsko-konzervatorski radovi na objektu. Izvedeni radovi na adaptaciji objekta.</p> <p>2. Adaptiran i opremljen prostor ukupne površine 200 m² i isti priveden namjeni</p> <p>3. Uspostavljen Creative Hub</p>	<p>1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 05-196/19 od 23.08.2019.g. Ugovor o javnoj nabavci br. 01-8745/1 od 14.11.2019.g zaključen između Uprave javnih radova I "Euromont stil" d.o.o.</p> <p>2. Izvještaj o prijemu radova I enterijerskom uređenju prostora</p> <p>3. Sporazum o realizaciji programskih aktivnosti kreativnog haba za savremeno vajarstvo, modelovanje i multimediju sa rezidencijama br.01-018/20-2699 od 14.10.2020 godine</p>	01.06.2020 – 31.05.2021	<p>1. Uprava javnih radova</p> <p>3. Ministarstvo kulture i Opština Bar</p>	<p>1. "Euromont stil" d.o.o.</p> <p>3. JP "Kulturni centar", Bar</p>	<p>1. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 256.630,83€, sa uračunatim PDV-om.</p> <p>2. Objekat je preuređen u multifunkcionalan prostor, namijenjen umjetničkom stvaralaštvu. Sadrži prostor za informativnu, uslužnu i komercijalnu djelatnost, sa prostorijama za konsultacije, sastanke, informativnim pultom i prodajnim odjeljkom. Prvi sprat je namijenjen primijenjenom vajarstvu, drugi sprat umjetnicima koji se bave fotografijom, grafičkom i modelovanjem, dok se na trećem spratu nalaze smještajni kapaciteti. Realizacijom ovog projekta obezbijedeni su uslovi za osnaživanje i dinamičan razvoj sektora kreativnih i kulturnih industrija.</p> <p>3. Nakon završenih radova, objekat je predat na upravljanje JP "Kulturni centar" i počeo je sa radom 15.2.2021. godine.</p>
9.3.3.4.	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIPIŠKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)	<p>1. Izvršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu (rekonstrukcija krova i otvora na istočnoj fasadi)</p> <p>2. Izrađen projekat enterijera</p>	<p>1. Ugovor o izvođenju radova br.156 od 18.11.2020. Izvještaj o izvedenim radovima</p>	<p>1. novembar 2020- januar 2021.g.</p> <p>2. januar 2020.</p>	<p>1. JP Kulturni centar Bar</p>	<p>1. "Montal DSD" d.o.o. Podgorica</p>	<p>1. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 23.534,50€, sa uračunatim PDV-om. Da bi se stvorili uslovi za valorizaciju ovog objekta u muzejske svrhe, prvobitno je neophodno bilo izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na objektu, što je u ovoj fazi projekta i realizovano. Naredna faza se odnosi na adekvatno uređenje enterijera.</p> <p>2. Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 5.989,50 , sa uračunatim PDV-om.</p>

		3. Izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji enterijera i sa istim zaključen Ugovor	2. Ugovor o javnoj nabavci br. 113/2019 od 5.11.2019.g. 3. Ugovor o javnoj nabavci br. 01-334/20-1567 od 06.03.2020, zaključen između Uprave javnih radova i d.o.o. "Bombeton" sa Cetinja, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/20-810 od 07.02.2020.g	3. mart 2021.	2. Ministarstvo Kulture 3. Uprava za javne radove	2. "Studio Prostor" d.o.o., Podgorica 3. "Bombeton" d.o.o. Cetinje	3. Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 91.499,99 € . Uvođenje izvođača u posao zavisi od usvajanja Zakona o budžetu Crne Gore za 2021.g. Nakon završetka radova na uređenju enterijera objekta, preostali dio projekta se odnosi na njegovo opremanje muzealijama.
9.3.3.7.	RESTAURACIJA I KONZERVACIJA OTOMANSKOG GROBLJA I MESDŽIDA (OBJEKTI 150-153)	Saniran potporni zid grobljanskog platoa sa zapadne strane do visine od oko 4 metra Izvršena restauracija južnih zidova objekta 148, 149 radi sprečavanja eventualnog obrušavanja	1. Izveštaji o izvršenim radovima po fazama, sa foto-dokumentacijom 2. Izveštaj o stručnom nadzoru	mart-novembar 2020.g.	Ministarstvo kulture Crne Gore JP Kulturni centar Bar	1. Stručni tim u sastavu: Mladen Zagarčanin, arheolog i Dejan Drašković, arhitekta 2. Stručni nadzor: Marija Jabučanin, dipl. arheolog	Ministarstvo Kulture, kao finansijer, i JP Kulturni centar, kao korisnik sredstava, zaključili su dana 13.03.2020. godine Ugovor o finansiranju projekta "Restauracija i konzervacija starog otomanskog groblja i Mesdžida (Svrtišta za putnike) u Starom Baru". Vrijednost odobrenih sredstava za realizaciju ovog projekta iznosila je 15.000,00€ . Završetak projekta bio je planiran za novembar 2020. godine, ali zbog epidemioloških mjera izazvanih Covid-19 i kašnjenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore u izdavanju konzervatorskih uslova za projekat, došlo je do dvomjesečnog kašnjenja. Projekat je uspješno realizovan.

Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar

Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastrukture

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.1.14.	STUDIJA VODOSNABDIJEVANJA OPŠTINE BAR	1. Izvršen izbor najpovoljnijeg obrađivača Studije i sa istim zaključen Ugovor 2. Izrađena Studija vodosnabdijevanja opštine Bar	1. Ugovor o javnoj nabavci br.01-334/20-2955 od 06.05.2020. g	maj-oktobar 2020 g.	Uprava javnih radova	1. "E3 consulting" d.o.o. Podgorica Opština Bar ViK Bar JP Regionalni vodovod	1. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 64.009,00€ U skladu sa projektnim zadatkom koji je bio dostavljen Upravi javnih radova od strane Opštine Bar, sproveden je postupak javne nabavke za izbor obrađivača Studije. 2. Projekat je realizovan u predviđenom roku i uz dobru saradnju svih učesnika. Studija je predata na implementaciju doo "Vodovod i kanalizacija" Bar, a sprovedena je obuka zaposlenih za korišćenje hidrauličkog modela. Izradom ove studije dobijene su jasne smjernice za poboljšanje postojećeg i izgradnju novog vodovodnog i kanizacionog sistema na teritoriji opštine, u cilju rješavanja višedecenijskog pitanja vodosnabdijevanja bezvodnih područja i tretmana otpadnih voda.

Prioritet 2. Unapređenje sistema upravljanja otpadom

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.2.1.	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA „ČAFE“	1. Izrađen projektni zadatak za raspisivanje javnog nadmetanja po principu "Projektuj i izgradi"	1. Projektno – tehnička dokumentacija Izveštaj o realizaciji radova	01.01.2020 – 31.03.2021	-Vlada Crne Gore	- Vlada Crne Gore -Opština Bar -Uprava javnih radova	Izvođenje radova po projektu je djelimično izvršeno, jer je Uprava javnih radova raskinula ugovor sa izvođačem. - Projekat se realizovao po principu "Projektuj i izgradi" kroz dva ugovora: Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom "Mesogeos S.A." iz Grčke i Ugovor o reviziji Glavnog projekta i nadzoru nad izvođenjem radova sa firmom "INGOB" iz Austrije. -Ukupna ugovorena vrijednost za realizaciju ovog projekta iznosila je 3.817.896 €. - Ugovor o izradi Glavnog projekta i izvođenju radova sa firmom "Mesogeos S.A." iz Grčke je raskinut 07.11.2018. godine i Uprava javnih radova je ugovornu i ostalu dokumentaciju vezanu za garancije prosljedila Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore u cilju pokretanja sudskog spora radi prinudne naplate, u smislu čl. 53 Zakona o državnoj imovini. - U skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-309 od 17.01.2019. godine, u 2019. godini je pripremljen Projektni zadatak za raspisivanje javnog nadmetanja po principu "projektuj i izgradi" i isti je potpisan od strane Opštine Bar u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Dalja realizacija ovog projekta je neizvjesna, jer ista zavisi od ishoda sudskog spora i raspoloživih sredstava iz državnog budžeta.
9.4.2.2.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (faza I- Izrada idejnog rješenja)	1. Izrađeno idejno rješenje	1. Uvid u Idejno rješenje -Dobijena saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na Idejno rješenje	01.06.2020 – 31.05.2021	Opština Bar	DOO Komunalne djelatnosti	Projektant za izradu Idejnog rješenja izabran je kroz odgovarajući postupak javne nabavke. Završetkom ove faze stvorene su pretpostavke za dalje planiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.
9.4.2.7.	POSTAVLJANJE POLU-PODZEMNIH KONTEJNERA U GRADSKOM JEZGRU BARA I NABAVKA SPECIJALIZOVANIH VOZILA	1. Nabavljeno i ugrađeno 9 polupodzemnih kontejnera od 5 m ³ i jedan polupodzemni kontejner od 5m ³ za odvojeno sakupljanje otpada	1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 01-3968 od 20.12.2019.g. Ugovor za nabavku polupodzemnih kontejnera	2020.g.	1. Opština Bar	1. "Baranka Export-Import Pejanović" d.o.o. Bar	1. Ukupna vrijednost robe iznosila je 49.999,62 €, sa uračunatim PDV-om.

		<p>2.Nabavljeno specijalno komunalno vozilo sa hidrauličnom dizalicom za pražnjenje i odvoz otpada iz podzemnih kontejnera</p> <p>3.Nabavljena i ugrađena 4 polupodzemna kontejnera od 5 m3 I jedan poklopac sa vrećom za mokru frakciju</p>	<p>br.01-4090 od 31.12.2019.g.</p> <p>2..Ugovor o javnoj nabavci br.2311 od 10.03.2020.g. -Završni račun budžeta Opštine Bar -Izveštaj o radu doo "Komunalne djelatnosti" za 2020.godinu</p> <p>3.Odluka o izboru najpovoljnije ponude OP-09-10600 OD 24.12.2020.g. Ugovor za nabavku polupodzemnih kontejnera, br.10778 od 30.12.2020.g</p>		<p>2."Komunalne djelatnosti" d.o.o., Bar</p> <p>3."Komunalne djelatnosti" d.o.o., Bar</p>	<p>2. "Prodres" d.o.o., Kruševac, Republika Srbija</p> <p>3."Baranka Export-Import Pejanović" d.o.o. Bar</p>	<p>2.Ukupna vrijednost ugovorene robe iznosila je 279.147,00 €sa PDV-om. Za potrebe nabavke specijalizovanog vozila za pražnjenje i odvoz otpada iz polupodzemnih kontejnera,Opština Bar je iz kapitalnog budžeta opredijelila iznos od 230.000€ i izvršila transfer tih sredstava prema d.o.o. "Komunalne djelatnosti".</p> <p>3.Ugovorena vrijednost robe iznosi 19.994,04 €, sa uračunatim PDV-om.</p>
9.4.2.8.	UREĐENJE JEDNOOBRAZNIH KONTEJNERSKIH MJESTA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE BAR	-Urađen grafički prikaz idejnog rješenja		2020.g.	Opština Bar	Glavni gradski arhitekta	Po principu uniformnosti uređeno je 19 lokacija na kojima su postavljeni polupodzemni kontejneri, ali projekat u smislu jednoobraznog uređenja svih kontejnerskih mjesta u skladu sa idejnim rješenjem je u početnoj fazi. D.o.o. "Komunalne djelatnosti" u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na održavanju i uređenju kontejnerskih lokacija.

Prioritet 3. Unapređenje energetske efikasnosti

	Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
9.4.3.1.	„ZELENO OSTRVO“ – IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNOG SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE SPORTSKE DVORANE „TOPOLICA“ ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	Izvršena zamjena svijetlećih tijela i brzih prekidača u Sportskoj dvorani „Topolica“	Izveštaj Neposredan uvid	2020.	Opština Bar	UNDP Sportsko – rekreativni centar d.o.o.	Ovaj projekat podrazumijeva izgradnju nadstrešnice na parking prostoru Sportske dvorane koja bi se prekrila fotonaponskim panelima za proizvodnju električne energije (FN elektrane), čime bi se postigla energetska efikasnost, kao i optimizacija finansijskih rashoda za utrošenu električnu energiju d.o.o. „Sportsko-rekreativnog centra“. Projekat obuhvata nekoliko faza, a u prvoj fazi izvršena je zamjena prekidača i nefunkcionalnih reflektora, što je bila donacija UNDP-a. Projektna rješenja za ostale faze su pripremljena do stepena moguće realizacije. U toku je izrada izmjena i dopuna planske dokumentacije, čime će se stvoriti uslovi za nastavak realizacije ovog projekta.

Finansijski izvještaj

Specifični strateški cilj 1: Unapređenje turističke ponude opštine Bar

Prioritet 1: Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.1.1.2.	REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE	343.737,03 €	100.000 € ²		243.737,03 € ³ – JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

² Uplata naznačenih sredstava iz opštinskog budžeta izvršena je na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru“, Opština Bar-II faza radova, zaključenog dana 01.08.2019.g. u Baru između Vlade Crne Gore, odnosno Uprave javnih radova, Opštine Bar i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

³ Ukupno izvršena uplata na osnovu dvije privremene situacije: 132.362,15 € po osnovu I situacije I 111.371,88€ po osnovu II situacije.

Prioritet 2. Unapređenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA – projekat FORTITUDE Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development	40.610,02 ⁴	6.091,51		34.518,51-IPA sredstva
9.1.2.4.	IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE	13.965,00			13.965,00-Turistička organizacija Bar

⁴ Navedeni iznos sredstava se odnosi na 2 sertifikovana izvještaja zaključno sa 30.11.2020.g.

Specifični strateški cilj 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unapređenje ostalih privrednih grana

Prioritet 1. Razvoj poljoprivrede

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.1.1.	PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA ECOVINEGOALS ECOLOGICAL VINEYARDS GOVERNANCE ACTIVITIES FOR LANDSCAPE'S STRATEGIES	34.133,10	1.978,96		11 214,02 –IPA (transfer Opštini Bar) 17.799,12 – IPA (transfer BSC) Ukupno IPA: 29.013,14 3.141,00 –BSC
9.2.1.2.	ZAVRŠETAK IZGRADNJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU KUĆE MASLINA U STAROM BARU ⁵	926.077,03		926.077,03-Uprava za javne radove	
9.2.1.6	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	52.604,11	52.604,11		

⁵ Za potrebe izgradnje ovog objekta Opština Bar je ustupila zemljište ukupne površine 930m² (katastarska parcela br. 1075/2 KO Stari Bar) i finansirala izradu geodetskih podloga za izradu glavnog projekta.

Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.2.1.	PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA	208.551,16	89.500,00 ⁶ 119.051,16 ⁷		
9.2.2.2.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU	35.000,00	35.000,00		

⁶ Prenesena sredstva iz Budžeta za 2019.godinu koja su raspodijeljena u 2020. godini, shodno Odluci o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2019. godinu, br. 01/134 od 24.01.2020.

⁷ Sredstva opredijeljena Budžetom za 2020.godinu koja su raspodijena shodno Odluci o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2020.godinu, br.01-018/20-2115 od 07.08.2020.

Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala Slobodne zone "Luka Bar"

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.3.1	DEFINISANJE SETA PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTITORE U RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI ⁸				
9.2.3.2	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA	997.802,76 ⁹			997.802,76 – Luka Bar
9.2.3.3	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI ¹⁰				

⁸ Nefinansijska mjera

⁹ Avansna uplata po osnovu Ugovora o izvođenju radova, ukupne vrijednosti 4.989.013,80€ sa PDV-om.

¹⁰ Još uvijek nema utroška, jer je projekat u fazi izrade tehničke dokumentacije i sprovođenja inicijalnih geomehaničkih istraživanja.

Prioritet 4. Razvoj saobraćajne infrastrukture

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.2.4.1.	IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA "VIRPAZAR" I "CKLA" SA REPUBLIKOM ALBANIJOM				
9.2.4.2.	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM	18.697,80	18.697,80 ¹¹		
9.2.4.4.	NADVOŽNJAK PREKO PRUGE BEOGRAD - BAR NA MJESTU PRUŽNOG PRELAZA BJELIŠI U BARU	1.655.511,90	1.655.511,90 ¹²		
9.2.4.15.	UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	52.551,24	4.961,00 ¹³ 1.400,00 ¹⁴ 26.428,52 ¹⁵ 12.148,40 ¹⁶ Ukupno: 44.937,92		7.613,32 -Turistička organizacija Bar

¹¹ Shodno zaključenom sporazumu, Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat u vrijednosti od 14.850€ je urađen od strane doo "Put inženjering" Podgorica, dok je revizija projekta urađena od strane doo "Kov Atelje" Nikšić iznosila 968€ sa PDV-om. Izrada geodetskih podloga i plana parcelacije iznosila je 2.879,80€.

¹² Preostala sredstva do ukupno ugovorenog iznosa za izvođenje projekta će biti isplaćena nakon izvršenog prijema radova.

¹³ Za izradu projekta turističko-informativne signalizacije.

¹⁴ Za reviziju projekta turističke signalizacije.

¹⁵ Za nabavku i ugradnju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

¹⁶ Za nabavku i ugradnju opreme za semafore (zvučni signalizator i gps modul).

Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar

Prioritet 1. Unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.1.3.	OTVARANJE ODJELJENJA HISTOPATOLOGIJE SA OBDUKCIONOM SALOM I BOLNIČKOM ARHIVOM				
9.3.1.4.	POBOLJŠANJE JEDINICE ZA AKUTNI PRIJEM (PRIJEMNO-URGENTNOG BLOKA) SA OPERACIONOM (MALOM) SALOM ZA HITNE PROCEDURE				
9.3.1.7.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)	5.132,07			5.132,07 ¹⁷ -IPA
9.3.1.8.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)	¹⁸			
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	94.496,07			94.496,07- IPA

¹⁷ Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela)

¹⁸ Troškovi se prijavljuju po principu Flat Rate, pa još uvijek ne mogu biti prijavljeni. Od sprovedenih aktivnosti pri kraju je izrada Glavnog projekta, ali kako još uvijek nije završena njegova revizija, nije bilo utroška sredstva za tu namjenu.

Prioritet 2. Obezbeđenje veće uključenosti ranjivih grupa

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.2.1.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada idejnog rješenja)	10.384,60	10.384,60 ¹⁹		

¹⁹ Sredstva opredijljena kao novčani Fond za organizovanje Konkursa i dodjelu nagrada

Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.3.3.3.	UMJETNIČKI ATELJEI U STAROM BARU – (OBJEKAT 85) - CREATIVE HUB	281.630,83		256.630,83-kapitalni budžet Vlade Crne Gore	25.000,00 ²⁰ -Ministarstvo kulture
9.3.3.4.	ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)	31.702,00	20.000,00 ²¹		5.989,50- Ministarstvo kulture 5.712,50- JP "Kulturni centar"
9.3.3.7.	RESTAURACIJA I KONZERVACIJA OTOMANSKOG GROBLJA I MESDŽIDA (OBJEKTI 150-153)	18.242,00			15.000,00-Ministarstvo kulture 3.242,00- JP "Kulturni centar"

²⁰ Sredstva koja je Ministarstvo kulture, posredstvom Opštine Bar, a shodno zaključenom Sporazumu, uplatilo JP Kulturni centar na ime realizacije aktivnosti utvrđenih Programom rada Creative Hub-a.

²¹ II faza projekta -2020. godina 25.712,50 eura (Opština Bar 20.000,00 + 5.712,50 sopstvena sredstva)

Specifični strateški cilj 4. Unapređenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar

Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastrukture

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.1.14.	STUDIJA VODOSNABDIJEVANJA OPŠTINE BAR	64.009,00		64.009,00 Uprava javnih radova	

Prioritet 2. Unapređenje sistema upravljanja otpadom

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.2.1.	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA „ČAFE“ ²²				
9.4.2.2.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (I faza -Izrada idejnog rješenja)	3.250,00	3.250,00 ²³		
9.4.2.7.	POSTAVLJANJE POLU-PODZEMNIH KONTEJNERA U GRADSKOM JEZGRU BARA I NABAVKA SPECIJALIZOVANIH VOZILA	355.632,66	56.491,62 ²⁴ 230.000,00 ²⁵ Ukupno JLS: 286.491,62		49.147,00 ²⁶ - d.o.o. "Komunalne djelatnosti" 19.994,04- d.o.o. "Komunalne djelatnosti" ²⁷ Ukupno Komunalne djelatnosti:69.141,04
9.4.2.8.	UREĐENJE JEDNOOBRAZNIH KONTEJNERSKIH MJESTA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE BAR				

²² Sredstva za realizaciju ovog projekta bila su obezbijedena iz IPA fondova i državnog budžeta, ali zbog prekida u njegovom izvođenju usled spora koji je u toku, nijesmo dobili podatke o utrošenim sredstvima, odnosno dugovanjima i potraživanjima.

²³ Za izradu idejnog rješenja reciklažnog dvorišta izdvojeno je 2.850,00 eura, a za skicu situacije za izradu predmetnog idejnog rješenja 400,00 €.

²⁴ Za nabavku polupodzemnih kontejnera izdvojeno je 49.999,62 €, dok je za ugradnju kontejnera plaćeno 6.492,00 €.

²⁵ Opština Bar je iz kapitalnog budžeta opredijelila iznos od 230.000 € za nabavku specijalizovanih vozila za odvoz otpada iz polupodzemnih kontejnera i izvršila transfer tih sredstava prema doo "Komunalne djelatnosti", Bar. U skladu sa raspisanim tenderskim postupkom, koji je sproveden od strane doo "Komunalne djelatnosti", izvršena je nabavka specijalizovanih vozila u iznosu od 230.700,00€ bez PDV. Za ovaj iznos nabavljena su dva specijalizovana vozila: malo vozilo za sakupljanje otpada sa potisnom pločom zapremine 5m³(69.500,00 €) i specijalno vozilo za pražnjenje polupodzemnih kontejnera sa hidrauličnom dizalicom zapremine 18 m³(161.200,00€). Troškove PDV u iznosu od 48.447,00€, kao i preostalih 700€ do ukupnog iznosa ugovorene cijene za dva navedena vozila, izmirilo je doo "Komunalne djelatnosti" iz sopstvenih sredstava. Ukupni troškovi nabavke ovih vozila iznosili su **279.147,00€**.

²⁶ Troškovi PDV-a (gore navedeno)

²⁷ Nabavka 4 polupodzemna kontejnera od 5 m³ i jednog poklopca sa vrećom za mokru frakciju.

Prioritet 3. Unapređenje energetske efikasnosti

	Projekat	Utrošena sredstva			
		Ukupno €	Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)
9.4.3.1.	„ZELENO OSTRVO“ – IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNOG SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE SPORTSKE DVORANE „TOPOLICA“ ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	4.178,00			4.178,00 ²⁸ -donacija

²⁸ Sredstva su dodijeljena od strane Slovačke razvojne podrške i UNDP/GEF projekta fokusiranog na jačanje zelenih poslova u Crnoj Gori. Iznos 5000 USD.

ZAKLJUČAK

Od ukupno 99 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja opštine Bar 2020-2025., za sprovođenje tokom 2020.godine bilo je delegirano 30 projekata, od čega je 10 realizovano, 18 je u različitim fazama sprovođenja, a 2 projekta nijesu započeta. Stepenn sprovođenja projekata u odnosu na broj planiranih Godišnjim akcionim planom iznosi 93%, a u njihovu realizaciju je uloženo ukupno **5.247.898,38 €**. Osim finansijskih sredstava, doprinos Opštine Bar ogleda se i u vrijednosti zemljišta koje je ustupljeno zarad realizacije pojedinih projekata. Kako su Godišnjim akcionim planom obuhvaćeni i projekti sa višegodišnjim planom realizacije, koji se finansiraju iz više izvora, izvršena je procjena stepena njihove realizacije, odnosno tačan iznos ulaganja na godišnjem nivou.

Imajući u vidu da je zbog situacije izazvane pandemijom COVID19 u 2020. godini bilo otežano poslovanje svih subjekata i usled toga značajno usporena dinamika realizacije planiranih projekata, postignuti rezultati u sprovođenju Godišnjeg akcionog plana su na zadovoljavajućem nivou.

Na kraju ovog izvještaja iznosimo nekoliko zapažanja i preporuka koje su se nametnule tokom procesa njegove izrade, a koje mogu biti od koristi u daljem procesu planiranja i praćenja ishoda projekata.

1. U godišnje akcione planove uvrstiti samo one projekte za koje postoji **opravdano očekivanje da će u planiranom periodu biti započeti**, odnosno za čiju realizaciju je izvjesno da postoje obezbijedena sredstva, dijelom ili u cjelosti. Kada su u pitanju projekti koji su kandidovani prema bilo kojem spoljnjem donatoru, preporuka je da se uvrste samo oni projekti koji su odobreni za finansiranje u postupku evaluacije i čija implementacija je započeta (potpisan partnerski sporazum).
2. Godišnje akcione planove pripremati kroz **participativni proces**, uz učešće ključnih predstavnika. To je dokument koji se odnosi na razvoj cijelog grada, često i sa implikacijama po regionalni razvoj i zato je potrebno da se u njegovu izradu uključe svi akteri lokalne i šire zajednice, naročito privatni investitori koji realizuju značajna ulaganja, kao što su ulaganje u privrednu, turističku i hotelsko – ugostiteljsku djelatnost. Na području barske opštine tokom 2020.godine izvršena su takva ulaganja, a Sekretarijat za razvoj o njima nema podatke. Dijeljenje informacija je uslov dobre prakse, a naročito je, zarad opšte dobrobiti, potrebno osnaživati partnerski odnos lokalne samouprave i privatnog sektora.
3. Precizan rok za realizaciju projekata se ne može sa tačnošću isplanirati, jer njihovo započinjanje često zavisi od niza formalno-pravnih procedura i ishoda složenih tenderskih postupaka, dok je i završetak samih projekata često uslovljen dejstvom nepredviđenih okolnosti, koje je teško kontrolisati. U tom smislu važno je raditi na **identifikaciji te vrste rizika i kreiranju mjera za minimalizovanje njihovog uticaja**.
4. Kada su u pitanju finansijski iskazi, uočene su velike poteškoće prilikom prikupljanja podataka o utrošku sredstava i svim izdacima vezanim za pojedinačne projekte, naročito ukoliko je u njihovu realizaciju uključeno više različitih subjekata. Uspostavljanje **programskog budžetiranja u ovom segmentu**, značajno bi olakšalo praćenje finansijskih tokova i njihovih efekata na postizanje očekivanih rezultata. Takođe, prilikom izrade Budžeta potrebno je voditi računa o usklađenosti Strateškog plana, godišnjeg Programa uređenja prostora i planske dokumentacije, kako bi ovi ovaj dio bio harmonizovan sa navedenim planovima.
5. U cilju aktivnog i kontinuiranog praćenja svih projekata, kreiranja projektnog portfolija i redovne evaluacije njihovog sprovođenja, potrebno je unaprijediti nivo interpersonalne koordinacije menadžmenta (**razvijanje projektnog portfolija menadžmenta**).
